

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยนายสุรศักดิ์ สมภักดีตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๕๗ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายสำรวย โพธิ์งาม (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๐๓๕๒๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.พุกม่วง เชื่อมต่อเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน พร้อมด้วยตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างจากการประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขออนุมัติแก้ไขสัญญาเป็นคงสภาพผิวจราจรเดิมแล้วดำเนินการปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต Overlay ทับผิวจราจรเดิม โดยตัดลดงานจำนวน ๕ รายการ และเพิ่มงานจำนวน ๒ รายการ รวมเป็นมูลค่างานที่ลดลงจำนวน ๔๗๑,๐๕๒.๖๑ บาท คงเหลือมูลค่าก่อสร้างจำนวน ๓,๔๐๓,๙๐๗.๓๙ บาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อนุมัติให้ตัดลดค่างานและเพิ่มค่างาน ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดการคำนวณปริมาณงานและราคาแนบท้าย ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ตัดลดงาน จำนวน ๕ รายการ รวมเป็นมูลค่างานลด ๑,๘๑๒,๕๗๗.๘๖ บาท ดังนี้

๑) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง จำนวน ๔,๐๔๒.๕๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๒๐,๖๕๗.๑๘ บาท

๒) งานรื้อคิ้วลาดยางเดิม หนา ๕ ซม. พร้อมขนทิ้ง และบดอัดพื้นที่ทางเดิม จำนวน ๓,๖๗๕.๐๐๐ ตร.ม.

เป็นเงิน ๗๕,๐๐๖.๗๕ บาท

๓) งานพื้นทางหินคลุก จำนวน ๖๘๔.๑๐๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๒๖๘,๕๒๒.๕๓ บาท

๔) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat) พื้นทางหินคลุก จำนวน ๓,๖๗๕.๐๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๖๔,๖๐๓.๒๕ บาท

๕) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ปูบน Prime Coat) จำนวน ๓,๖๗๕.๐๐๐ ตร.ม.

เป็นเงิน ๑,๒๘๓,๗๘๗.๗๕ บาท

งานเพิ่มจำนวน ๒ รายการ รวมเป็นมูลค่างานเพิ่ม ๑,๓๔๑,๔๘๕.๒๕ บาท ดังนี้

๑) งานลาดแอสฟัลต์เทคโค้ต (Tack Coat) จำนวน ๓,๖๗๕.๐๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗๔,๖๓๕.๒๕ บาท

๒) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ปูบน Tack Coat) จำนวน ๓,๖๗๕.๐๐๐ ตร.ม.

เป็นเงิน ๑,๒๖๖,๘๔๖.๐๐ บาท

ทั้งหมดรวมเป็นมูลค่างานที่ลดลงจำนวน ๔๗๑,๐๙๒.๖๑ บาท รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง
ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๑๐๐๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ยินยอมให้ตัดลดงานและจำนวน ๕ รายการ และเพิ่มงานจำนวน ๒ รายการ รวมเป็นมูลค่างานที่ลดลงจำนวน ๔๗๑,๐๙๒.๖๑ บาท คงเหลือมูลค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๓,๔๐๗,๕๐๗.๐๘ บาท โดยรายละเอียดขนาดความกว้าง ความยาวและพื้นที่ก่อสร้างยังคงเดิม รายละเอียดตามหนังสือข้างๆ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้าง ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเสนอ รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๑๐๐๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๘๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕๓,๗๖๖.๓๖ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายตั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานพื้นทาง, งานรองพื้นทาง, งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และป้ายเหล็กโครงการตามแบบแปลน อบจ.สระบุรี แล้วเสร็จ

-นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๔๐๗,๕๐๗.๓๕ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒๒,๕๔๗.๒๑ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๐๗,๕๐๗.๓๕ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานพื้นทาง, งานรองพื้นทาง, งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และป้ายเหล็กโครงการตามแบบแปลน อบจ.สระบุรี แล้วเสร็จ

-นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสำรวย โพธิ์งาม)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละออใจ บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร โดยนายสำรวย โพธิ์งาม (ผู้รับมอบอำนาจ) ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.พุกร่าง เชื่อมต่อเทศบาลเมืองพระพุทธบาท

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๗/๐๓/๒๕๖๘	๓,๔๐๗,๕๐๗.๓๕			๓,๔๐๗,๕๐๗.๓๕

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง


(นายสำรวย โพธิ์งาม)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอยเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.พุงม่วง เชื่อมต่อเทศบาลเมืองพระพุทธรบาท
อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์
รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗ หน้า
(เอกสารแนบท้ายนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสำรวย โพธิ์งาม)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวยุวรรณดา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร. ๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๑๐๐๗

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.พุกม่วง เชื่อมต่อเทศบาลเมืองพระพุทธรบาท อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/- ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ผู้ควบคุมงานแจ้งปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.พุกม่วง เชื่อมต่อเทศบาลเมืองพระพุทธรบาท อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ มูลค่างานจ้าง ๓,๘๗๙,๐๐๐.๐๐๐ บาท มีห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร เป็นผู้รับจ้าง โดยมีรายละเอียดปัญหาและอุปสรรค คือ แบบก่อสร้างคลาดเคลื่อนกับสภาพพื้นที่จริง แบบก่อสร้างระบุรั้วผิวจราจรลาดยางเดิม แต่สภาพพื้นที่จริงเป็นผิวจราจรคอนกรีตเดิม

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน พร้อมด้วยตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างจากการประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขออนุมัติแก้ไขสัญญาเป็นคงสภาพผิวจราจรเดิมแล้วดำเนินการปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต Overlay ทับผิวจราจรเดิม โดยตัดลดงานจำนวน ๕ รายการ และเพิ่มงานจำนวน ๒ รายการ รวมเป็นมูลค่างานที่ลดลงจำนวน ๔๗๑,๐๙๒.๖๑ บาท คงเหลือมูลค่าก่อสร้างจำนวน ๓,๔๐๗,๙๐๗.๓๙ บาท รายละเอียดการคำนวณปริมาณงานและราคา ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้และผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขสัญญาตัดลดงาน

ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวธรรมา ภาภิ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/หลักพิจารณา...

ข้อพิจารณา

โครงการฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง โดยการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายประโยชน์ เห็นควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาเป็นคงสภาพผิวจราจรเดิม แล้วดำเนินการปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต Overlay ทับผิวจราจรเดิม โดยตัดลดงานจำนวน ๕ รายการ และเพิ่มงานจำนวน ๒ รายการ รวมเป็นมูลค่างานที่ลดลงจำนวน ๔๗๑,๐๙๒.๖๑ บาท คงเหลือมูลค่าก่อสร้างจำนวน ๓,๔๐๗,๙๐๗.๓๙ บาท รายละเอียดขนาดความกว้าง ความยาวและพื้นที่ก่อสร้างยังคงเดิม

เมื่อพิจารณาอนุมัติแล้วจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายชัยทัต ทัพทวี)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรัตนา ภาษี)
นางทิตยาพร เพชรประดับ ปรึกษากิจการพัสดุกำណຸການ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค.สระบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมแจ้งจากช่างควบคุมงานก่อสร้างถนนลาดยางซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 10 ต.พุ่มพร้าวหอมต่อนเทศบาลเมืองพรหมบุรี ถนนหน้าสถานีและอุปสรรค ต้องแก้ไขก่อสร้างลาดยางเดิม สภาพพื้นที่จริงเห็นสมควรสร้างระนาบผิวจราจรลาดยางเดิม แต่สภาพพื้นที่จริงเห็นสมควรคอนกรีตเดิม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้ร่วมประชุมโดยมีมติให้ขออนุมัติแก้ไขสภาพเห็นตรงสภาพเดิม โดยขอตัดลดงานจำนวน ๕ รายการ และเพิ่มงานจำนวน ๒ รายการ รวมมูลค่างานที่ลดลงจำนวน ๔๗๑,๐๙๒.๖๑ บาท คงเหลือเงินก่อสร้าง ๓,๔๐๗,๙๐๗.๓๙ บาท เห็นควรอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจรับและช่างควบคุมงานเสนอ

(นางสาววิภา ประจักษ์พนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร

ทะเบียนการค้า สพ.1330 สำนักงานเลขที่ 557 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 22100
โทร : 081-4610287 โทรสาร : (035) 969-670 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0723544000532

เอกสารแนบท้าย สัญญาซื้อขายที่	สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี	เลขที่รับ 990	วันที่ 4/1/68
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	ฝ่ายสำรวจ	เวลา 12.45	
	ฝ่ายออกแบบ	<input type="checkbox"/> ส่วนการโยธา	
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	<input type="checkbox"/> ฝ่ายเครื่องจักรกล	
		<input type="checkbox"/> ฝ่ายช่างสุขาภิบาล	

ที่ รต.0156/2568

วันที่ 4 มีนาคม 2568

เรื่อง ยินยอมแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ 61/2568 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 10 ตำบลพุกม่วง เชื่อมต่อเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่าน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 61/2568 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2567

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง พบปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน คือ แบบก่อสร้างคลาดเคลื่อนกับสภาพพื้นที่จริง แบบก่อสร้างระบุรั้วผิวจราจรลาดยางเดิม แต่สภาพพื้นที่จริงเป็นผิวจราจรคอนกรีตเดิม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและตัวแทนห้างฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคฯ ในวันที่ 3 มีนาคม 2568 ณ สถานที่ก่อสร้าง จากมติที่ประชุม ห้างฯ ขอส่งหนังสือยินยอมแก้ไขสัญญาเป็นคงสภาพผิวจราจรเดิม แล้วดำเนินงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต Overlay ทับผิวจราจรเดิม โดยมีรายการงานเพิ่ม-ลดดังนี้

1. ตัดลดงานจำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย
 - 1.1 งานวางป่าและชุดตอ ขนาดกลาง
 - 1.2 งานรั้วผิวลาดยางเดิม หนา 5 ซม. พร้อมชนทัง และบดอัดพื้นทางเดิม
 - 1.3 งานพื้นทางหินคลุก
 - 1.4 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat) พื้นทางหินคลุก
 - 1.5 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ปูบน Prime Coat) พื้นทางหินคลุก
2. รายการงานเพิ่ม จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย
 - 2.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)
 - 2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ปูบน Tack Coat)

รวมเป็นมูลค่างานที่ลดลงจำนวน 471,092.61 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทหกสิบบเอ็ดสตางค์) คงเหลือมูลค่าก่อสร้างจำนวน 3,407,907.39 บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบบเก้าสตางค์) โดยรายละเอียดขนาดความกว้าง ความยาวและพื้นที่ก่อสร้างยังคงเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเดิม พุทธจรรยา)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(นางสรารัตน์ คุณมรดตัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(นางสาวยุวรัตนา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ขอแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 10 ต.พุกม่วง เชื่อมต่อเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์

สัญญาจ้างเลขที่ 61/2568

ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
5	ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	1.00	6,374.68	6,374.68
7	ป้ายจราจรแบบ บ33-บ55	ชุด	1.00	3,827.53	3,827.53
3	ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75	ชุด	4.00	4,059.09	16,236.36
9	งานสัญญาณไฟจราจรเตือนกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ชุด	2.00	19,450.96	38,901.92
10	งานเส้นจราจร สีเหลือง+สีขาว (สีเทอร์โมพลาสติก)	ตร.ม.	165.30	395.00	65,293.50
11	Rumble Strip	ตร.ม.	18.90	626.57	11,842.17
12	งานเส้นหยุด (สีเทอร์โมพลาสติก)	ตร.ม.	0.75	395.00	296.25
13	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.00	6,587.33	6,587.33
14	ครุภัณฑ์ (เสาไฟนวัตกรรม) รหัส 7020037	ชุด	30.00	63,902.08	1,917,062.40
15	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	3,675.00	20.31	74,639.25
16	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ปูน Tack Coat)	ตร.ม.	3,675.00	344.72	1,266,846.00
				รวมราคาทั้งสิ้น	3,407,907.39

(สามล้านสี่แสนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

ประธานฯ

(นางศุภมาส เพชรประดับ)

กรรมการฯ

(นางสรารัตน์ สุขะตัน)

กรรมการฯ

(นายชัยทัต ทัพทวี)

กรรมการฯ

(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)

ผู้ควบคุมงาน

(นายกิตติ ทองขาว)



ผู้ควบคุมงาน





อำนาจกิจ

(นางสาวสุวรรณา ภาณี)
นักวิชาการผู้ชำนาญการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 10 ต.พุก ráง เข้มต่อเทศบาลเมืองพระพทุธบาท อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์
สัญญาจ้างเลขที่ 61/2568 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2568

อ้างอิง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ 2.3 หน้า 2

ลำดับที่	งานตามแบบรายการ สัญญาจ้าง				ขอเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม)		ขอเปลี่ยนแปลง (ลด)		คงเหลือ		
	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคาตามใบแจ้งฯ (บาท)	ปริมาณ	รวมราคางานเพิ่ม (บาท)	ปริมาณ	รวมราคางานลด (บาท)	ปริมาณ	ราคาจ้าง (บาท)
1	งานฉาบและซุดต่อ ขนวดกลาง	ตร.ม.	4,042.500	5.11	20,657.18			4,042.500	20,657.18	-	-
2	งานฉาบราคาขยงเดิม ทน 5 ซม. พร้อมชนทั้ง ๒ และบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,675.000	20.41	75,006.75			3,675.000	75,006.75	-	-
3	งานพื้นขยงหินคลุก	ลบ.ม.	684.100	392.50	268,522.93			684.100	268,522.93	-	-
4	งานลาดแอสฟัลต์พรีเมียมไคต์ (Prime Coat) พื้นทางหินคลุก	ตร.ม.	3,675.000	44.79	164,603.25			3,675.000	164,603.25	-	-
5	งานชั้นผิวขยงแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม. (ปูน Prime Coat)	ตร.ม.	3,675.000	349.33	1,283,787.75			3,675.000	1,283,787.75	-	-
6	ขยงจราจรแบบ P1	ซุด	1.000	6,374.68	6,374.68					1.000	6,374.68
7	ขยงจราจรแบบ U33-U55	ซุด	1.000	3,827.53	3,827.53					1.000	3,827.53
8	ขยงจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75	ซุด	4.000	4,059.09	16,236.36					4.000	16,236.36
9	งานสีจราจรเส้นไฟจราจรเตือนกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ซุด	2.000	19,450.96	38,901.92					2.000	38,901.92
10	งานเส้นจราจร สีเหลือง+สีขาว (สีเทอร์โมพลาสติก)	ตร.ม.	165.300	395.00	65,293.50					165.300	65,293.50
11	Rumble Strip	ตร.ม.	18.900	626.57	11,842.17					18.900	11,842.17
12	งานเส้นมะยด (สีเทอร์โมพลาสติก)	ตร.ม.	0.750	395.00	296.25					0.750	296.25
13	ขยงโครจขยง (ขยงเหล็ก)	ซุด	1.000	6,587.33	6,587.33					1.000	6,587.33
14	ครุฑฉลุ (สไฟนฉลุกรรม) รหัส 7020037	ซุด	30.000	63,902.08	1,917,062.40					30.000	1,917,062.40
15	งานลาดแอสฟัลต์เทคโคไคต์ (TACK COAT)	ตร.ม.		20.31			74,639.25			3,675.000	74,639.25
16	งานชั้นผิวขยงแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม. (ปูน Tack Coat)	ตร.ม.		344.72			1,266,846.00			3,675.000	1,266,846.00
					รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม
					3,879,000.00	1,341,485.25	1,812,577.86	3,407,907.39			

ประธานฯ  (นางทิติยพร เพชรประด้ง)
 กรรมการฯ  (นางสมานิตย์ ชูศรีจันทร์)
 กรรมการฯ  (นายชัยทัต ทัพพวี)
 วิศวกรรมการ  (นายเกียรติ ทองขาว)
 ผู้ควบคุมงาน

ตารางแสดงการคิดราคางานที่ไม่ได้อยู่ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 10 ต.พุกกร่าง เข้มต่อเทศบาลเมืองพระเทพบาท อ.พระเทพบาท จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์

สัญญาจ้างเลขที่ 61/2568

ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2568

ราคากลาง 3,885,104.99 บาท
 ราคาจ้างตามสัญญา 3,879,000.00 บาท
 อัตราส่วนลด 0.998428616

ตารางแสดงการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง							
ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	3,675.00	14.92	54,831.00	1.3642	74,800.45
2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (Asphalt Concrete Wearing Course) ปูน Tack Coat	ตร.ม.	3,675.00	253.10	930,142.50	1.3642	1,268,900.39

ตารางแสดงการคำนวณราคาจ้างก่อสร้าง (บัญชีใบแจ้งปริมาณงานและราคา)

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	ราคากลาง	
			ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาจ้าง (ตามบัญชีใบแจ้งฯ)
1	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	20.35	20.31
2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (Asphalt Concrete Wearing Course) ปูน Tack Coat	ตร.ม.	345.27	344.72

อำนาจการ

(Signature)

นางสาวอรุณมณฑา ภาภิ
 วิศวกรรมการไฟฟ้า

(Signature)

ประธานฯ

(นางทิพยาพร เพชรประดับ)

กรรมการฯ

(นางสรารัตน์ สุขเมรัตน์)

(Signature)

(นายชัยทัต ทัพทวี)

กรรมการฯ

(Signature)
 (นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)

(นายกิตติ ทองขาว)

ผู้ควบคุมงาน

4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์เทคโคโค้ด (TACK COAT)

ค่าจ้าง CRS-2 0.30 ลิตร @ 25,054.82 บาท/ตัน
 ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานลาดยางเทคโคโค้ด : งานลาดยางเทคโคโค้ด)
 ค่าใช้จ่ายรวม = 7.52 + 7.41
ต้นทุน
 (ราคาน้ำมัน 33.11 บาท/ลิตร)

1,000 แปลงหน่วยราคา

14.92	บาท/ตร.ม.
7.516	บาท/ตร.ม.
7.410	บาท/ตร.ม.
14.926	บาท/ตร.ม.
14.92	บาท/ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา ภาชี)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางจิตติยาพร เพชรประดับ
 ปรึกษาฯ

กรรมการฯ
 กรรมการฯ
 (นางสรวิรัตน์ สุขะตัน)

ผู้ควบคุมงาน
 (นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)
 (นายกิตติ ทองขาว)

4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPH/ (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ซม. 5

ความหนา	5 ซม.				253.10 บาท/ตร.ม.
ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ					
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	35 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)			57.75 บาท/ตัน (10 ล้อลากพวง)	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม :	250,000 / 10,000				

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = 10,000 ตัน

ในการคำนวณคิดค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2)	5.2	% =	0.052	ตัน @	27,318.16 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์	0.74	ลบ.ม. @	185.58	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)					
ค่าขนส่ง	1.00 กม. (ปกติใช้ L/4) (รถบรรทุก 10 ล้อ)				
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.)					
บวมแพทได้ตัด	12.07	บาท/ตร.ม.	X	1 (ตัวแปร)	X 8.33 ตร.ม./ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม					
ค่างานต้นทุน =	2108.33	/	8.33	ตร.ม./ตัน	
(ราคามัน	33.11	บาท/ลิตร)			

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวสุวรรณา ภา
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน
 (นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)
 (นางสาวสุวรรณา ภา)
 (นายเกียรติ ทองขาว)
 (นางสรวิศพร เพชรประดับ)
 (นางสรวิศรัตน์ สุขมะเดิม)
 (นายชัยทัต ทัพทวี)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายเทศบาล 1 หมู่ที่ 10 ต.พุทรา
เชื่อมต่อเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟแอลอีดี

ผู้ควบคุมงาน		(นายกิตติ ทองขาว) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงาน		(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์) วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ		(นายชัชชาติ ทัพทวี) นักผังเมืองปฏิบัติการ
กรรมการ		(นางสรารัตน์ สุขะตัน) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
ประธาน		(นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบ		(นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบ		(นางสาวนิกา ประสิทธิ์พาย) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อนุมัติ		(นายสุรศักดิ์ สมภักดี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ชื่อเขียน	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	
ชื่อเขียน	บัญชีปริมาณงาน	


สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรัตนา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีปริมาณงาน				
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
3.	งานป้ายจราจร			
3.1	ป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	1.00	
3.2	ป้ายจราจรแบบ บ.55	ชุด	1.00	
3.3	ป้ายจราจรแบบ ต.1-ต.27,ต.31-ต.56,ต.60,ต.75	ชุด	4.00	
3.4	งานสัญญาณไฟจราจรไฟกะพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ชุด	2.00	
4.	เครื่องหมายบนผิวทาง			
4.1	เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง+สีขาว)	ตร.ม.	221.00	
4.2	Rumble Strips สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	18.90	
4.3	งานเส้นหยุด สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	0.75	
3	งานป้ายโครงการ			
3.1	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.00	
2.	งานไฟฟ้าแสงสว่างวิศวกรรมไทย รหัส 07020037 รุ่น KELLI-16008			
2.1	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ	ชุด	30.00	
	ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole)			
	เสาไฟเหล็กชุบสังกะสี ความสูง 8.00 ม.			
	ฐานรากแบบหลายเข็ม ขนาดความยาว 1.50 ม. จำนวน 4 ต้น/ชุด			
	โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 60 วัตต์			
	รุ่น RCSOS60L-165CW50 จำนวน 1 โคม			
4.	งานผิวทาง			
4.1	Tack Coat	ตร.ม.	3,675.00	
4.2	Asphaltic Concrete			
	-Asphaltic Concrete (บน Tack Coat)	ตร.ม.	3,675.00	

มาตราส่วน	วัน/เดือน/ปี
แบบเลขที่	แผ่นที่
107/67	04

แก้ไข เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ 2.1 หน้า 8

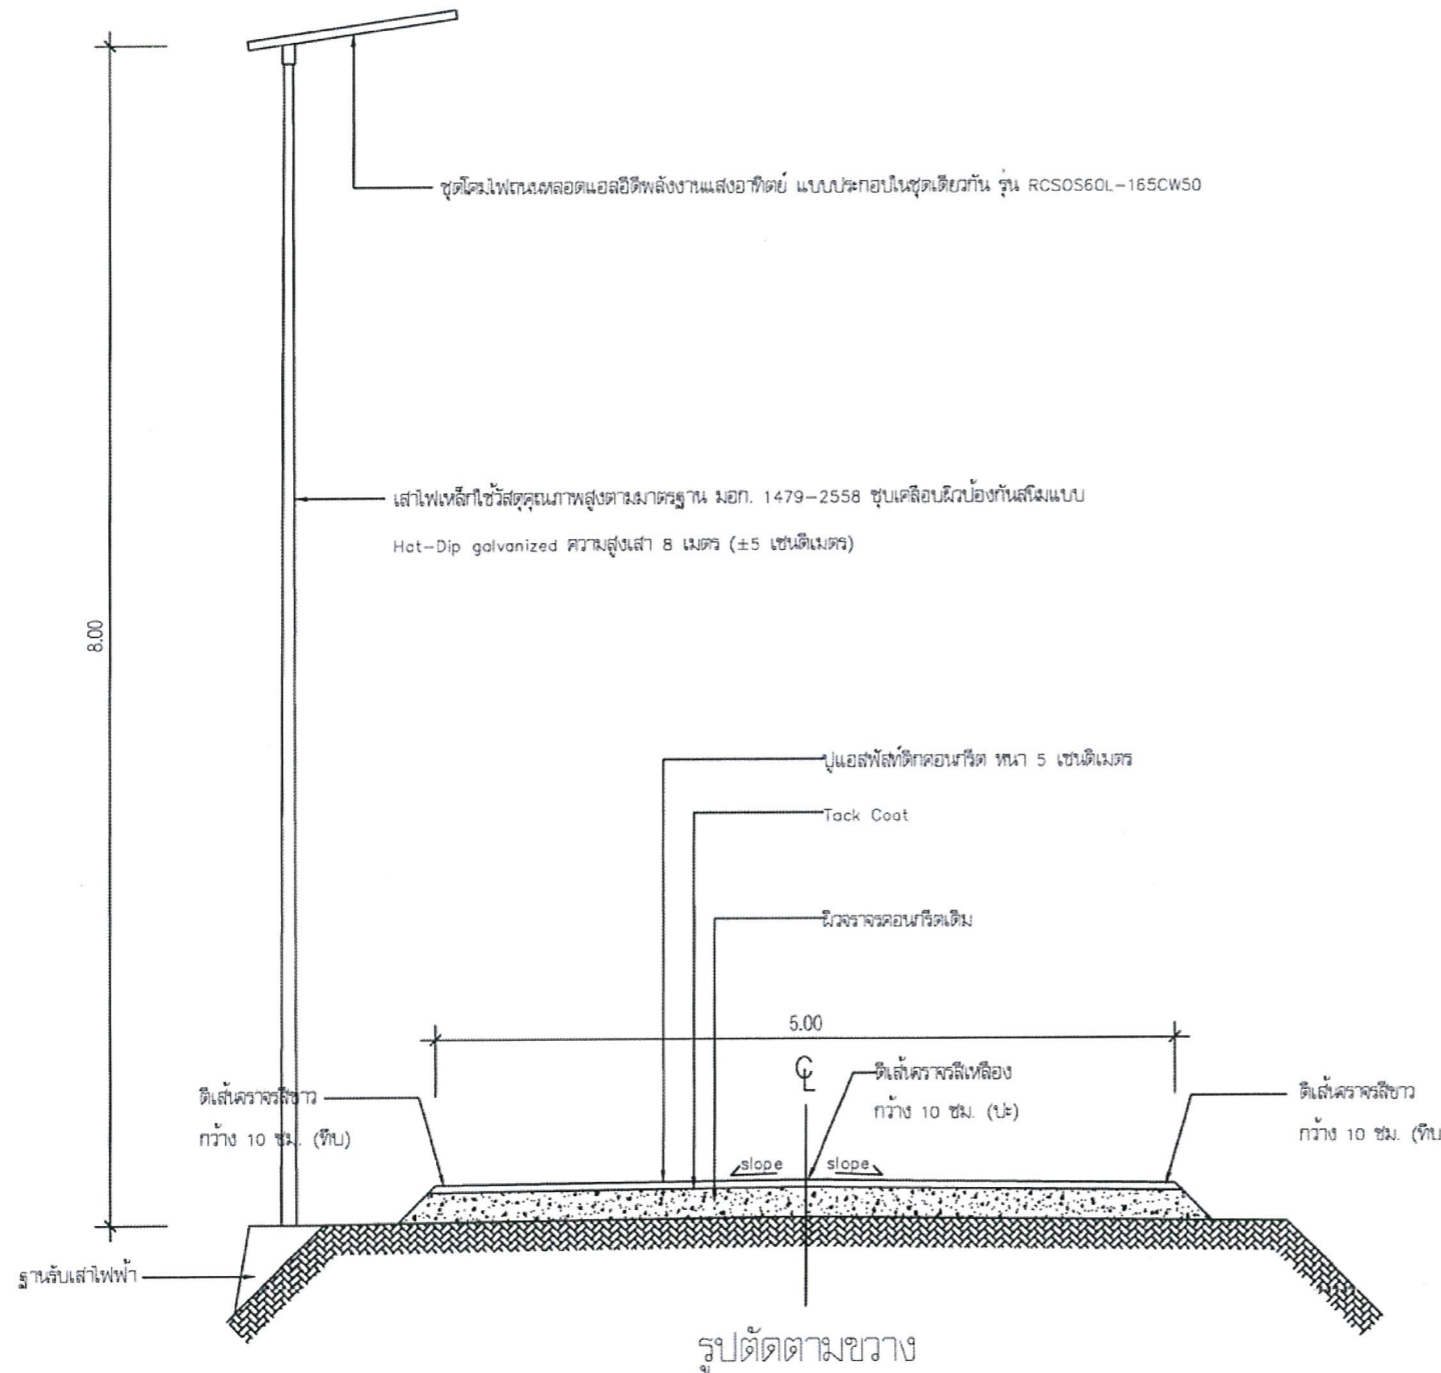

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

หมายเหตุ

1. มีติดต่าง ในแบบแปลนกำหนดไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. ก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือดำเนินการปรับปรุงถนนผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจเส้นทาง พร้อมจัดทำแบบ Shop drawing , รูปแบบ Profile และ Cross - Section แสดงระดับเดิมและระดับก่อสร้าง ทุกๆ ระยะ 25.00 ม. ให้ตรงตามปริมาณงาน ใ้มีใบเสนอราคาและเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ
3. ผู้ส่งไม้ที่จะเสนอราคาโครงการฯ ขอให้ตรวจสอบสถานที่และตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนก่อน เพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคภายหลัง
4. ขณะดำเนินการโครงการหากเจออุปสรรคและสิ่งกีดขวางใดๆ ในสายทางที่มีผลต่อการปฏิบัติงานให้เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
5. กรณีไม้กีดขวางระหว่างขุดและรายการให้ถือการวินิจฉัยของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นข้อยุติ
6. จุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ กำหนดจุดติดตั้ง ตามความเหมาะสมหน้างาน

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวยุวรัตนา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายเทศบาล 1 หมู่ที่ 10 ต.พุทรา
เชื่อมต่อเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงสว่างโซล่าเซลล์

ผู้ควบคุมงาน		(นายกิตติ ทองขาว) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงาน		(นายมาหิต ชูศรีจันทร์) วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ		(นายชัชชาติ ทัพทวี) นักผังเมืองปฏิบัติการ
กรรมการ		(นางสาวรัตน์ สุขะตัน) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
ประธาน		(นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบ		(นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบ		(นางสาวนิภา ประชีพราย) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อนุมัติ
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ชื่อชิ้นงาน	รูปตัดตามขวาง
มาตราส่วน	รับเดือนปี
แบบเลขที่	แผ่นที่
107/67	06

รายการประกอบแบบ


1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้น โครงสร้างทาง
2. ถ้าระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ดีชำรุดเสียหายแต่ไม่ลึกถึง โครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบร้อยเสียก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัด โครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิต และด้าน โครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้ทำการตอนใด ก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ หรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7,8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกั้นโค้ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 3 (มฐ.บร.3/2546) และแบบที่ 3.2 (มฐ.บร. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

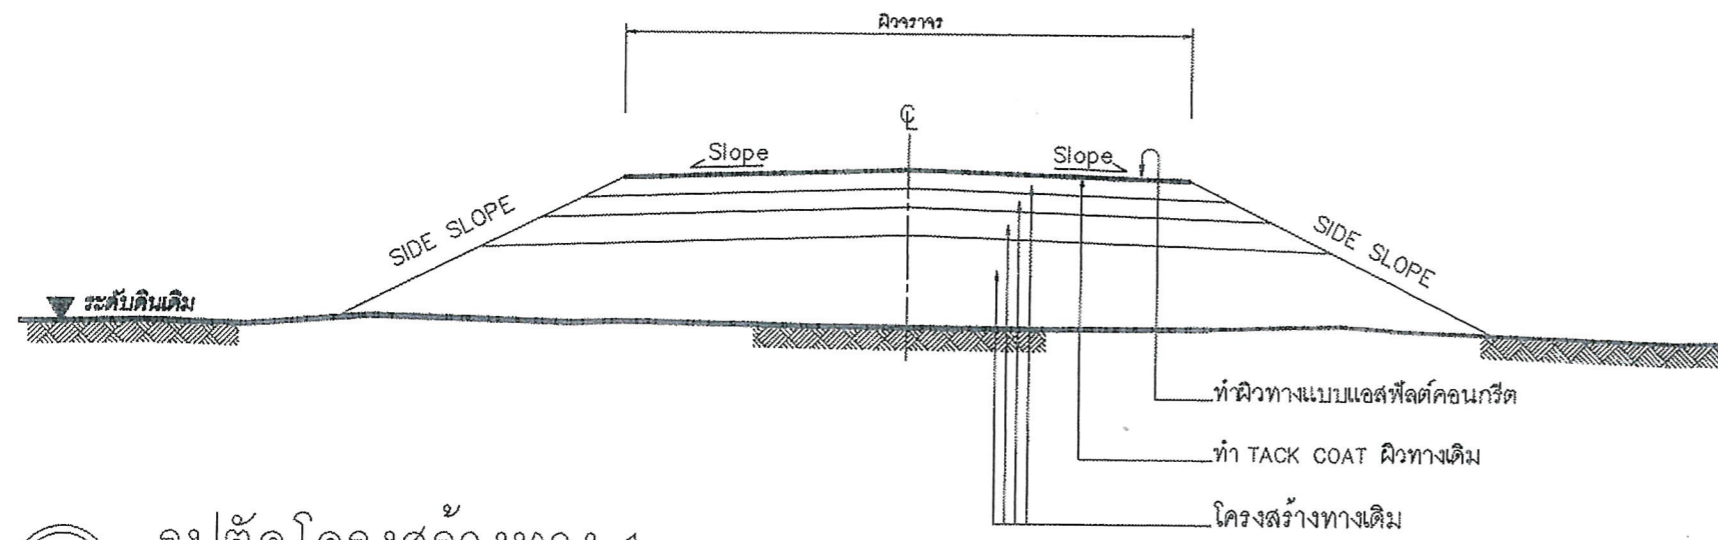

รูปตัดโครงสร้างทาง 1

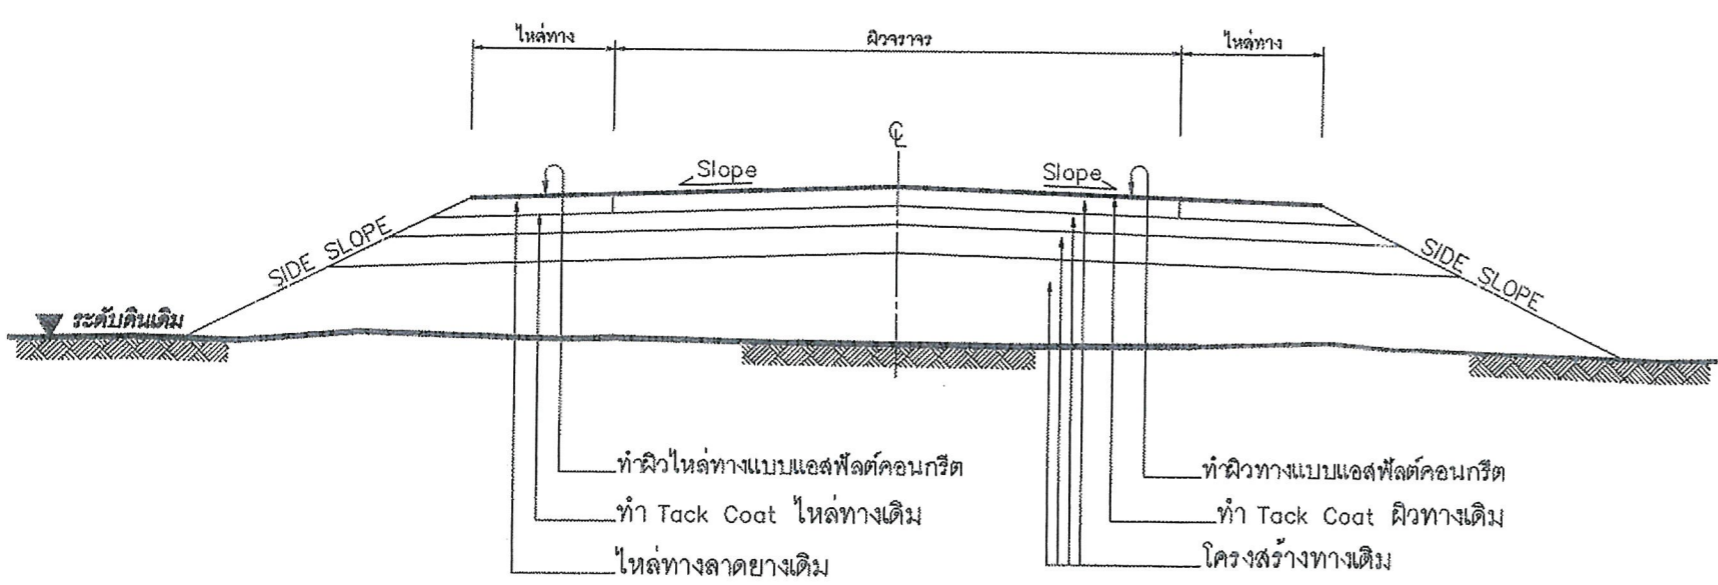

รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทข 230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทข 230-2545
3	TACK COAT	อ้างอิง " มาตรฐานงานแทคโคท " มทข 227-2545
4	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างอิง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทล-3-110(1) - 110(4)

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวยุวธรรดา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Signature
(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
	งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
เลขที่ ทล 7-201	แก้ที่ ๑4



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร.๐ ๓๖๒๑ ๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/-

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.พุก ráง เชื่อมต่อเทศบาลเมืองพระพุทธรบาท อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซลล่าเซลล์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๓๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ และคำสั่งฯ ที่ ๖๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.พุก ráง เชื่อมต่อเทศบาลเมืองพระพุทธรบาท อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลล่าเซลล์ สัญญาจ้างเลขที่ ๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ มูลค่างานจ้าง ๓,๘๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท กำหนดเริ่มงานวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา ๙๐ วัน โดยมี ำงำนส่วนจำกั ด รัตนชัยพร เป็นผู้รับจ้าง นั้น

จากการควบคุมงานก่อสร้าง พบปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงาน คือ แบบก่อสร้างคลาดเคลื่อนกับสภาพพื้นที่จริง แบบก่อสร้างระบุหรือผิวจราจรลาดยางเดิม แต่สภาพพื้นที่จริงเป็นผิวจราจรคอนกรีตเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนัดประชุมพิจารณาปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว


(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน



(นายกิตติ ทองขาว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ และนัดประชุมพิจารณา ณ สถานที่ก่อสร้าง
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘



ประธานกรรมการฯ
(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


จำเนาถูกต้อง


นางสาวสุวรรณา เมธา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

- ทราบและเข้าร่วมประชุม

- ทราบและเข้าร่วมประชุม


กรรมการฯ
(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา


กรรมการฯ
(นายชัยทัต ทัพทวี)
นักผังเมืองปฏิบัติการ
