

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สม ภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕๗ หมู่ ๔ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายสำรวย โพธิ์งาม (ผู้รับมอบ อำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๕๘๕๓๗๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และหนังสือ มอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๔๑ พหลโยธิน- วัฒมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ ๕,๗ ต.ห้วยบง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑,๒ ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ตามสภาพความเป็นจริง และทำการตรวจสอบแบบแปลนและปริมาณงานการก่อสร้างตามสัญญา พบว่ามีรายละเอียดปัญหาและอุปสรรค ๔ รายการ ดังนี้

๑. หลังจากกรอฝารางระบายน้ำ คสล.เดิมแล้ว พบว่า ความกว้างของฝารางระบายน้ำ คสล. มีขนาดความกว้างของราง ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสำรวย โพธิ์งาม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ผู้รับมอบอำนาจ

๑.๑ ฝารางระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๖ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ ม.

๑.๒ ฝารางระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๘ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ ม.

๑.๓ ฝารางระบายน้ำ ขนาด ๐.๕๕ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ ม.

๒. พบแนวท่อลอดถนนคอนกรีตและแนวท่อน้ำประปาหมู่บ้าน, ประปาภูมิภาค อยู่ในฝารางระบายน้ำ คสล. ทำให้การขุดลอกมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๓. พบว่าแนวรางระบายน้ำบริเวณร้านค้าและทางขึ้นทางลงบ้านเรือน มีการนำแผ่นเหล็กมาปิดทับบน ฝาคอนกรีตเดิมและทำการเทคอนกรีตทับหน้าอีกที แต่ยังสามารถระบายน้ำได้

๔. บริเวณ กม.๐+๔๖๓.๔ - กม.๐+๕๔๖ [RT] ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างผิวจราจรเดิม

๕.๕๐ เมตร เป็นระยะทางยาว ๘๒.๖๐ เมตร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมกันประชุมพิจารณา ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็น ควรให้เสนอขออนุมัติแก้ไขปริมาณงาน ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงขนาดฝารางระบายน้ำ คสล. ใหม่ ให้สอดคล้องกับความกว้างของรางระบายน้ำเดิม

๒. ให้นำหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคินพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงทำการ เคลื่อนย้ายแนวท่อประปาหมู่บ้านและประปาสวนภูมิภาคใหม่

๓. ทำการตัดลดปริมาณงาน บริเวณที่มีการเทคอนกรีตทับหน้ารางระบายน้ำเดิมออก และบริเวณ ความกว้างถนนที่ไม่ถึง ๖.๐๐ เมตร ทำการปรับเพิ่มลดปริมาณงาน ฝารางระบายน้ำ คสล. ตามขนาดดังกล่าว ปรับ เพิ่ม-ลด งานผิวจราจร เป็นงานผิวทางเชื่อม

โดยเพิ่มการปฏิบัติงานจำนวน ๕ รายการ คิดเป็นมูลค่างานเพิ่ม ๒,๐๑๓,๕๔๔.๐๖ บาท (สองล้านหนึ่ง หมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทหกสตางค์) ตัดลดงานจำนวน ๔ รายการ คิดเป็นมูลค่างานลด ๒,๐๑๓,๑๖๔.๕๖ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์) รวมเป็นมูลค่างานเพิ่ม ๓๗๙.๕๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) โดยผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฯ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวเป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ที่ดำเนินการซึ่งไม่ทำให้ ทางราชการเสียหาย ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน เท่าเดิม วงเงินค่าก่อสร้าง ๖,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสน แปดหมื่นบาทถ้วน) เท่าเดิม และรายละเอียดอื่นตามสัญญาเดิม

ผู้รับจ้างยินยอมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือสิทธิในการฟ้องร้องทางศาล ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายตำรวจ โพธิ์งาม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญา
ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
พยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสำรวย โพธิ์งาม)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพลภัทร เพ็ญวิทยารัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ๑-๐๐๔๑ พหลโยธิน-วัดมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ ๕,๗
ต.ห้วยบง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑,๒ ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

เลขที่ ๙๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑ หน้า



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(...นายสุรศักดิ์ สมภักดี.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(...นายสำรวย โพธิ์งาม.....)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(...นางละอองดาว บำรุงญาติ.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



ลงชื่อ.....พยาน

(...นายพลภัทร เพ็ญวิทยารัตน์.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร. ๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/ ๔๐๒๔

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ๑ - ๐๐๔๑ พหลโยธิน - วัดมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลห้วยบง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลเขาหินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/- ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ผู้ควบคุมงาน
แจ้งปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ๑ - ๐๐๔๑ พหลโยธิน - วัดมงคล
ชัยพัฒนา หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลห้วยบง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลเขาหินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๙๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ มูลค่างานจ้าง ๖,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร เป็นผู้รับจ้าง โดยมีรายละเอียดปัญหาและอุปสรรค ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. หลังจากรื้อฝารางระบายน้ำ คสล.เดิมแล้ว พบว่า ความกว้างของฝารางระบายน้ำ คสล.
ที่ต้องใช้ดำเนินการมีรายการ ดังนี้

๑.๑ ฝารางระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๖ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ ม.

๑.๒ ฝารางระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๘ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ ม.

๑.๓ ฝารางระบายน้ำ ขนาด ๐.๕๙ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ ม.

๒. พบแนวท่อลอดถนนคอนกรีตและแนวท่อน้ำประปาหมู่บ้าน, ประปาภูมิภาค อยู่ใน
ลำรางระบายน้ำ คสล. ทำให้การขุดลอกมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๓. พบว่าแนวรางระบายน้ำบริเวณร้านค้าและทางขึ้นทางลงบ้านเรือน มีการนำแผ่นเหล็กมา
ปิดทับบนฝาคอนกรีตเดิมและทำการเทคอนกรีตทับหน้าอีกที แต่ยังสามารถระบายน้ำได้

๔. บริเวณ กม.๐+๔๖๓.๔ - กม.๐+๕๔๖ [RT] ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างผิวจราจร
เดิม ๕.๕๐ เมตร เป็นระยะทางยาว ๘๒.๖๐ เมตร

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมประชุมพิจารณา ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ สถานที่ก่อสร้าง และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ สำนักช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จากการประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้เสนอขออนุมัติแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงขนาดฝารางระบายน้ำ คสล.ใหม่ ให้สอดคล้องกับความกว้างของรางระบายน้ำเดิม

๒. ให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงทำการ
เคลื่อนย้ายแนวท่อประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาคใหม่

๓. ทำการตัดลดปริมาณงาน บริเวณที่มีการเทคอนกรีตทับหน้ารางระบายน้ำเดิมออก และ
บริเวณความกว้างถนนที่ไม่ถึง ๖.๐๐ เมตร ทำการปรับเพิ่มลดปริมาณงาน ฝารางระบายน้ำ คสล.ตามขนาด
ดังกล่าว ปรับเพิ่ม-ลด งานผิวจราจร เป็นงานผิวทางเชื่อม

โดยเพิ่มการปฏิบัติงานจำนวน ๕ รายการ คิดเป็นมูลค่างานเพิ่ม ๒,๐๑๓,๕๔๔.๐๖ บาท
ตัดลดงานจำนวน ๔ รายการ คิดเป็นมูลค่างานลด ๒,๐๑๓,๑๖๔.๕๖ บาท รวมเป็นมูลค่างานเพิ่ม ๓๗๙.๕๐ บาท
โดยผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ตามเอกสารแนบ)

/ระเบียบ...

- ๒ -

ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๘๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๘๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อพิจารณา

โครงการฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง โดยการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ เห็นควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญา ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงขนาดฝารางระบายน้ำ คสล.ใหม่ ให้สอดคล้องกับความกว้างของรางระบายน้ำเดิม

๒. ให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงทำการเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาคใหม่

๓. ทำการตัดลดปริมาณงาน บริเวณที่มีการเทคอนกรีตทับหน้ารางระบายน้ำเดิมออก และบริเวณความกว้างถนนที่ไม่ถึง ๖.๐๐ เมตร ทำการปรับเพิ่มลดปริมาณงาน ฝารางระบายน้ำ คสล.ตามขนาดดังกล่าว ปรับเพิ่ม-ลด งานผิวจราจร เป็นงานผิวทางเชื่อม

โดยเพิ่มการปฏิบัติงานจำนวน ๕ รายการ คิดเป็นมูลค่างานเพิ่ม ๒,๐๑๓,๕๔๔.๐๖ บาท ตัดลดงานจำนวน ๔ รายการ คิดเป็นมูลค่างานลด ๒,๐๑๓,๑๖๔.๕๖ บาท รวมเป็นมูลค่างานเพิ่ม ๓๗๙.๕๐ บาท

โดยผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน นายก อบจ.สระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนาม

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบ (นายสุรศักดิ์ สุขมะดัน)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายมารุต ขาวสวน)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร

ทะเบียนการค้า สพ.1330 สำนักงานเลขที่ 557 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร : 081-4610287 โทรสาร : (035) 969-670 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0723544000532

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....

สำนักช่าง

ยบจ.สระบุรี

เลขที่รับ

วันที่ 14 / 0.0. / 68

เวลา

จังหวัดสุพรรณบุรี 72210

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายช่างสถาปัตย์

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ที่ รต.0399/2568

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ยินยอมแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ 96/2568 ลงวันที่ 29 เมษายน 2568

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ.1-0041 พหลโยธิน - วัดมิ่งมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ 5,7

ตำบลห้วยบง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1,2 ตำบลเขาหินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 96/2568 ลงวันที่ 29 เมษายน 2568

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง ซึ่งทางห้างฯ พบปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดปัญหาและอุปสรรค 4 เรื่อง ดังนี้

1. หลังจากรื้อฝารางระบายน้ำ คสล.เดิมแล้ว พบว่า ความกว้างของฝารางระบายน้ำ คสล. มีขนาดความกว้างของราง ดังนี้

1.1 ฝารางระบายน้ำ ขนาด 0.36x0.60x0.10 ม.

1.2 ฝารางระบายน้ำ ขนาด 0.38x0.60x0.10 ม.

1.3 ฝารางระบายน้ำ ขนาด 0.59x0.60x0.10 ม.

2. พบแนวท่อลอดถนนคอนกรีตและแนวท่อน้ำประปาหมู่บ้าน,ประปาภูมิภาค อยู่ในลำรางระบายน้ำ คสล. ทำให้การขุดลอกมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

3. พบว่าแนวรางระบายน้ำบริเวณร้านค้าและทางขึ้นทางลงบ้านเรือน มีการนำแผ่นเหล็กมาปิดทับบนฝาคอนกรีตเดิมและทำการเทคอนกรีตทับหน้าอีกที แต่ยังสามารระบายน้ำได้

4. บริเวณ กม.0+463.4 – กม.0+546 (RT) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างผิวจราจร เดิม 5.50 เมตร เป็นระยะทางยาว 82.60 เมตร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและตัวแทนห้างฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ณ สถานที่ก่อสร้าง และครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ณ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จากมติที่ประชุม ห้างฯ ขอส่งหนังสือยินยอมแก้ไขสัญญาการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงขนาดฝารางระบายน้ำ คสล.ใหม่ ให้สอดคล้องกับความกว้างของรางระบายน้ำเดิม

2. ให้นำหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงทำการเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาคใหม่

3. ทำการตัดลดปริมาณงาน บริเวณที่มีการเทคอนกรีตทับหน้ารางระบายน้ำเดิมออก และบริเวณความกว้างถนนที่ไม่ถึง 6.00 เมตร ทำการปรับเพิ่มลดปริมาณงาน ฝารางระบายน้ำ คสล.ตามขนาดดังกล่าว ปรับเพิ่ม - ลดงานผิวจราจร เป็นงานผิวทางเชื่อม

// โดยเพิ่ม.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร

ทะเบียนการค้า สพ.1330 สำนักงานเลขที่ 557 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทร : 081-4610287 โทรสาร : (035) 969-670 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0723544000532

โดยเพิ่มการปฏิบัติงานจำนวน 5 รายการ คิดเป็นมูลค่างานเพิ่ม 2,013,544.06 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทหกสตางค์) ตัดลดงานจำนวน 4 รายการ คิดเป็นมูลค่างานลด 2,013,164.56 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) รวมเป็นมูลค่างานเพิ่ม 379.50 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) โดยผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเดิม พุทธจรรยา)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสบ.ถ1-0041 พหลโยธิน - วัดมงคลชัยพัฒนา
 หมู่ที่ 5,7 ต.ห้วยบงเชื่อมต่อหมู่ที่ 1,2 ต.เขาคินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
 ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร

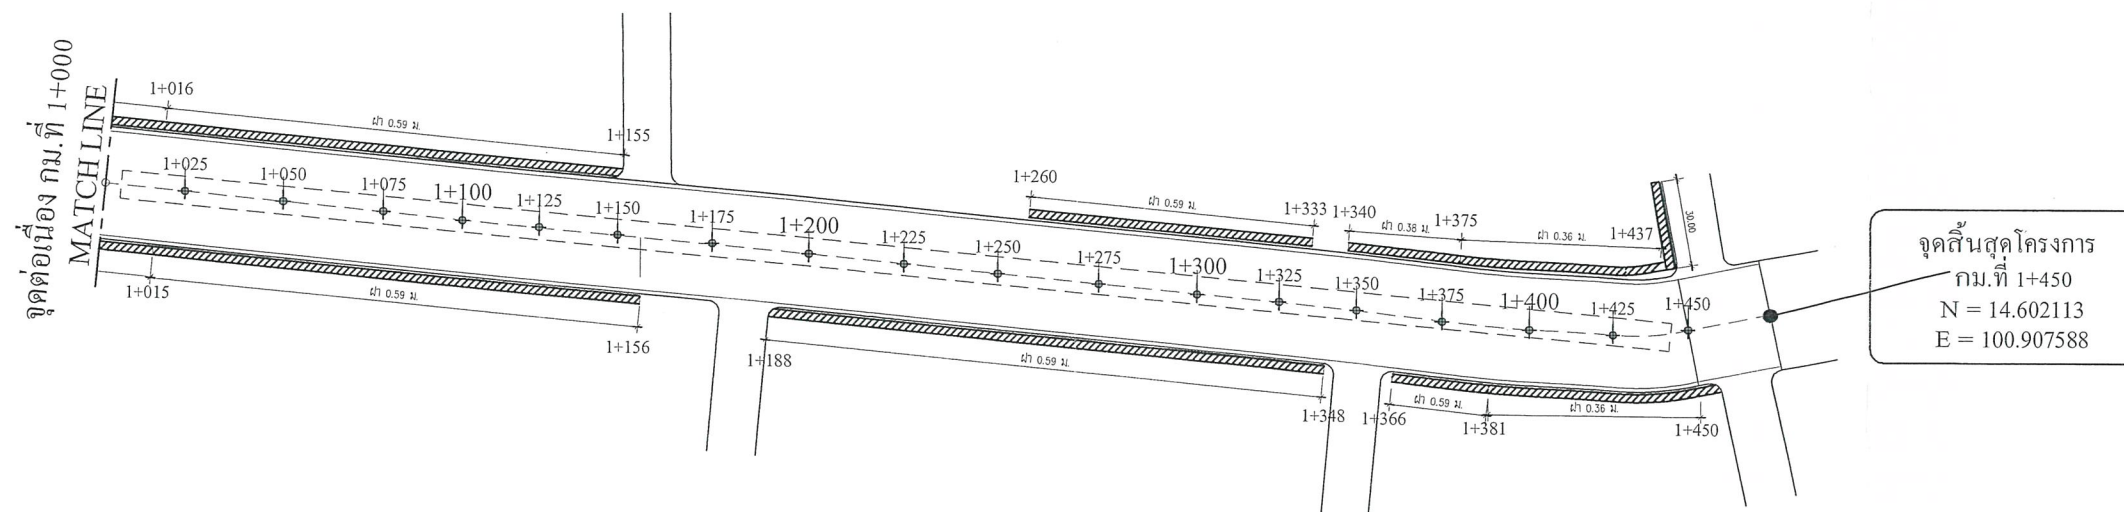

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางทิตยาพร เพชรประดับ
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสรารัตน์ สุขมะคัน
 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา



ลงชื่อ.....กรรมการ

นายมารุต ชาวสวน
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

ลงชื่อ.....ช่างคุมงาน

นายพงษ์กร เพชรประดับ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสบ.ถ1-0041 พหลโยธิน - วัดมงคลชัยพัฒนา
หมู่ที่ 5,7 ต.ห้วยบงเชื่อมต่อหมู่ที่ 1,2 ต.เขาคินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร

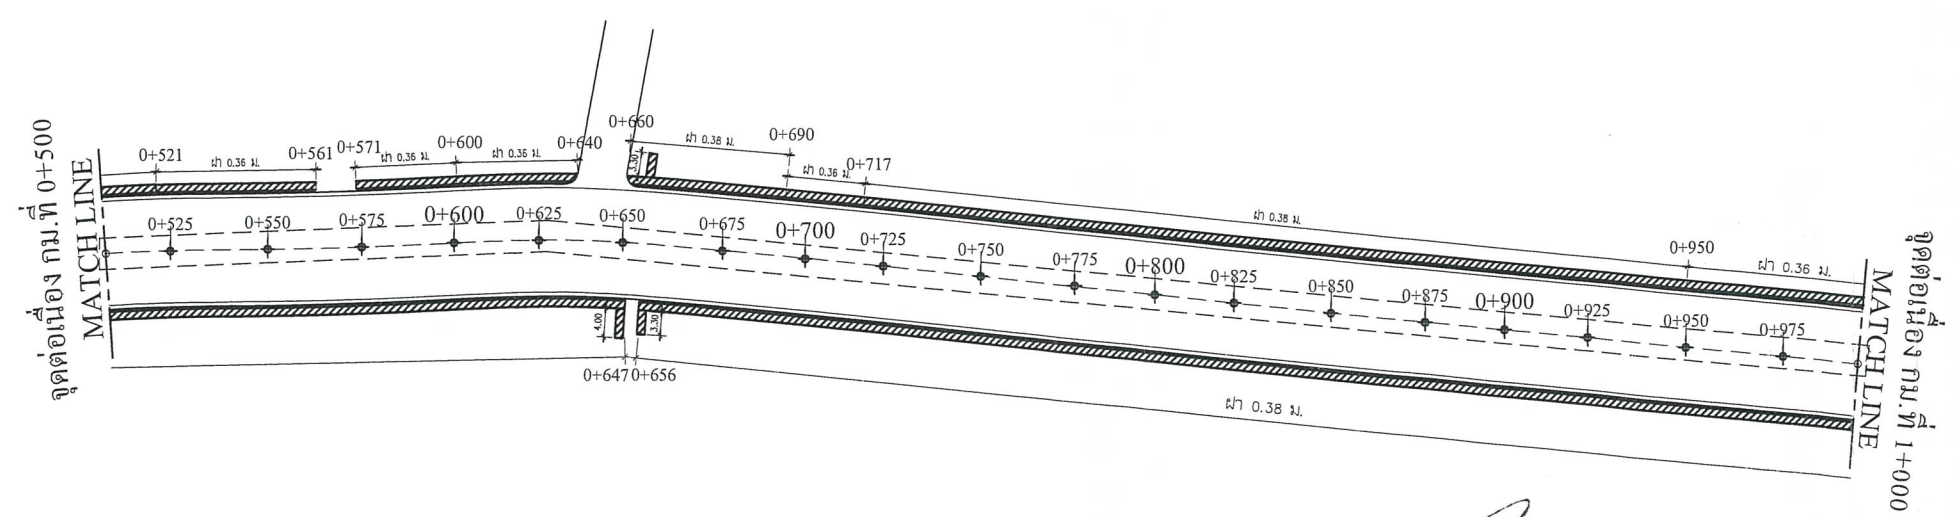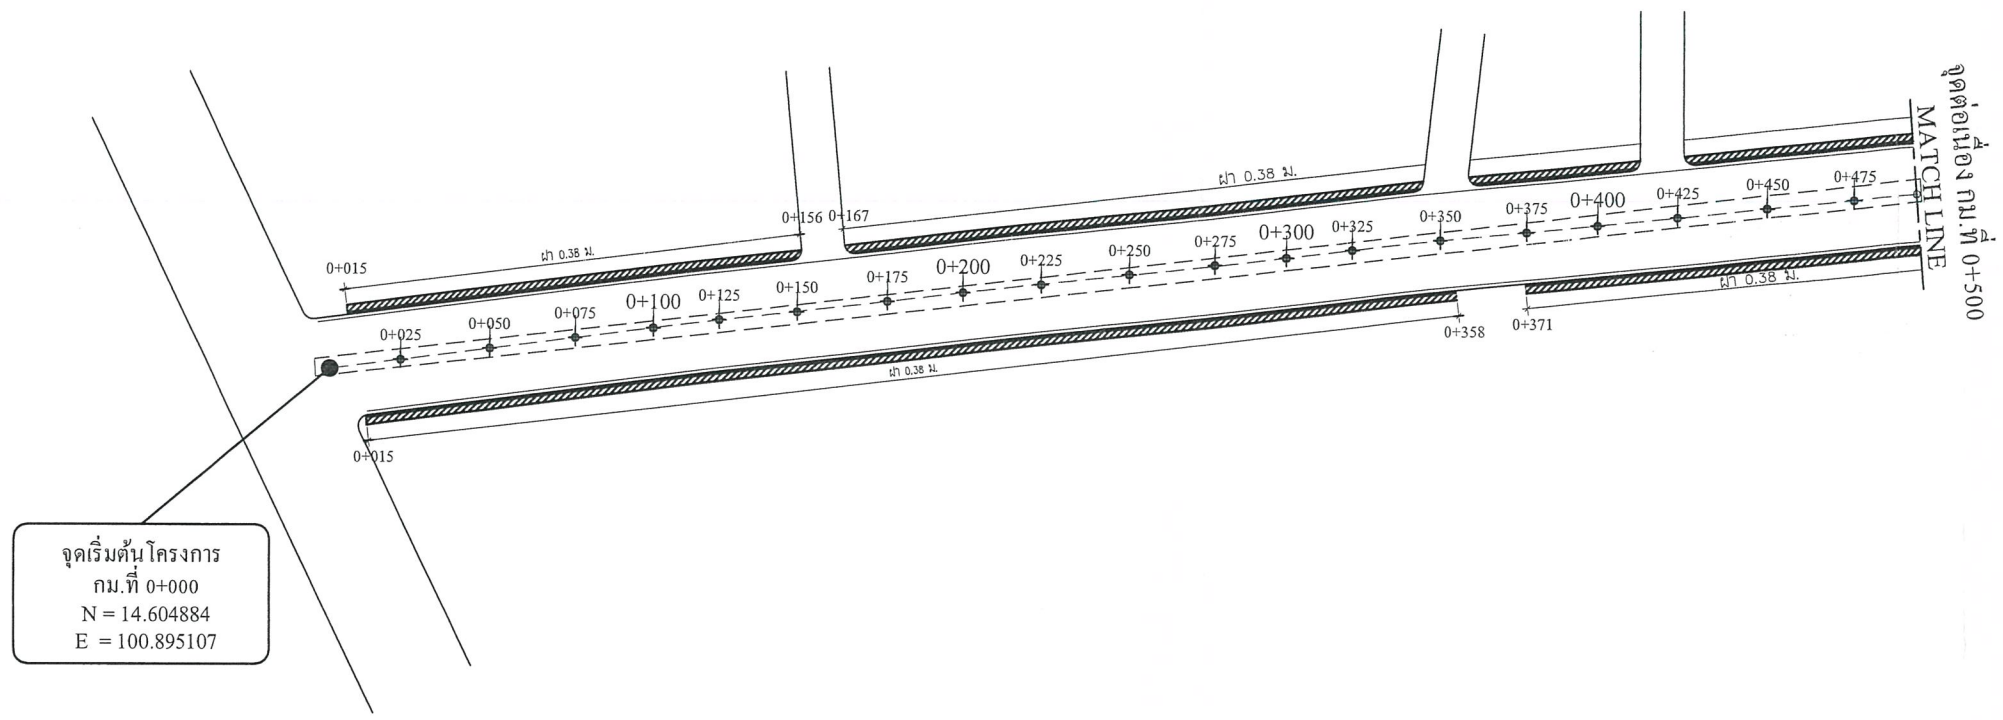

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นางทิตยาพร เพชรประดับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
นางสารรัตน์ สุขมะคัน
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายมารุต ขาวสวน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

ลงชื่อ.....ช่างคุมงาน
นายพงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0041 พหลโยธิน - วัดมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ 5,7 ตำบลห้วยบง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1,2 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

สัญญาจ้างเลขที่ 96/2568 ลงวันที่ 29 เมษายน 2568

งานตามแบบรูปและรายการ						ขอเปลี่ยนแปลง (+เพิ่ม , -ลด)					รวมเป็นปริมาณงาน		
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคางาน(บาท) ลด	ราคางาน(บาท) เพิ่ม	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคางาน (บาท)
1	งานดินคันทาง												
1.1	งานขุดไสผิวทางแอสฟัลต์เดิมลึก 0.05 ม. (Milling)	5,610.00	ตร.ม.	19.23	107,900.01	-	ตร.ม.	-	-	-	5,610.00	ตร.ม.	107,900.01
2	งานผิวจราจร Asphalt Concrete สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก												
2.1	งาน Tack Coat	8,700.00	ตร.ม.	21.71	188,899.80	41.30	ตร.ม.	21.71	896.73	-	8,658.70	ตร.ม.	188,003.07
2.2	งานผิวจราจร Asphalt Concrete	8,700.00	ตร.ม.	390.24	3,395,100.71	41.30	ตร.ม.	390.24	16,116.97	-	8,658.70	ตร.ม.	3,378,983.74
3	งานทางเชื่อม												
3.1	งาน Tack Coat	200.00	ตร.ม.	21.71	4,342.51	41.30	ตร.ม.	21.71	-	896.73	241.30	ตร.ม.	5,239.24
3.2	งานผิว Asphalt Concrete	200.00	ตร.ม.	390.24	78,048.29	41.30	ตร.ม.	390.24	-	16,116.97	241.30	ตร.ม.	94,165.26
5	งานป้ายจราจร												
5.1	ป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุก	1.00	ชุด	16,018.85	16,018.85	-	ชุด	-	-	-	1.00	ชุด	16,018.85
5.2	ป้ายจราจรแบบ ด.13	2.00	ชุด	4,059.20	8,118.39	-	ชุด	-	-	-	2.00	ชุด	8,118.39
5.3	ป้ายจราจรแบบ ด.15	1.00	ชุด	4,059.20	4,059.20	-	ชุด	-	-	-	1.00	ชุด	4,059.20
5.4	ป้ายจราจรแบบ ด.75	1.00	ชุด	4,059.20	4,059.20	-	ชุด	-	-	-	1.00	ชุด	4,059.20
5.5	ป้ายจราจรแบบ ด.77	2.00	ชุด	5,966.20	11,932.40	-	ชุด	-	-	-	2.00	ชุด	11,932.40
5.6	สัญญาไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ + ป้าย ด.15	1.00	ชุด	20,786.36	20,786.36	-	ชุด	-	-	-	1.00	ชุด	20,786.36
5.7	Guard Rail สำหรับทางตรงและทางโค้ง	148.00	ชุด	1,770.79	262,077.07	-	ชุด	-	-	-	148.00	ชุด	262,077.07
5.8	หมุดสะท้อนแสงชนิด 2 ทาง	120.00	ชุด	435.89	52,306.44	-	ชุด	-	-	-	120.00	ชุด	52,306.44
6	เครื่องหมายจราจร												
6.1	สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง + สีขาว)	579.30	ตร.ม.	395.02	228,836.58	-	ตร.ม.	-	-	-	579.30	ตร.ม.	228,836.58
6.2	เส้นหยุด	0.82	ตร.ม.	395.01	323.91	-	ตร.ม.	-	-	-	0.82	ตร.ม.	323.91
6.3	งาน Rumble Strip	20.93	ตร.ม.	626.59	13,114.47	-	ตร.ม.	-	-	-	20.93	ตร.ม.	13,114.47
7	งานซ่อมแซมทางระบายน้ำ												
7.1	ฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 x 0.60 x 0.10 ม.	4,580.00	ฝ่า	433.91	1,987,316.45	4,580.00	ฝ่า	433.91	1,987,316.45		0.00	ฝ่า	0.00
7.2	ฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.36 x 0.60 x 0.10 ม.	-	ฝ่า			563.00	ฝ่า	408.98		230,256.16	563.00	ฝ่า	230,256.16
7.3	ฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.38 x 0.60 x 0.10 ม.	-	ฝ่า			3,000.00	ฝ่า	423.45		1,270,339.85	3,000.00	ฝ่า	1,270,339.85
7.4	ฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.59 x 0.60 x 0.10 ม.	-	ฝ่า			870.00	ฝ่า	570.04		495,934.35	870.00	ฝ่า	495,934.35
7.5	ซ่อมแซมปากรางระบายน้ำ คสล	2,800.00	ม.	63.01	176,436.15	140.20	ม.	63.01	8,834.41	-	2,659.80	ม.	167,601.74
7.6	ขุดลอกคูระบายน้ำ	336.00	ลบ.ม.	40.86	13,730.43	-	ลบ.ม.	-	-	-	336.00	ลบ.ม.	13,730.43
8	งานป้ายโครงการ												
8.1	ป้ายโครงการ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	6,592.78	6,592.78	-	ชุด	-	-	-	1.00	ชุด	6,592.78
รวม					6,580,000.00				2,013,164.56	2,013,544.06			6,580,379.50
					ราคาก่อสร้างใหม่								
					ราคาก่อสร้างเดิม								
					งานเพิ่ม (+)								
					ปรับราคาเป็น								

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางทิติยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวรัตน สุขมะคัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายมารุต ชาวสวน)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ(วช.)

ลงชื่อ ช่างคุมงาน
(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/-

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑ - ๐๐๔๑ พหลโยธิน - วัดมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลห้วยบง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลเขาหินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามคำสั่งการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๔๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑ - ๐๐๔๑ พหลโยธิน - วัดมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลห้วยบง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลเขาหินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๙๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ มูลค่างานจ้าง ๖,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท กำหนดเริ่มงาน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา ๙๐ วัน โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร เป็นผู้รับจ้าง นั้น

จากการควบคุมงานก่อสร้างพบปัญหาและอุปสรรค ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. หลังจากรื้อฝารางระบายน้ำ คสล.เดิมแล้ว พบว่า ความกว้างของฝารางระบายน้ำ คสล. มีขนาดความกว้างของราง ดังนี้ รูปถ่ายตามเอกสารแนบหมายเลข ๑

๑.๑ ฝารางระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๖ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ ม.

๑.๒ ฝารางระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๘ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ ม.

๑.๓ ฝารางระบายน้ำ ขนาด ๐.๕๙ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ ม.

๒. พบแนวท่อลอดถนนคอนกรีตและแนวท่อน้ำประปาหมู่บ้าน, ประปาภูมิภาค อยู่ในลำรางระบายน้ำ คสล.ทำให้การขุดลอกมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รูปถ่ายตามเอกสารแนบหมายเลข ๒

๓. พบว่าแนวรางระบายน้ำบริเวณร้านค้าและทางขึ้นทางลงบ้านเรือน มีการนำแผ่นเหล็กมาปิดทับบนฝาคอนกรีตเดิมและทำการเทคอนกรีตทับหน้าอีกที แต่ยังสามารถระบายน้ำได้ รูปถ่ายตามเอกสารแนบหมายเลข ๓

๔. บริเวณ กม.๐+๔๖๓.๔ - กม.๐+๕๔๖ [RT] ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างผิวจราจรเดิม ๕.๕๐ เมตร เป็นระยะทางยาว ๘๒.๖๐ เมตร รูปถ่ายตามเอกสารแนบหมายเลข ๔

เห็นควรแจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ และนัดประชุมพิจารณาปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ และนัดประชุมพิจารณา

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง



ประธานกรรมการฯ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ทราบและเข้าร่วมประชุม



กรรมการฯ

(นางสรารัตน์ สุขมะตัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

- ทราบและเข้าร่วมประชุม











กรรมการฯ

(นายมารุต ชาวสวน)

วิศวกรโยธานำงานการพิเศษ(วช.)




เอกสารแนบหมายเลข ๑

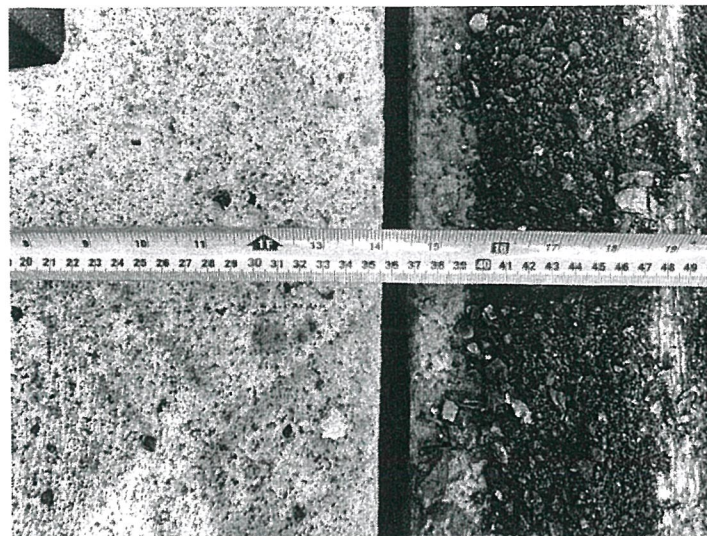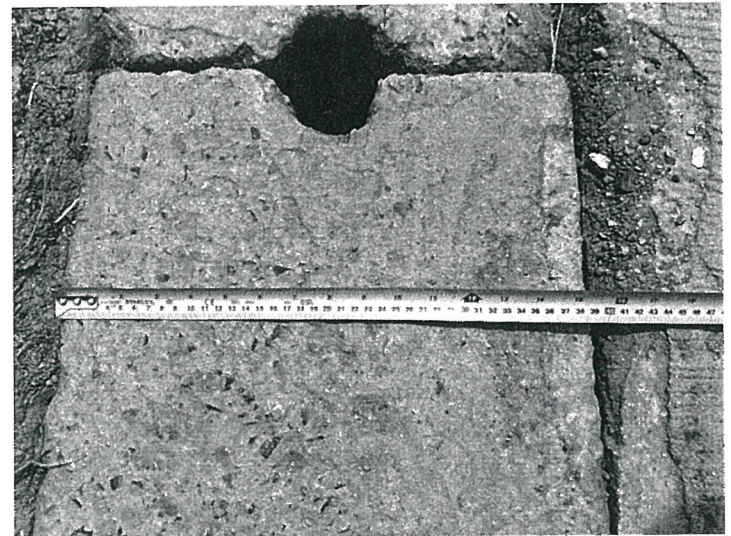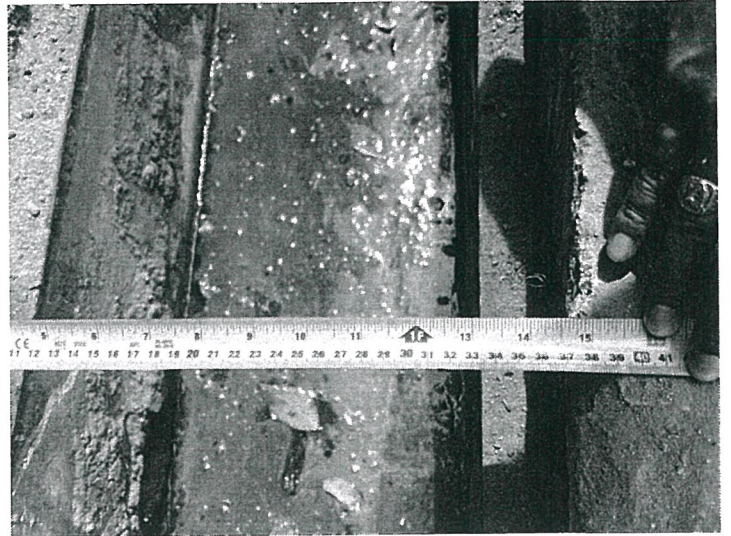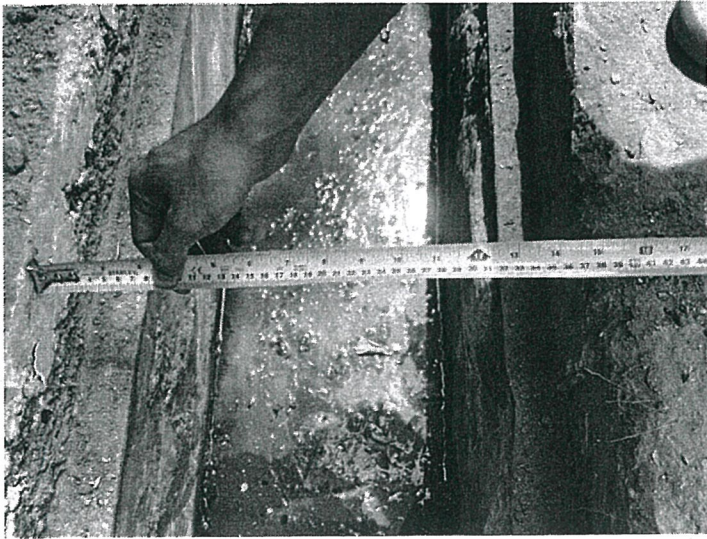

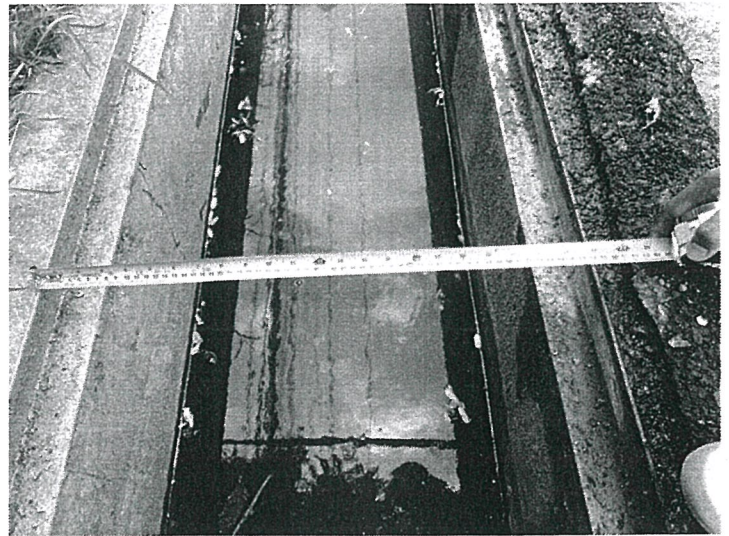
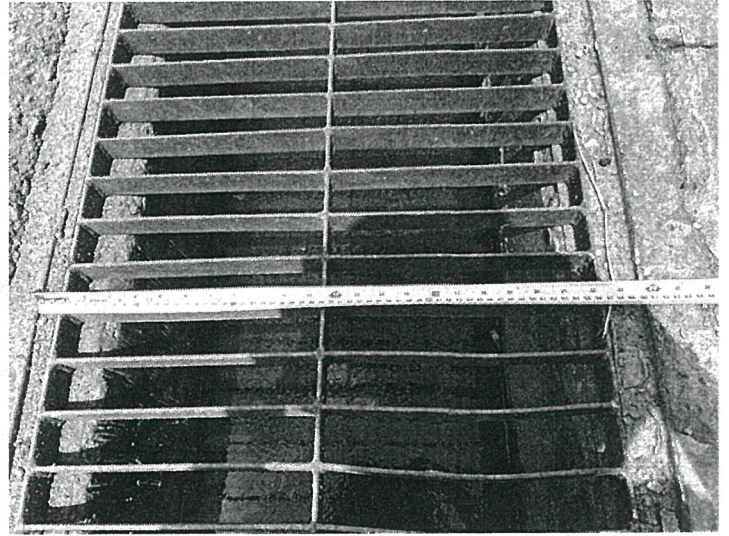
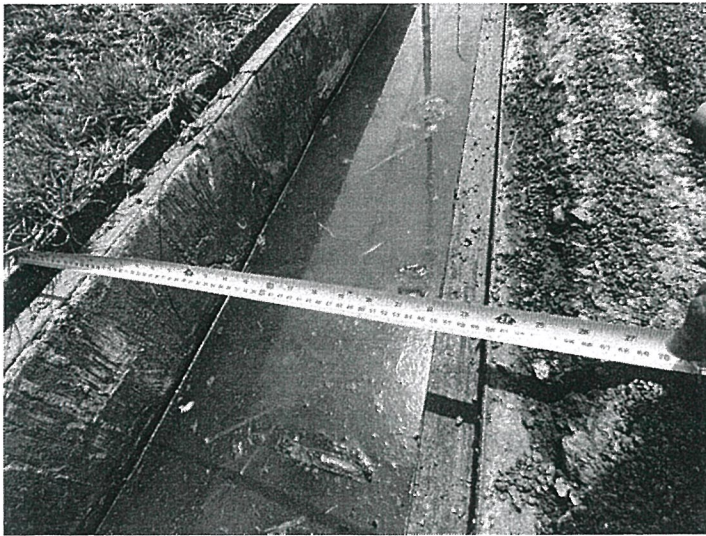
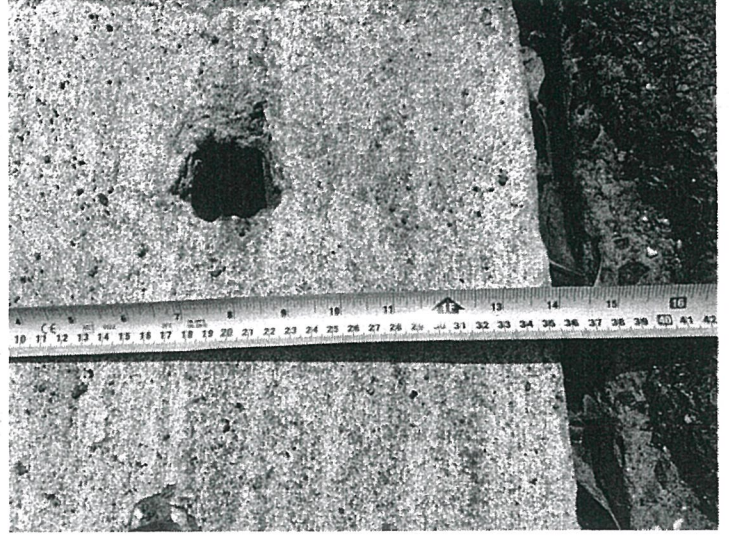



(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เอกสารแนบหมายเลข ๒

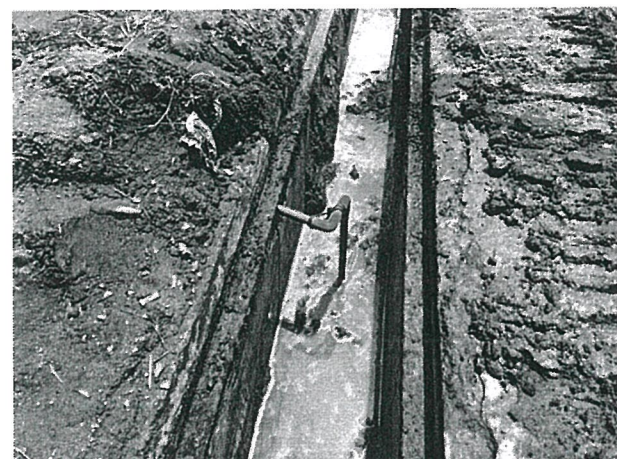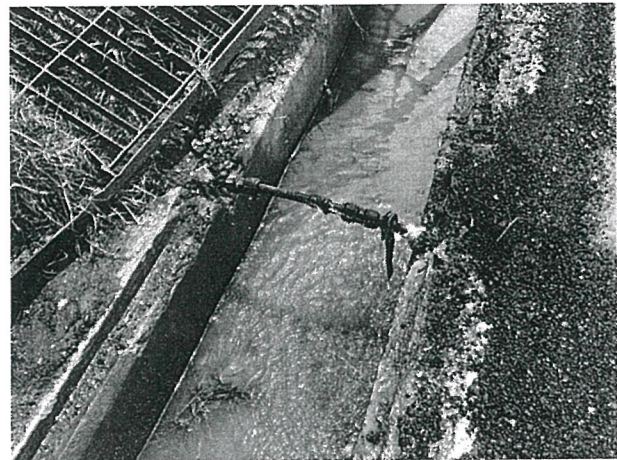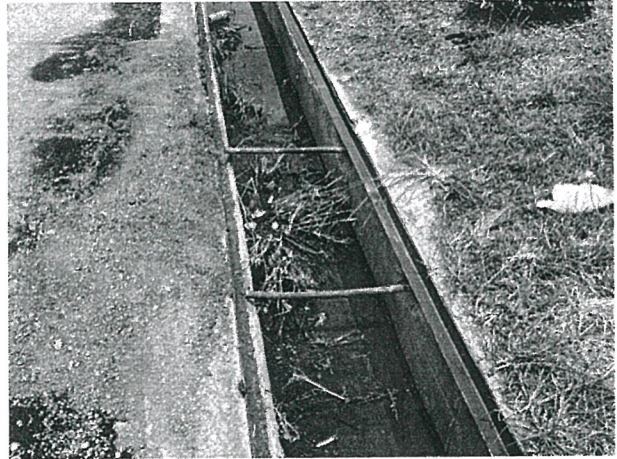








(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

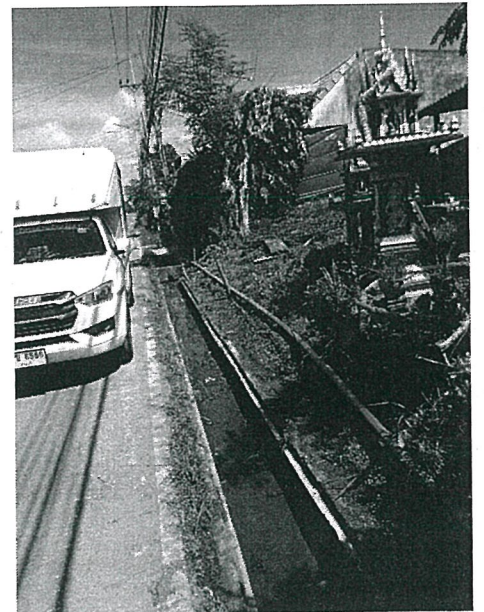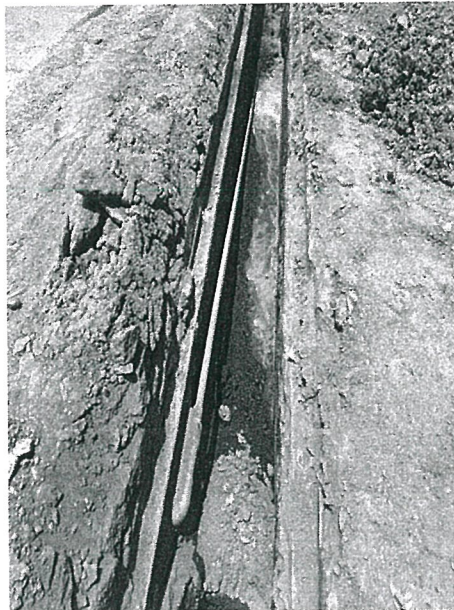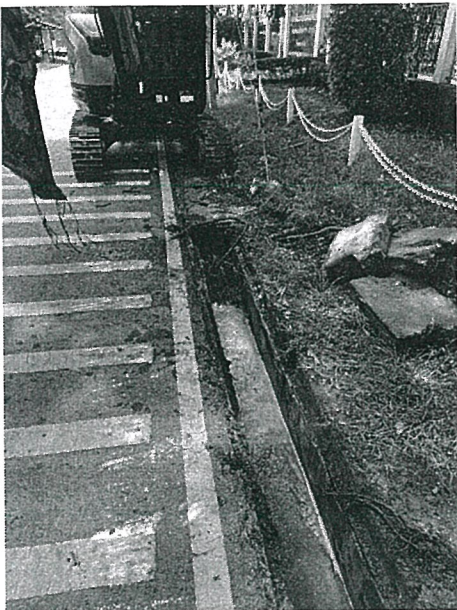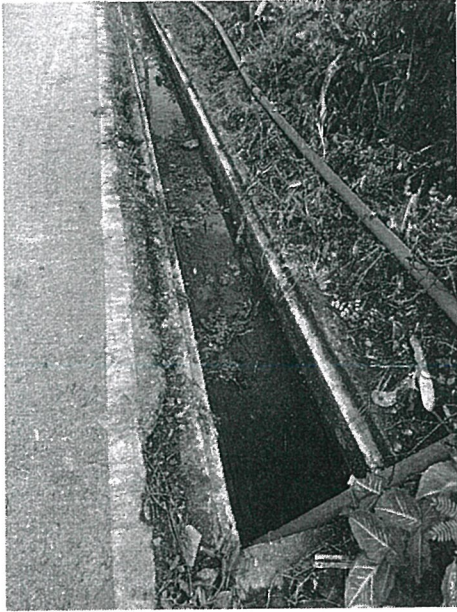







Signature

(นายพงศกร เพชรประดัก)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เอกสารแนบหมายเลข ๓

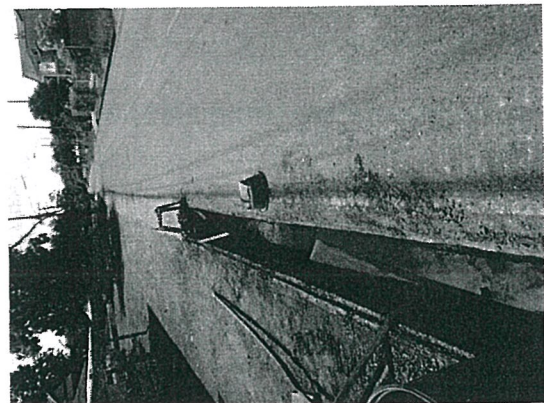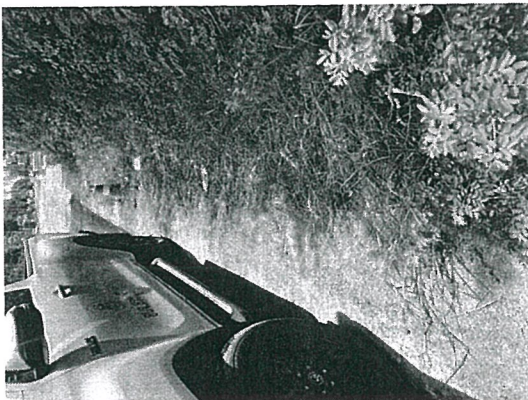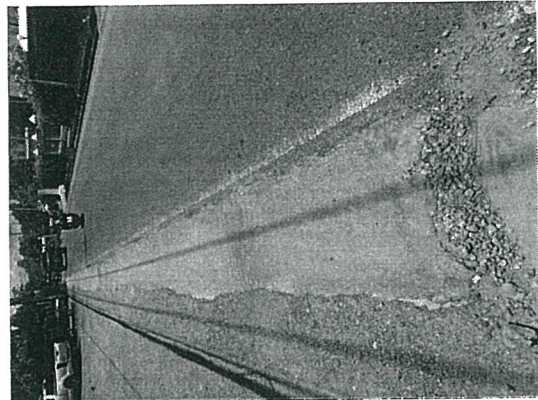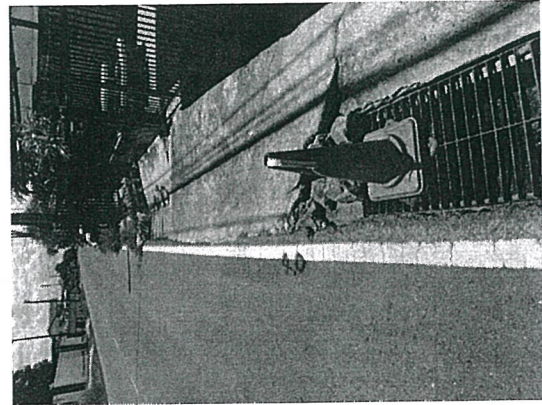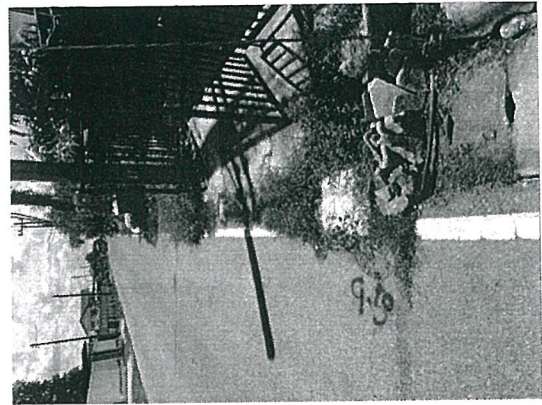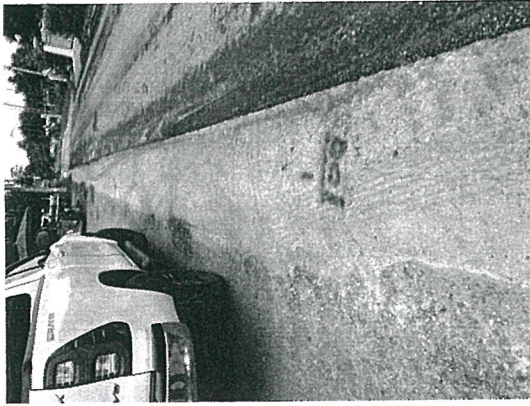


(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

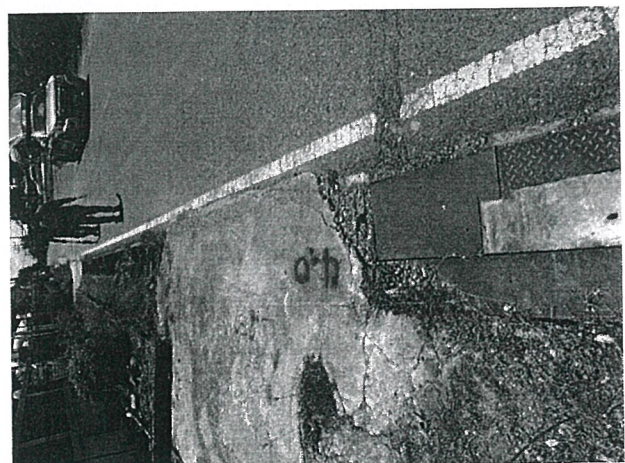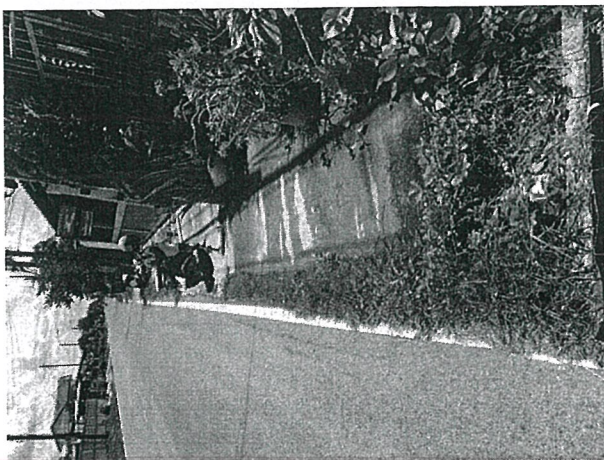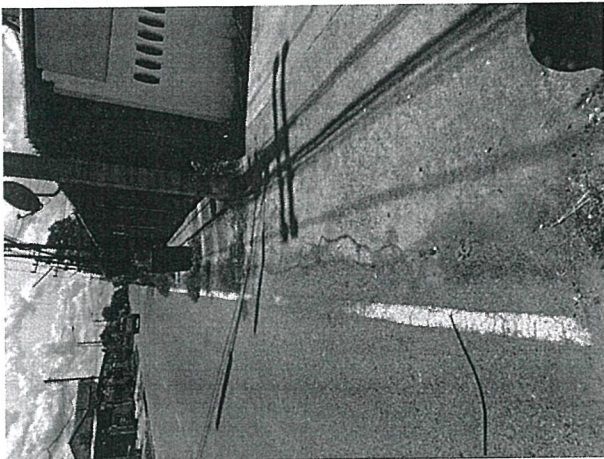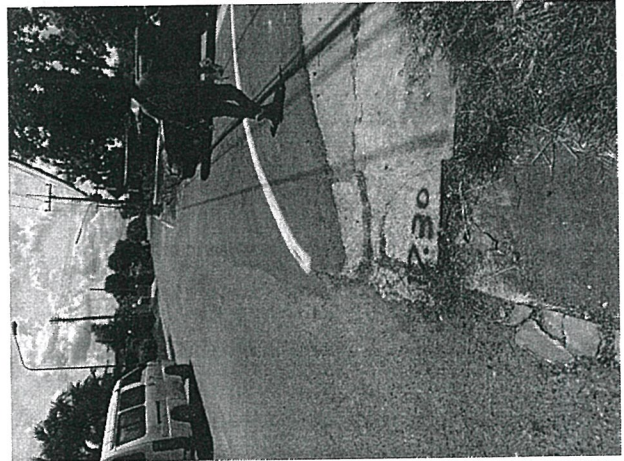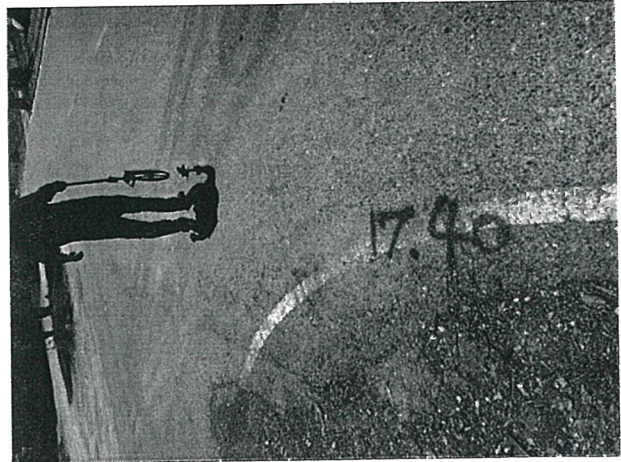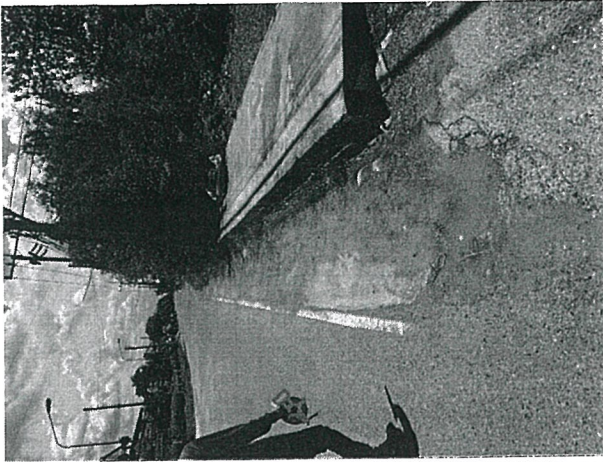


(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เอกสารแนบหมายเลข ๔



(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
