

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิสาหกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๗/๕ ถนนเทศบาล ๕ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป. ๐๐๑๗๘๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการดังกล่าว และรักษาผลประโยชน์ทางราชการ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานร่วมกันประชุม ณ ห้องประชุมสำนักช่าง รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๖๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิสาหกิจ ได้ดำเนินการสำรวจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ

พื้นที่ร่วมกับช่างคุมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้ช่วยช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และ ผู้นำชุมชน พบว่าในช่วง กม.ที่ ๑+๒๐๐ ถึง ๑+๓๕๐ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบก่อสร้าง เนื่องจาก เป็นแอ่งกระทะ มีน้ำท่วมขัง และทราบว่างค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาระบายน้ำอยู่แล้ว ทางข้างจึงมีความเห็นว่าควรตัดปริมาณงาน จากสัญญา

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้ ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ พบว่าพื้นที่ก่อสร้าง ช่วง กม.ที่ ๑+๒๐๐ ถึง ๑+๓๕๐ เป็นพื้นที่รับน้ำ ในช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาระบายน้ำอยู่แล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัด ผู้รับจ้างพร้อมด้วยผู้ควบคุมงานร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓. คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีมติการปรับลดปริมาณงานในโครงการ ช่วง กม.ที่ ๑+๒๐๐ ถึง ๑+๓๕๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๗๑,๒๕๐.๐๐ บาท มีการปรับลดปริมาณงานตามรายการดังนี้

- ๑) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING) เป็นเงิน ๑๑,๗๕๗.๐๔ บาท
- ๒) งานชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (๐.๑๐ ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE) เป็นเงิน ๓๔,๘๑๕.๔๔ บาท
- ๓) งานชั้นพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) (๐.๑๕ ม.) เป็นเงิน ๖๑,๖๓๑.๐๑ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด (งวดที่ ๑) เป็นเงิน ๑๐๘,๒๐๓.๔๙ บาท

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท มีการปรับลดปริมาณงาน ตามรายการดังนี้

- ๑) งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIMECOAT) เป็นเงิน ๓๓,๕๗๓.๒๒ บาท
- ๒) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สีภักดี)
ผู้รับมอบอำนาจ

WEARING COURSE) เป็นเงิน ๒๖๕,๗๒๗.๓๐ บาท

๓) สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) เป็นเงิน ๑๒,๑๑๐.๗๖ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด (งวดที่ ๒) เป็นเงิน ๓๒๑,๔๑๑.๒๕ บาท

แก้ไขค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างเดิม เป็นเงิน ๖,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ค่างานส่วนที่ตัดลด เป็นเงิน ๔๒๕,๖๕๔.๗๘ บาท คงเหลือค่างานตามสัญญาจ้างที่แก้ไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๕๙,๓๔๕.๒๒ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์) โดยแบ่งเป็น ๒ งวดงาน ดังนี้

๑. แก้ไขงวดที่ ๑ จำนวนเงินเดิม ๑,๖๗๑,๒๕๐.๐๐ บาท มีการปรับลด เป็นเงิน ๑๐๘,๒๔๓.๔๕ บาท คงเหลือ ๑,๕๖๓,๐๐๖.๕๕ บาท

๒. แก้ไขงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินเดิม ๕,๐๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท มีการปรับลด เป็นเงิน ๓๒๑,๔๑๑.๒๕ บาท คงเหลือ ๔,๖๙๒,๓๓๘.๗๕ บาท

๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร มีหนังสือยินยอมปรับลดปริมาณงาน, ตัดลดค่าก่อสร้าง และงวดเงิน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี โดยใช้วงเงินงบประมาณตาม สัญญาจ้างที่แก้ไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๕๙,๓๔๕.๒๒ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์) รายละเอียดตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร ที่ วณ.๗๔๑/๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๕. วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

วงเงินค่าก่อสร้างเดิม เป็นเงิน ๖,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แก้ไขเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าก่อสร้างใหม่ เป็นเงิน ๖,๒๕๙,๓๔๕.๒๒ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์)

ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๓๗,๓๓๖.๔๕ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยดีอัตราค่า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ

รวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๗๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างขนาดใหญ่ (ก.๒) แล้วเสร็จ
- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทาง งานชั้นพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทาง แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจร Asphalt Concrete แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายบนผิวทางสีเทอร์โม (สีเหลือง+สีขาว) แล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กำหนด

ไว้ในข้อ ๒๐ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ /

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๒๕๕,๓๔๕.๒๒ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๖๓,๐๐๖.๕๑ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันหกบาทห้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างขนาดใหญ่ (ก.๒) แล้วเสร็จ
- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- งานชั้นรองพื้นทาง งานชั้นพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทาง แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๘๒,๓๓๘.๗๑ บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจร Asphalt Concrete แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายบนผิวทางสีเทอร์โม (สีเหลือง+สีขาว) แล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๖,๗๑๒.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับตั้งจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ผู้รับมอบอำนาจ

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๑๕,๖๓๘.๓๖ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัด จากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงาน แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วน ที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกลีกสัญญาได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกลีกสัญญาได้อีกด้วย

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วน หนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ นอกจากการแก้ไขเอกสารแนบท้าย ฉบับนี้แล้ว ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สีกสิริ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ผู้รับมอบอำนาจ

ทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน แลคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณภาพัช แสงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒนะ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๖๒๙๙

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับลดปริมาณงาน, ตัดลดค่าก่อสร้าง และงวดเงิน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๖๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง อำเภอมัญจาคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง อำเภอมัญจาคีรี เป็นเงิน ๖,๖๘๕,๐๐๐.- บาท (หกล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๑.๓ หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ที่ วณ.๗๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

๑.๔ หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ สป ๗๒๗๐๓/๗๐๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอให้ตัดลดระยะทางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ร่วมกับ ช่างคุมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้ช่วยช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และผู้นำชุมชน พบว่าในช่วง กม.ที่ ๑+๒๐๐ ถึง ๑+๓๕๐ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบก่อสร้าง เนื่องจากเป็นแอ่งกระทะ มีน้ำท่วมขัง และทราบว่างค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างตลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำอยู่แล้ว ทางห้างจึงมีความเห็นว่าควรตัดปริมาณงานจากสัญญา (รายละเอียดตามเรื่องเดิม ข้อ ๑.๓)

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ พบว่าพื้นที่ก่อสร้าง ช่วง กม.ที่ ๑+๒๐๐ ถึง ๑+๓๕๐ เป็นพื้นที่รับน้ำ ในช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างตลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำอยู่แล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้นัดผู้ รับจ้างพร้อมด้วยผู้ควบคุมงานร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๒.๓ คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีมติการปรับลดปริมาณงานในโครงการ ช่วง กม.ที่ ๑+๒๐๐ ถึง ๑+๓๕๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๗๑,๒๕๐.๐๐ บาท มีการปรับลดปริมาณงานตามรายการดังนี้

๑) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING) เป็นเงิน ๑๑,๗๙๗.๐๔ บาท

-/๒) งานชั้นรองพื้นทาง...

-๒-

๒) งานชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (๐.๑๐ ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE) เป็นเงิน ๓๔,๘๑๕.๔๔ บาท

๓) งานชั้นพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) (๐.๑๕ ม.) เป็นเงิน ๖๑,๖๓๑.๐๑ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด (งวดที่ ๑) เป็นเงิน ๑๐๘,๒๔๓.๔๕ บาท

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท มีการปรับลดปริมาณงานตามรายการดังนี้

๑) งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIMECOAT) เป็นเงิน ๓๓,๕๗๓.๒๒ บาท

๒) งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) เป็นเงิน ๒๗๕,๗๒๗.๓๐ บาท

๓) สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) เป็นเงิน ๑๒,๑๑๐.๗๗ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด (งวดที่ ๒) เป็นเงิน ๓๒๑,๔๑๑.๒๙ บาท

แก้ไขค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างเดิม เป็นเงิน ๖,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ค่างานส่วนที่ตัดลด เป็นเงิน ๔๒๙,๖๕๔.๗๘ บาท คงเหลือค่างานตามสัญญาจ้างที่แก้ไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๕๕,๓๔๕.๒๒ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์) โดยแบ่งเป็น ๒ งวดงาน ดังนี้

๑. แก้ไขงวดที่ ๑ จำนวนเงินเดิม ๑,๖๗๑,๒๕๐.๐๐ บาท มีการปรับลดเป็นเงิน ๑๐๘,๒๔๓.๔๕ บาท คงเหลือ ๑,๕๖๓,๐๐๖.๕๕ บาท

๒. แก้ไขงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินเดิม ๕,๐๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท มีการปรับลด เป็นเงิน ๓๒๑,๔๑๑.๒๙ บาท คงเหลือ ๔,๖๙๒,๓๓๘.๗๑ บาท

๒.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร มีหนังสือยินยอมปรับลดปริมาณงาน, ตัดลดค่าก่อสร้าง และงวดเงิน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี โดยใช้วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างที่แก้ไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๕๕,๓๔๕.๒๒ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์) รายละเอียดตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ที่ วน.๗๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. ข้อยกหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้สัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุดำเนินการขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

-(๔) ในวันกำหนด...

(๕) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงาน แต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงาน จ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ


๔.๑ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรักษามลประโยชน์ทางราชการ เห็นควร อนุมัติตัดลดปริมาณงาน ตัดลดค่าก่อสร้าง และงวดเงินในสัญญาจ้างตามที่ได้รับจ้างและองค์การบริหารส่วน ตำบลวังม่วงร้องขอ ตามรายละเอียดตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และราคา


๔.๒ แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....
(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ).....
(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ).....
(นายพรชัย แก้วบังวัน)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

-อนุส.
-อ.พรช.ระกษ.


(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)


เรียน นายก อบจ.สระบุรี

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

- เพื่อโปรดพิจารณาและลงนามรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(นางสาวนิภา ประชีพอาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


.....ผอ.ส่วนฯ
.....หน.ฝ่ายฯ
.....เจ้าหน้า
.....ผู้พิมพ์

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

สัญญาจ้างเลขที่ 139/2568 ลงวันที่ 1 กันยายน 2568 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีอิทธิพล

ที่	งานที่ดำเนินการ	ตามสัญญาจ้าง			งานที่ตัดลด			ตามแบบที่ก่อสร้างจริง		
		ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง 1.1 งานรองพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING) 1.2 งานชั้นรองพื้นทางวัสดุผสม (0.10 ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.3 งานชั้นพื้นทางหินคลุก (0.15 ม.) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE)	13,225.00	ตร.ม.	180,887.96	862.50	ตร.ม.	11,797.04	12,362.50	ตร.ม.	169,090.92
		1,288.00	ลบ.ม.	533,836.74	84.00	ลบ.ม.	34,815.44	1,204.00	ลบ.ม.	499,021.30
		1,803.00	ลบ.ม.	945,064.76	117.58	ลบ.ม.	61,631.01	1,685.42	ลบ.ม.	883,433.75
2	งานผิวทาง 2.1 งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมิคอต (PRIMECOAT) (พื้นชั้นรอง)	11,500.00	ตร.ม.	514,789.42	750.00	ตร.ม.	33,573.22	10,750.00	ตร.ม.	481,216.20
3	งานป้ายจราจร 3.1 ป้ายจราจร แบบ ด1-ด27	11,500.00	ตร.ม.	4,227,818.53	750.00	ตร.ม.	275,727.30	10,750.00	ตร.ม.	3,952,091.23
4	งานเครื่องหมายบนผิวทาง 4.1 เส้นแบ่งช่องจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (เส้นเหลือง + สีขาว) 4.2 Rumble Strip 4.3 สัญลักษณ์เตือนไฟกระพริบ + ป้ายจราจรแบบ บ1	3.00	ชุด	10,980.85	-	ชุด		3.00	ชุด	10,980.85
		1.00	ชุด	3,660.28	-	ชุด		1.00	ชุด	3,660.28
		3.00	ชุด	62,716.24	-	ชุด		3.00	ชุด	62,716.24
5	รวมเป็นเงิน 5.1 ป้ายโครงการ	518.00	ตร.ม.	184,511.15	34.00	ตร.ม.	12,110.77	484.00	ตร.ม.	172,400.38
		18.90	ตร.ม.	10,678.61	0.65	ตร.ม.		18.25	ตร.ม.	10,678.61
		4.14	ตร.ม.	1,474.66	0.14	ตร.ม.		4.00	ตร.ม.	1,474.66
		1.00	ชุด	8,580.80	-	ชุด		1.00	ชุด	8,580.80
				6,685,000.00			429,654.78			6,255,345.22

ค่าจ้างตามสัญญาจ้างเดิม 6,685,000.00
 ค่างานส่วนที่ตัดลด 429,654.78
 ค่าจ้างตามสัญญาจ้างที่แก้ไข 6,255,345.22

ผู้ควบคุมงาน (นายศิริยุทธ ศรีเงิน) ผู้ควบคุมงาน (นางศรารัตน์ สุขมระต้น) กรรมการ (นางพิทยาพร เพชรประดับ) ประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ (นายพรชัย แก้วบัวเงิน)

เอกสารแนบท้าย สัญญาข้อที่.....หน้า.....



ที่ วณ.741/1/2568

10 ตุลาคม 2568

เรื่อง ยินยอมปรับลดปริมาณงาน, ตัดลดค่าก่อสร้าง และงวดเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผ่านผู้ควบคุมงาน

- อ้างถึง 1. สัญญาเลขที่ 139/2568 ลงวันที่ 1 กันยายน 2568
2. หนังสือที่ วณ.723/2568 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568
3. ระเบียบวาระการประชุม เรื่อง ขอบปรับลดค่างาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 10 ตุลาคม 2568

ตามสัญญาที่อ้างถึงข้อ (1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิชนชากร เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี นั้น

ตามที่อ้างถึงข้อ (2) ทางข้างฯ ได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง พบว่าในช่วงกม.ที่ 1+200 - 1+350 เป็นแอ่งกระทะ มีน้ำท่วมขัง จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามรูปแบบก่อสร้าง

และตามที่อ้างถึงข้อ (3) ระเบียบวาระการประชุม เรื่อง ขอบปรับลดค่างาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีมติที่ประชุม เห็นควรปรับลดค่างาน จวดงาน-งวดเงิน โดยปรับลดค่างาน 429,654.78 บาท ค่างานตามสัญญาจ้างที่แก้ไขเป็นเงินทั้งสิ้น 6,255,345.22 บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์)

ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง ทางข้างฯ ยินยอมปรับลดปริมาณงาน, ตัดลดค่าก่อสร้าง และงวดเงิน ตามปริมาณงานและราคาที่เปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ




(นางวนิดา ศิริพัฒนกุล)

ผู้จัดการ

เรื่อง ขอบปรับลดค่างาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักช่าง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร
เป็นผู้รับจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน
๖,๖๘๕,๐๐๐.- บาท (หกล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

รายงานการประชุม

เรื่อง ขอบปรับลดค่างาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักช่าง

รายชื่อผู้ประชุม ๕ ท่าน

๑.	นางทิตยาพร เพชรประดับ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการ
๒.	นางสรารัตน์ สุขมะดัน	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	กรรมการ
๓.	นายพรชัย แก้วบังวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)	กรรมการ
๔.	นายจิรยุทธ ศรีเจิม	นายช่างโยธาอาวุโส	ผู้ควบคุมงาน
๕.	นายจิตรยุทธ เลหาชะโชติ	ช่างหุ่นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร	ผู้รับจ้าง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร เป็นผู้รับจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้คณะกรรมการ และผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ร่วมกับ ช่างคุมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้ช่วยช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และผู้นำชุมชน พบว่าในช่วง กม.ที่ ๑+๒๐๐ ถึง ๑+๓๕๐ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบก่อสร้าง เนื่องจากเป็นแอ่งกระทะ มีน้ำท่วมขัง

คณะกรรมการ

ตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ พบว่าพื้นที่ก่อสร้าง ช่วง กม.ที่ ๑+๒๐๐ ถึง ๑+๓๕๐ เป็นพื้นที่รับน้ำ ในช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างตลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำอยู่แล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ตัดลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้างในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ออกตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และผู้รับจ้างร้องขอ โดยให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และราคาตามหลักวิชาช่าง

ช่างผู้ควบคุมงาน

จัดทำรายละเอียดแก้ไขปริมาณงาน และราคา โครงการ ช่วง กม.ที่ ๑+๒๐๐ ถึง ๑+๓๕๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้

-งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๗๑,๒๕๐.๐๐ บาท มีการปรับลดปริมาณงาน ตามรายการดังนี้

๑) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING) เป็นเงิน ๑๑,๗๙๗.๐๕ บาท

๒) งานชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (๐.๑๐ ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE) เป็นเงิน ๓๔,๘๑๕.๔๕ บาท

๓) งานชั้นพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) (๐.๑๕ ม.) เป็นเงิน ๖๑,๖๓๑.๐๑ บาท

๔) รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด (งวดที่ ๑) เป็นเงิน ๑๐๘,๒๔๓.๕๑ บาท

-งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท มีการปรับลดปริมาณงาน ตามรายการดังนี้

๑) งานลาดยางแอสฟัลต์โพรไมค์ (PRIMECOAT) เป็นเงิน ๓๓,๕๗๓.๒๒ บาท

๒) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) เป็นเงิน ๒๗๕,๗๒๒.๓๐ บาท

๓) สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) เป็นเงิน ๑๒,๑๑๐.๗๗ บาท

๔) รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด (งวดที่ ๒) เป็นเงิน ๓๒๑,๔๑๑.๒๙ บาท

๕) แก้ไขค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างเดิม เป็นเงิน ๖,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ค่างาน ส่วนที่ตัดลด เป็นเงิน ๔๒๙,๖๕๔.๗๘ บาท ค่างานตามสัญญาจ้างที่แก้ไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๕๕,๓๔๕.๒๒ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อย สี่สิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์) โดยแบ่งเป็น ๒ งวดงาน ดังนี้

๕.๑ แก้ไขงวดที่ ๑ จำนวนเงินเดิม ๑,๖๗๑,๒๕๐.๐๐ บาท มีการปรับลดเป็นเงิน ๑๐๘,๒๔๓.๕๑ บาท คงเหลือ ๑,๕๖๓,๐๐๖.๕๑ บาท

๕.๒ แก้ไขงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินเดิม ๕,๐๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท มีการปรับลด เป็นเงิน ๓๒๑,๔๑๑.๒๙ บาท คงเหลือ ๔,๖๙๒,๓๓๘.๗๑ บาท

คณะกรรมการ

การแก้ไขปรับปรุงปริมาณงาน จะไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เกิดความเสียหาย

มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นควรปรับลดค่างาน งานงาน-งวดเงิน โดยปรับลด ปริมาณงาน และแก้ไขแบบแปลนแก้ไขงวดงาน-งวดเงิน ให้ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างจริง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธานกรรมการ

ขอให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามมติ
ที่ประชุม และจัดทำเอกสารเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา
พร้อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขวงงาน

ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการในครั้งนี้
และขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๔.๓๐ น.


(นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักช่าง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางทิติยาพร เพชรประดับ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการ		
๒.	นางสรวิรัตน์ สุขมะดัน	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	กรรมการ		
๓.	นายพรชัย แก้วบังวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)	กรรมการ		
๔.	นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม	นายช่างโยธาอาวุโส	ผู้ควบคุมงาน		
๕.	นายจิตรยุทธ เลาทะโชติ	หัวหน้าส่วนจำกัด สรรพวิชากร	ผู้รับจ้าง		



เอกสารแนบท้าย สัญญาข้อที่..... หน้า ๑๗

กรุงเทพมหานคร-สระบุรี

17/9 ถ.เทศบาล 5 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 0-3673-2107, แฟกซ์: 0-3673-2106

E-mail: scsb@dot.go.th

เลขที่.....

1356

เวลา 09.11

สำนักงานช่าง

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบ

ที่ วณ.723/2568

26 กันยายน 2568

เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผ่านผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 139/2568 ลงวันที่ 1 กันยายน 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

สำนักงานช่าง อบจ.สระบุรี	เลขที่รับ 4889 วันที่ 4/10/68 เวลา.....
☐ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายสำรวจ ☐ - ฝ่ายออกแบบ ☐ ☐ ผังงาน/พิมพ์แปลน	☐ ส่วนการโยธา - ฝ่ายการขุดดิน ☐ - ฝ่ายโยธาและจักรกล ☐ - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ☐

ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิมลชากร เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี นั้น

จากการสำรวจพื้นที่หน้างานกับช่างคุมงานอบจ.สระบุรี ผู้ช่วยช่างอบต.วังม่วง และผู้นำชุมชน พบว่าในช่วง กม.ที่ 1+200 – 1+350 ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบก่อสร้าง เนื่องจากเป็นแอ่งกระทะ มีน้ำท่วมขัง และทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีความคิดที่จะดำเนินการก่อสร้างท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำอยู่แล้ว ทางจ้างจึงมีความเห็นว่าควรตัดปริมาณงานจากสัญญาจ้าง รายละเอียดดังนี้

ปรับลดปริมาณงานในโครงการ ช่วง กม.ที่ 1+200 – 1+350 ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 750.00 ตารางเมตร

1. งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING) เป็นเงิน 11,797.04 บาท
2. งานชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (0.20 ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE) เป็นเงิน 34,815.44 บาท
3. งานชั้นพื้นทางหินคลุก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) (0.15 ม.) เป็นเงิน 61,631.01 บาท
4. งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIMECOAT) (พื้นหินคลุก) เป็นเงิน 33,573.22 บาท
5. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) เป็นเงิน 275,727.30 บาท
6. สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) เป็นเงิน 12,110.77 บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด 429,654.78 บาท และคงเหลือค่าก่อสร้าง 6,255,345.22 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดดำเนินการให้กับจ้างฯ ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ

(นางวนิดา ศิริพัฒกุล)

ผู้จัดการ

ภาพถ่ายปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง





ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
๒๓ หมู่ที่ ๕ ถนนวังม่วง – ซับสนุ่น
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๒๐

เรื่อง ขอให้ตัดลดระยะทางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

สำนักช่าง อปจ.สระบุรี	เลขที่รับ 4862 วันที่ 17-10-68 เวลา 11.45
☒ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายสำรวจ ☐ - ฝ่ายออกแบบ ☐ ☐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	☐ ส่วนการเงิน - ฝ่ายบริหารงบประมาณ ☐ - ฝ่ายพัสดุ ☐ - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ☐

(นายต๋องกร ทองทัช) ณ เชียงใหม่
ขอออกแบบ วิชาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

(นายจิรพล บุญคือ)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

รายการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม—ลด

สัญญาจ้างเลขที่ 139/2568

ลงวันที่ 1 กันยายน 2568 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เอกสารแนบท้าย สัญญาข้อที่.....หน้า.....๑๕
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบเลขที่ 26/67.



โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่.....๑๓๙/๒๕๖๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน.....๑๕.....หน้า (ครั้งที่ ๑)


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน


ฝ่ายสำรวจและฝ่ายออกแบบ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



แผนที่โดยสังเขป



โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง
สถานที่ หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,150.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,750.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 26/67



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลด

สัญญาจ้างเลขที่ 139/2568

ลงวันที่ 1 กันยายน 2568 (แก้ไขครั้งที่ 1)

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๓/๒๕๖๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ลงชื่อ.....พยาน ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....พยาน นายจิรายุทธ ศรีเดิม นายช่างโยธาอาวุโส



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กรรมการ		(นายพรชัย แก้วบังวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)
กรรมการ		(นางสาวศรีต้น สุนะตัน) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
ประธานกรรมการ		(นางนิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แบบแสดง	แผนที่โดยสังเขป
มาตราส่วน	NO SCALE
วัน/เดือน/ปี	
แบบเลขที่	แผ่นที่ 05

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

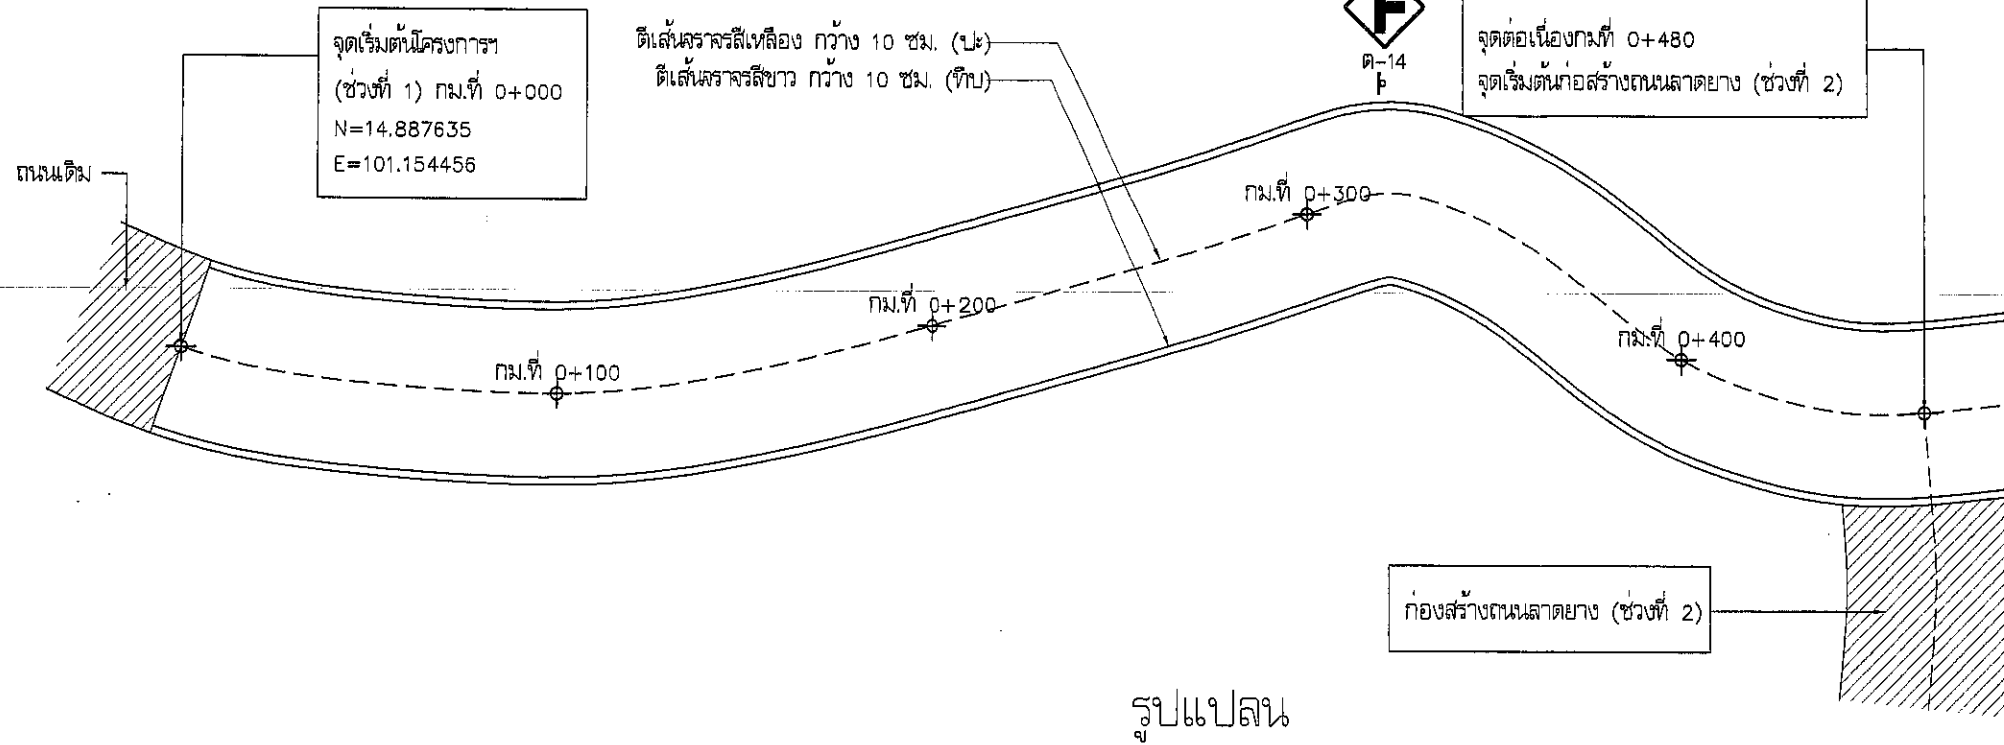

รูปแบบ

เอกสารแนบท้าย สัญญาจ้าง หน้า ๑๓



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลด
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ 139/2568

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (แก้ไขครั้งที่ ๑)

ผู้รับจ้าง
ก่อสร้างถนนลาดยาง
หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

นาย	นาย	นาย
นาย	นาย	นาย
นาย	นาย	นาย
นาย	นาย	นาย


คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ

กรรมการ (นายพรชัย แก้วบังวัน)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

กรรมการ (นางสาวรัตน์ สุระรัตน์)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการ (นายทศพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


แบบแสดง	รูปแบบ
มาตรฐาน	NO SCALE
วัน/เดือน/ปี	
แบบเลขที่	แผ่นที่ 07

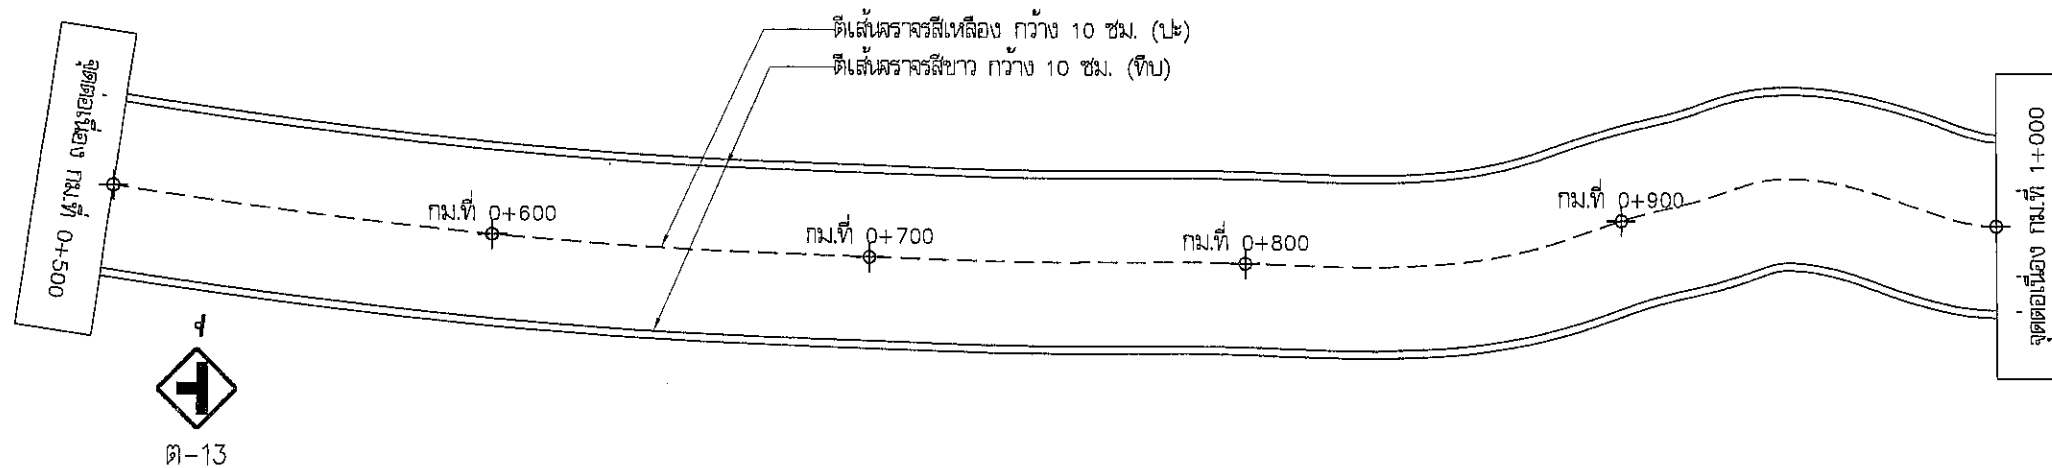


รูปแบบ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง


หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

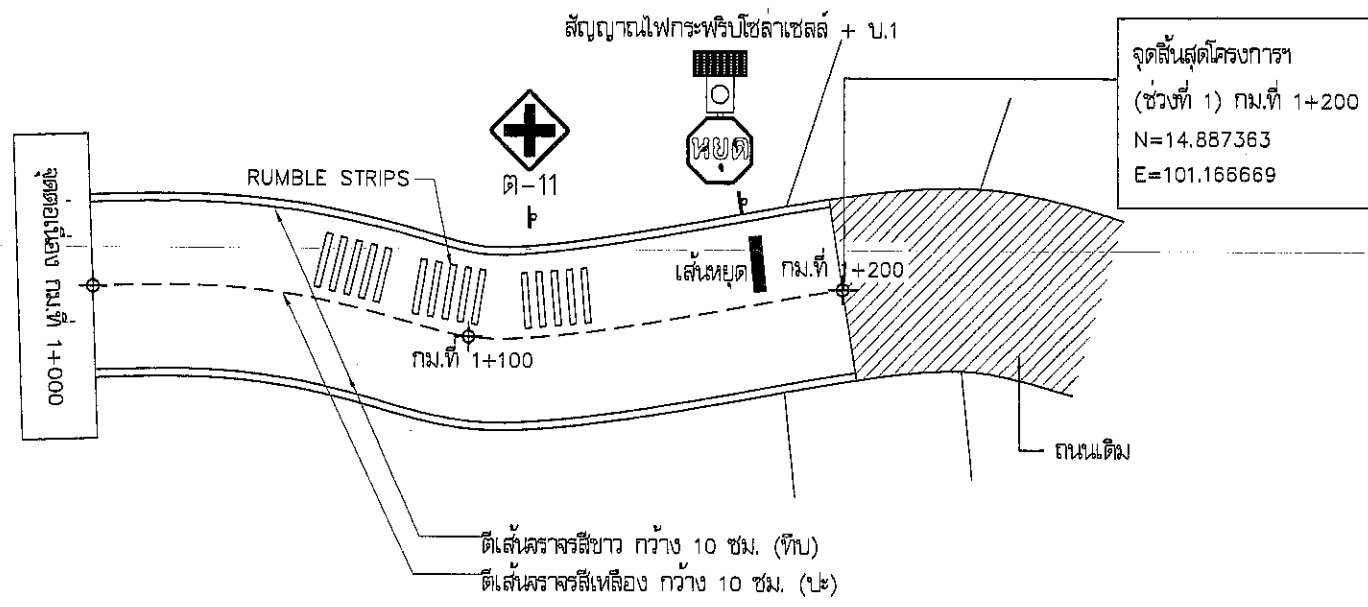

รูปแปลน

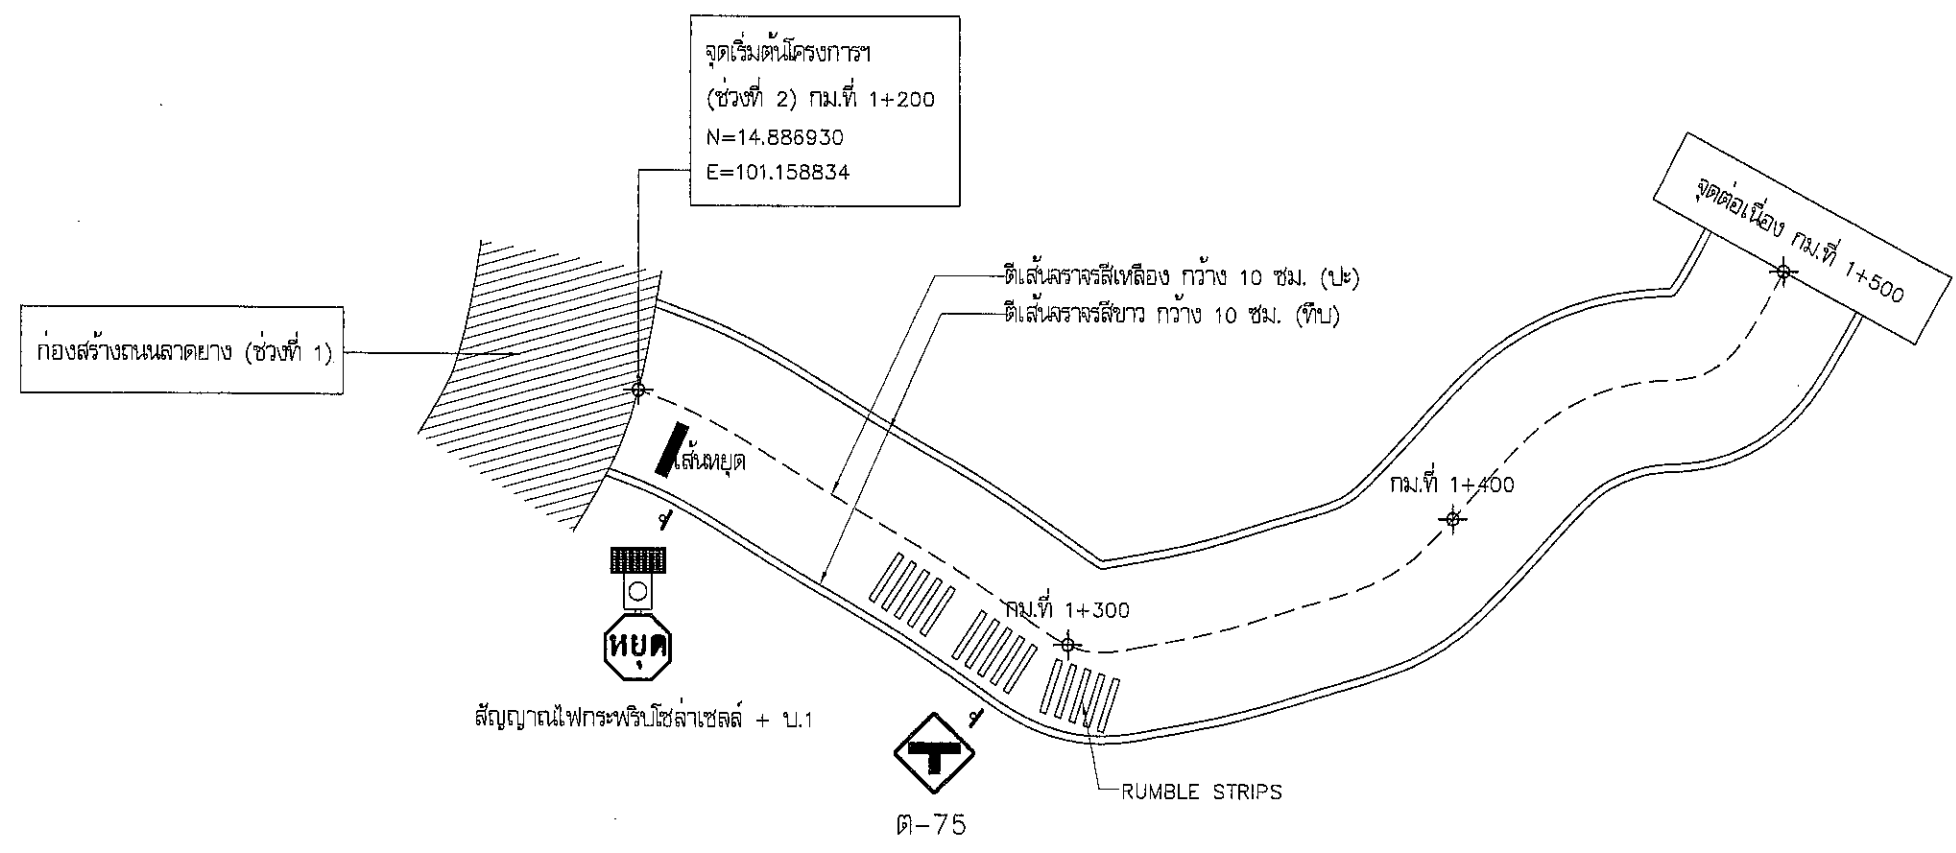

รูปแปลน



เอกสารแนบท้าย สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓๖/๒๕๖๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
 ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ หน้า สัญญาจ้างเลขที่ 139/2568
 ลงชื่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
 ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ พยาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 เลขที่ 1 กันยายน 2568 (แก้ไขครั้งที่ 1)
 ก่อสร้างถนนลาดยาง
 หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ผู้ควบคุมงาน	นายสุรยุทธ ศรีจิเม	นายชาญโยธาวุฒิ
คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ		
กรรมการ	พย	(นายพรชัย แก้วบงวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)
กรรมการ		(นางสาวรัตน สุระตัน) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
ประธานกรรมการ	กส	(นางทิติยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แบบแสดง	รูปแปลน	
มาตราส่วน	NO SCALE	
วัน/เดือน/ปี		
แบบเลขที่	แผ่นที่ 08	

