

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยนายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทรพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๕ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดย นางสาววิญญูดา คงเจริญวุฒิ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๓๘๒๕ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. บริษัท ทรพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ได้มีหนังสือ แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรวจและดำเนินการปรับเปลี่ยน ปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างถึง ช่วง กม.ที่ ๐+๕๕๐ ถึง กม.ที่ ๑+๔๐๐ ความยาว ๔๕๐.๐๐ ม. จากการสำรวจและดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามแผนงาน บริษัทฯ ได้รับการแจ้งจากบุคคลที่แสดงตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณดังกล่าว ว่าไม่อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างใด ๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูดา คงเจริญวุฒิ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งสิ้น จึงแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลโดยอนุญาตให้สัญญาได้ แต่ไม่อนุญาตให้ทำการก่อสร้างถนนที่มีลักษณะมั่นคงถาวร ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำปริมาณงานในบริเวณที่พบปัญหาและอุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาจ้าง เพื่อขอเสนอตัดลดค่างานโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) จำนวน ๓,๐๓๘.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗,๒๘๐.๖๕ บาท

๑.๒ งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (๐.๑๐ ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE) จำนวน ๒๕๗.๐๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๑๔๒,๒๕๐.๘๕ บาท

๑.๓ งานพื้นทางหินคลุก (๐.๑๕ ม.) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) จำนวน ๔๒๑.๐๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๒๒๕,๑๖๕.๕๓ บาท

๑.๔ งานพื้นทาง ทางเชื่อมหินคลุก (๐.๑๕ ม.) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYREBASE) จำนวน ๒.๕๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๑,๓๖๐.๘๖ บาท

๑.๕ งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIMECOAT) (พื้นทางหินคลุก) จำนวน ๒,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๓๓,๒๓๗.๗๘ บาท

๑.๖ งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) จำนวน ๒,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑,๐๘๓,๕๕๐.๘๓ บาท

๑.๗ งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIMECOAT) ทางเชื่อม, ไหล่ทาง จำนวน ๑๕.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗๔๐.๒๐ บาท

๑.๘ งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) จำนวน ๑๕.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๖,๐๒๒.๑๗ บาท

๑.๙ งานป้ายจราจร แบบ ต๑-ต๒๗ จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๘,๑๑๕.๖๒ บาท

๑.๑๐ งานสีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง + สีขาว) จำนวน ๑๐๒.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๐,๒๗๘.๕๓ บาท


๑.๑๑ งานเส้นหยุด จำนวน ๑.๘๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗๑๐.๘๐ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด ๑,๖๕๓,๑๕๗.๕๖ บาท และคงเหลือค่าก่อสร้าง ๔,๕๒๕,๘๐๒.๐๔ บาท

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ บริเวณช่วง กม.ที่ ๐+๕๕๐ ถึง กม.ที่ ๑+๔๐๐ รวมระยะทาง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูตา คงเจริญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ



๔๕๐.๐๐ เมตร เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง พบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของเอกชนตามที่มีการแจ้งไว้และยังคง ไม่ได้รับ อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างถนนที่มีลักษณะมั่นคงถาวร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้นัดประชุมร่วมกับผู้รับ จ้างและผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ประชุมสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓. คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีมติการตัดลดค่างาน ช่วง กม.ที่ ๐+๕๕๐ ถึง ๑+๔๐๐ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) มีการปรับลดปริมาณงานตามรายการ ดังนี้

๑) งานถางป่าและขุดคอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) จำนวน ๓,๐๓๘.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗,๒๘๐.๗๕ บาท

๒) งานชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (๐.๑๐ ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE) จำนวน ๒๕๓.๐๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๑๔๒,๒๕๐.๘๕ บาท

๓) งานชั้นพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) (๐.๑๕ ม.) จำนวน ๔๒๑.๐๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๒๒๕,๑๖๕.๕๓ บาท

๔) งานพื้นทาง ทางเชื่อมหินคลุก (๐.๑๕ ม.) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYREBASE) จำนวน ๒.๕๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๑,๓๖๐.๘๖ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด (งวดที่ ๑) เป็นเงิน ๓๘๐,๑๐๒.๐๓ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยสองบาทสามสตางค์)

- งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๔๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อย บาทถ้วน) มีการปรับลดปริมาณงานตามรายการ ดังนี้

๑) งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIMECOAT) (พื้นทางหินคลุก) จำนวน ๒,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๓๓,๒๓๗.๗๘ บาท

๒) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) จำนวน ๒,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑,๐๘๓,๕๕๐.๘๓ บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูตา คงเจริญกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

๓) งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIMECOAT) ทางเชื่อม, ไหล่ทาง จำนวน ๑๕.๐๐ ตร.ม.
เป็นเงิน ๗๔๐.๒๐ บาท

๔) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) จำนวน ๑๕.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๖,๐๒๒.๑๗ บาท

๕) งานป้ายจราจร แบบ ค๑-ค๒๗ จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๘,๑๑๕.๖๒ บาท

๖) งานสีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง + สีขาว) จำนวน ๑๐๒.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๐,๒๗๘.๕๓ บาท

๗) งานเส้นหยุด จำนวน ๑.๘๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗๑๐.๘๐ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด (งวดที่ ๒) เป็นเงิน ๑,๒๗๓,๐๕๕.๕๓ (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)

๘) แก้ไขค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างเดิม เป็นเงิน ๖,๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ค่างานส่วนที่ตัดลด เป็นเงิน ๑,๖๕๓,๑๕๗.๕๖ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) คงเหลือค่าจ้างตามสัญญาจ้างที่แก้ไขเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๒๑,๘๔๒.๔๔ บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่บาทสี่สตางค์) โดยแบ่งเป็น ๒ งวดงาน ดังนี้

๘.๑ แก้ไขงวดที่ ๑ จำนวนเงินเดิม ๑,๒๓๕,๘๐๐.๐๐๐ บาท มีการปรับลดเป็นเงิน ๓๘๐,๑๐๒.๐๓ บาท คงเหลือ ๘๕๕,๖๙๗.๙๗ บาท

๘.๒ แก้ไขงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินเดิม ๔,๙๔๓,๒๐๐.๐๐ บาท มีการปรับลดเป็นเงิน ๑,๒๗๓,๐๕๕.๕๓ บาท คงเหลือ ๓,๖๗๐,๑๐๔.๐๗ บาท ในการนี้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยไม่ต้องหยุดงาน

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงาน, ตัดลดค่าก่อสร้าง และงวดเงิน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๖๘๑๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบอำนาจ
(นางสาววิญญูดา คงเจริญวุฒิ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๑๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๐๔,๒๓๓.๖๔ บาท (สี่แสนสี่พันสองร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานวางป่า ขูดตอขนาดเบา แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทาง ,ทางเชื่อม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๔๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ดังนี้

- งาน Prime Coat บนผิวทาง ,ทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานปู Asphalt Concrete บนผิวทาง ,ทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายบนผิวทางสี่เทอร์โม (สีเหลือง+สีขาว) แล้วเสร็จ
- งาน RUMBLE STRIPS แล้วเสร็จ
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน ๑๖ ชุด แล้วเสร็จ

- งานเก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูดา คงเจริญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๕๒๕,๘๐๒.๐๔ บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสองบาทสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕๖,๐๘๐.๕๑ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันแปดสิบบาทห้าสิบบัดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๕,๖๕๗.๕๗ บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบัดเจ็ดบาทเก้าสิบบัดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานวางป่า ขุดตอขนาดเบา แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทาง ,ทางเชื่อม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๗๐,๑๐๔.๐๗ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสี่บาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ดังนี้

- งาน Prime Coat บนผิวทาง ,ทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานปู Asphalt Concrete บนผิวทาง ,ทางเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายบนผิวทางสี่เทอร์โม (สีเหลือง+สีขาว) แล้วเสร็จ
- งาน RUMBLE STRIPS แล้วเสร็จ
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน ๑๖ ชุด แล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูดา คงเจริญคุณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้ง
ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน แลคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูตา คงเจริญสุข)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพลภัทร เพ็ญวิทยารัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทรีพีลวอร์เรน มหาศาล จำกัด โดย นางสาววิญญูดา คงเจริญวุฒิ (ผู้รับมอบอำนาจ) ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขสัญญาเป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๕๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๐๕/๐๕/๒๕๖๘ จนถึง ๐๓/๑๒/๒๕๖๘ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๓/๑๐/๒๕๖๘	๘๕๕,๖๕๗.๕๗			๘๕๕,๖๕๗.๕๗
๒	๒	๐๓/๑๒/๒๕๖๘	๓,๖๗๐,๑๐๔.๐๗			๓,๖๗๐,๑๐๔.๐๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูดา คงเจริญวุฒิ)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพลภัทร เพ็ญวิทยารัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิญญูตา คงเจริญวุฒิ)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางละออใจ บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(นายพลภัทร เพ็ญวิทยารัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๖๘๑๓

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับลดปริมาณงาน, ตัดลดค่าก่อสร้าง และงวดเงิน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๑๐๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕-หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕-หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เป็นเงิน ๖,๑๗๙,๐๐๐.- บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑.๓ หนังสือ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

๑.๔ หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ สป ๗๒๗๐๓/๗๘๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาแนวเขตโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ได้สำรวจและดำเนินการปรับเปลี่ยน ปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างถึง ช่วง กม.ที่ ๐+๙๕๐ ถึง กม.ที่ ๑+๔๐๐ ความยาว ๔๕๐.๐๐ ม. จากการสำรวจและดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามแผนงาน บริษัทฯได้รับการแจ้งจากบุคคลที่แสดงตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณดังกล่าว ว่าไม่อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างใด ๆ ทั้งสิ้น จึงแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลโดยอนุญาตให้สัญจรได้ แต่ไม่อนุญาตให้ทำการก่อสร้างถนนที่มีลักษณะมั่นคงถาวร (รายละเอียดตามเรื่องเดิม ข้อ ๑.๓)

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ บริเวณช่วง กม.ที่ ๐+๙๕๐ ถึง กม.ที่ ๑+๔๐๐ รวมระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง พบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของเอกชนตามที่มีการแจ้งไว้ และยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างถนนที่มีลักษณะมั่นคงถาวร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้นัดประชุมร่วมกับผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๒.๓ คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีมติการตัดลดค่างาน ช่วง กม.ที่ ๐+๙๕๐ ถึง ๑+๔๐๐ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๕,๘๐๐.๐๐ บาท มีการปรับลดปริมาณงาน ตามรายการดังนี้

๑) งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) จำนวน ๓,๐๓๘.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗,๒๘๐.๗๕ บาท

๒) งานชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (๐.๑๐ ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE) จำนวน ๒๙๗.๐๐ ลบ. เป็นเงิน ๑๔๒,๒๙๐.๘๙ บาท

๓) งานชั้นพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) (๐.๑๕ ม.) จำนวน ๔๒๑.๐๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๒๒๙,๑๖๙.๕๓ บาท

๔) งานพื้นทาง ทางเชื่อมหินคลุก (๐.๑๕ ม.) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) จำนวน ๒.๕๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๑,๓๖๐.๘๖ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด (งวดที่ ๑) เป็นเงิน ๓๘๐,๑๐๒.๐๓ บาท

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๔๓,๒๐๐.๐๐ บาท มีการปรับลดปริมาณงาน ตามรายการดังนี้

๑) งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIMECOAT) (พื้นทางหินคลุก) จำนวน ๒,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๓๓,๒๓๗.๗๘ บาท

๒) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) จำนวน ๒,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑,๐๘๓,๙๙๐.๘๓ บาท

๓) งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIMECOAT) ทางเชื่อม,ไหล่ทาง จำนวน ๑๕.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗๔๐.๒๐ บาท

๔) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) จำนวน ๑๕.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๖,๐๒๒.๑๗ บาท

๕) งานป้ายจราจร แบบ ต๑-ต๒๗ จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๘,๑๑๕.๖๒ บาท

๖) งานสีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง + สีขาว) จำนวน ๑๐๒.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๐,๒๗๘.๕๓ บาท

๗) งานเส้นหยุด จำนวน ๑.๘๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗๑๐.๘๐ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด (งวดที่ ๒) เป็นเงิน ๑,๒๓๗,๐๙๕.๙๓ บาท

๘) แก้ไขค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างเดิม เป็นเงิน ๖,๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท ค่างานส่วนที่ตัดลด เป็นเงิน ๑,๖๕๓,๑๙๗.๙๖ บาท ค่างานตามสัญญาจ้างที่แก้ไขเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๒๕,๘๐๒.๐๔ บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสองบาทสี่สตางค์) โดยแบ่งเป็น ๒ งวดงาน ดังนี้

๘.๑ แก้ไขงวดที่ ๑ จำนวนเงินเดิม ๑,๒๓๕,๘๐๐.๐๐ บาท มีการปรับลด เป็นเงิน ๓๘๐,๑๐๒.๐๓ บาท คงเหลือ ๘๕๕,๖๙๗.๙๗ บาท

๘.๒ แก้ไขงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินเดิม ๔,๙๔๓,๒๐๐.๐๐ บาท มีการปรับลด เป็นเงิน ๑,๒๓๗,๐๙๕.๙๓ บาท คงเหลือ ๓,๖๗๐,๑๐๔.๐๗ บาท

ในการนี้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยไม่ต้องหยุดงาน

๓. ข้อกำหนด/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขัดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุนายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

๔.๑ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรักษามลประโยชน์ทางราชการ เห็นควรอนุมัติตัดลดปริมาณงาน ตัดลดค่าก่อสร้าง และงวดเงินในสัญญาจ้างตามที่ผู้รับจ้างและองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงร้องขอ ตามรายละเอียดตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และราคา

๔.๒ แจกกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจกกองพัสดุและทรัพย์สินตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

- อนุมัติ

- ลงนามแล้ว



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน นายก อบจ.สระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณาและลงนาม



(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศกร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางทิติยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 สัญญาจ้างเลขที่ 144/2568 ลงวันที่ 8 กันยายน 2568 ผู้รับจ้าง บริษัท หริพยัสวรรณ มหาศาล จำกัด

ที่	งานที่ดำเนินการ	ตามสัญญาจ้าง			งานที่ตัดลด			ตามแบบที่ก่อสร้างจริง		
		ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานคันทางเดิม									
	1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	9,450.00	ตร.ม.	22,647.48	3,038.00	ตร.ม.	7,280.75	6,412.00	ตร.ม.	15,366.73
2	งานโครงสร้างทาง									
	1.2 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (0.10 ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	924.00	ลบ.ม	442,682.77	297.00	ลบ.ม	142,290.89	627.00	ลบ.ม	300,391.88
	1.3 งานพื้นทางหินคลุก (0.15 ม.) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE)	1,308.00	ลบ.ม	712,004.14	421.00	ลบ.ม	229,169.53	887.00	ลบ.ม	482,834.61
	1.3 งานพื้นทาง ทางเชื่อมหินคลุก (0.15 ม.) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE)	2.50	ลบ.ม	1,360.86	2.50	ลบ.ม	1,360.86	-	ลบ.ม	-
3	งานผิวทาง									
	2.1 งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIMECOAT) (พื้นทางหินคลุก)	8,400.00	ตร.ม.	414,517.54	2,700.00	ตร.ม.	133,237.78	5,700.00	ตร.ม.	281,279.76
	2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	8,400.00	ตร.ม.	3,372,415.90	2,700.00	ตร.ม.	1,083,990.83	5,700.00	ตร.ม.	2,288,425.08
	2.3 งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIMECOAT) ทางเชื่อม,ไหล่ทาง	15.00	ตร.ม.	740.20	15.00	ตร.ม.	740.20		ตร.ม.	-
	2.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	15.00	ตร.ม.	6,022.17	15.00	ตร.ม.	6,022.17		ตร.ม.	-
3	งานป้ายจราจร									
	3.1 ป้ายจราจร แบบ บ33	2.00	ชุด	7,652.64	-	ชุด		2.00	ชุด	7,652.64
	3.2 ป้ายจราจร แบบ ต1-ต27	8.00	ชุด	32,462.47	2.00	ชุด	8,115.62	6.00	ชุด	24,346.85
4	งานเครื่องหมายบนผิวทาง									
	4.1 เส้นแบ่งช่องจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง + สีขาว)	315.00	ตร.ม.	124,389.58	102.00	ตร.ม.	40,278.53	213.00	ตร.ม.	84,111.05
	4.2 Rumble Strip	15.60	ตร.ม.	9,771.42	-	ตร.ม.		15.60	ตร.ม.	9,771.42
	4.1 เส้นหยุด	1.80	ตร.ม.	710.80	1.80	ตร.ม.	710.80	-	ตร.ม.	-
5	งานป้ายโครงการ									
	5.1 ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	9,512.70	-	ชุด		1.00	ชุด	9,512.70
6	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ									
	6.1 ไฟทางแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ รหัส 07020037	16.00	ชุด	1,022,109.33	-	ชุด		16.00	ชุด	1,022,109.33
	รวมเป็นเงิน			6,179,000.00			1,653,197.96			4,525,802.04

ค่างานตามสัญญาจ้างเดิม
 ค่างานส่วนที่ตัดลด
 ค่างานตามสัญญาที่แก้ไข

6,179,000.00
 1,653,197.96
 4,525,802.04

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิรยุทธ์ ศรีเงิน)

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายพงศ์กร เพชรประดับ)


กรรมการ

(นางสรวิรัตน์ สุขมะดัน)

กรรมการ

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ประธานกรรมการ

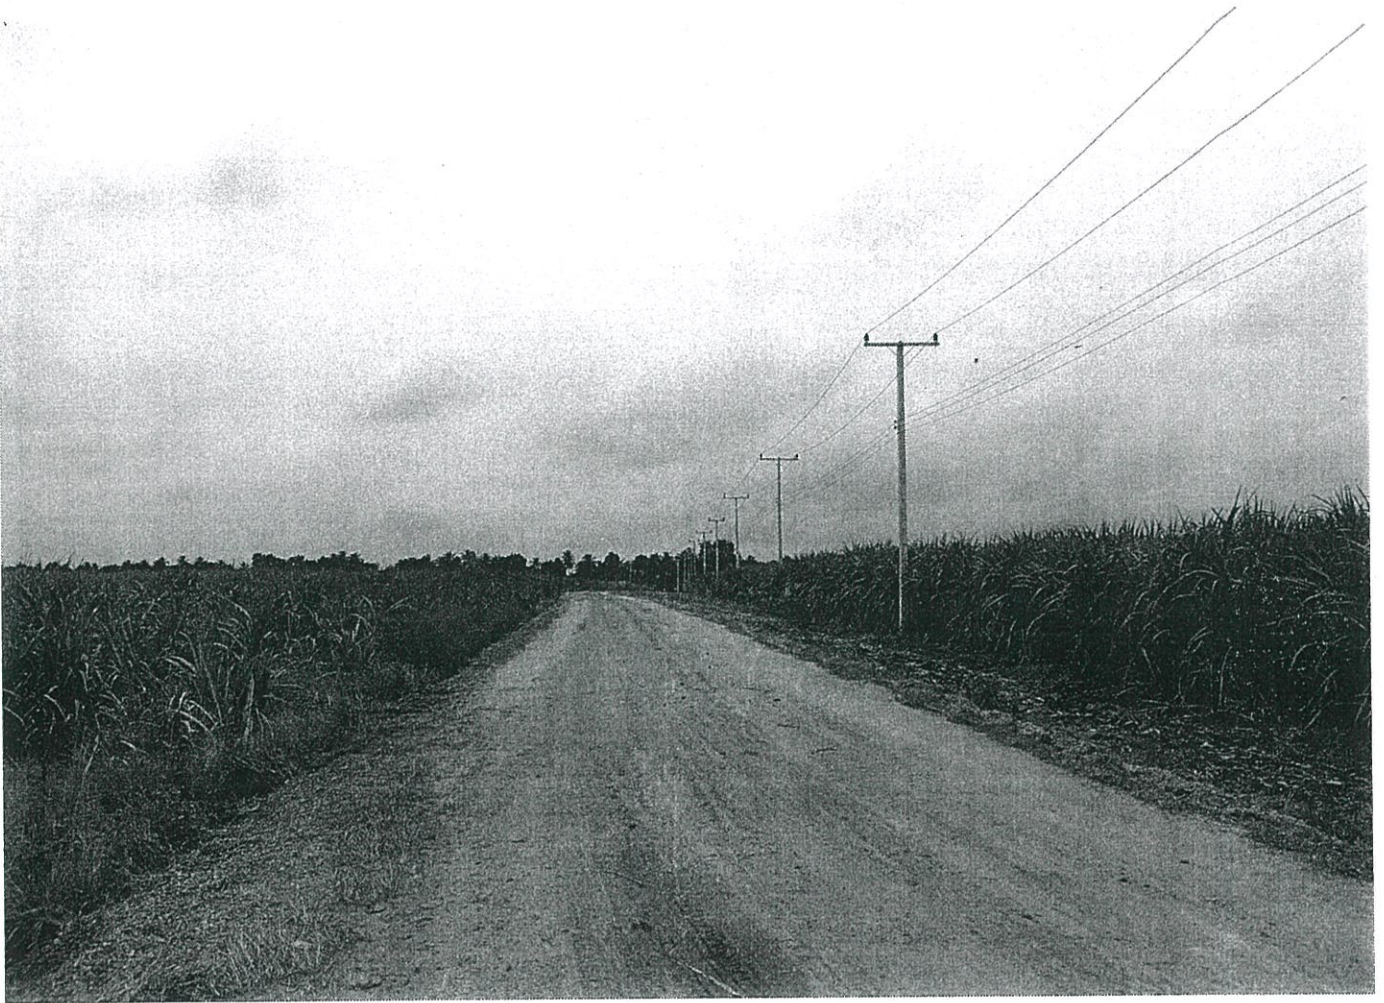

รายการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลด

สัญญาจ้างเลขที่ 139/2568

ลงวันที่ 1 กันยายน 2568 (แก้ไขครั้งที่ 2)

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....หน้า.....๘.....

งบประมาณปี พ.ศ. 2568

แบบเลขที่ 24/67



โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี


พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

ฝ่ายสำรวจและฝ่ายออกแบบ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๘
นาย พุทธิ ศิริเจิม
นายก อบจ.สระบุรี



แผนที่โดยสังเขป

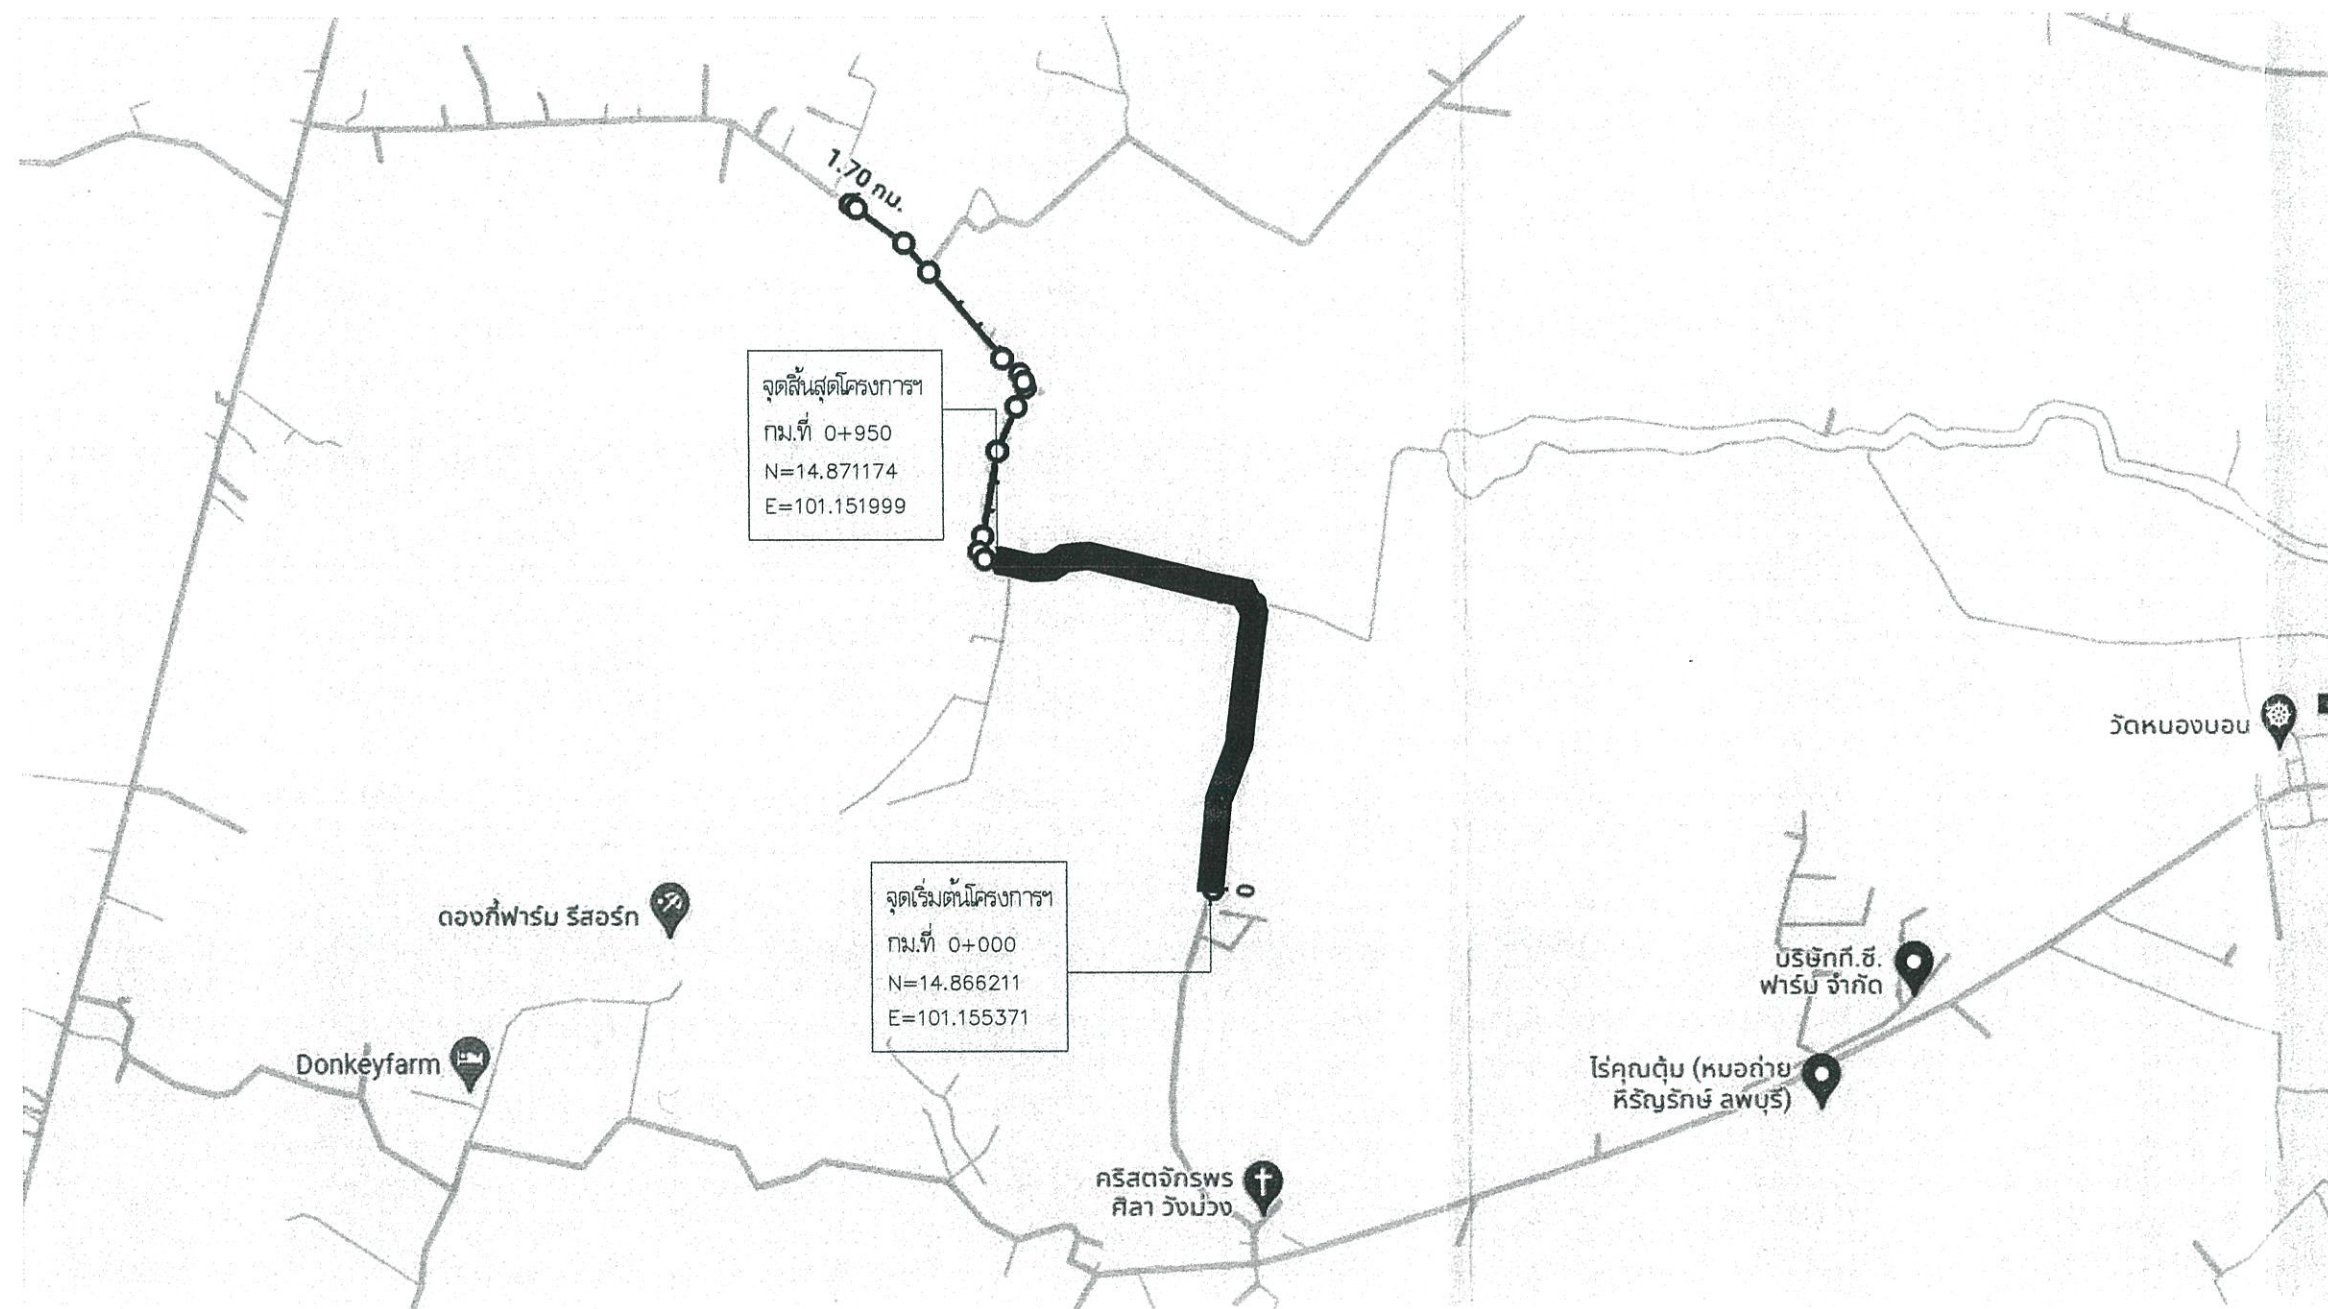

โครงการ
สถานที่
วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนลาดยาง
หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)

ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 950.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,700.00 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 16 ชุด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 24/67

นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม
นายช่างโยธาอาวุโส



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลด
สัญญาเลขที่ 139/2568
ลงวันที่ 1 กันยายน 2568 (แก้ไขครั้งที่ 2)

โครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยาง
หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ผู้ควบคุมงาน

นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม
นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กรรมการ

(นายพงศ์กร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นางสรวิศน์ สุระรัตน์)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการฯ

(นางสาววิภา ประชีพฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แบบแสดง

รูปแปลน

มาตราส่วน

NO SCALE

วัน/เดือน/ปี

.....

แบบเลขที่

แผ่นที่

05


โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์



จุดเริ่มต้นโครงการ
กม.ที่ 0+000
N=14.866211
E=101.155371

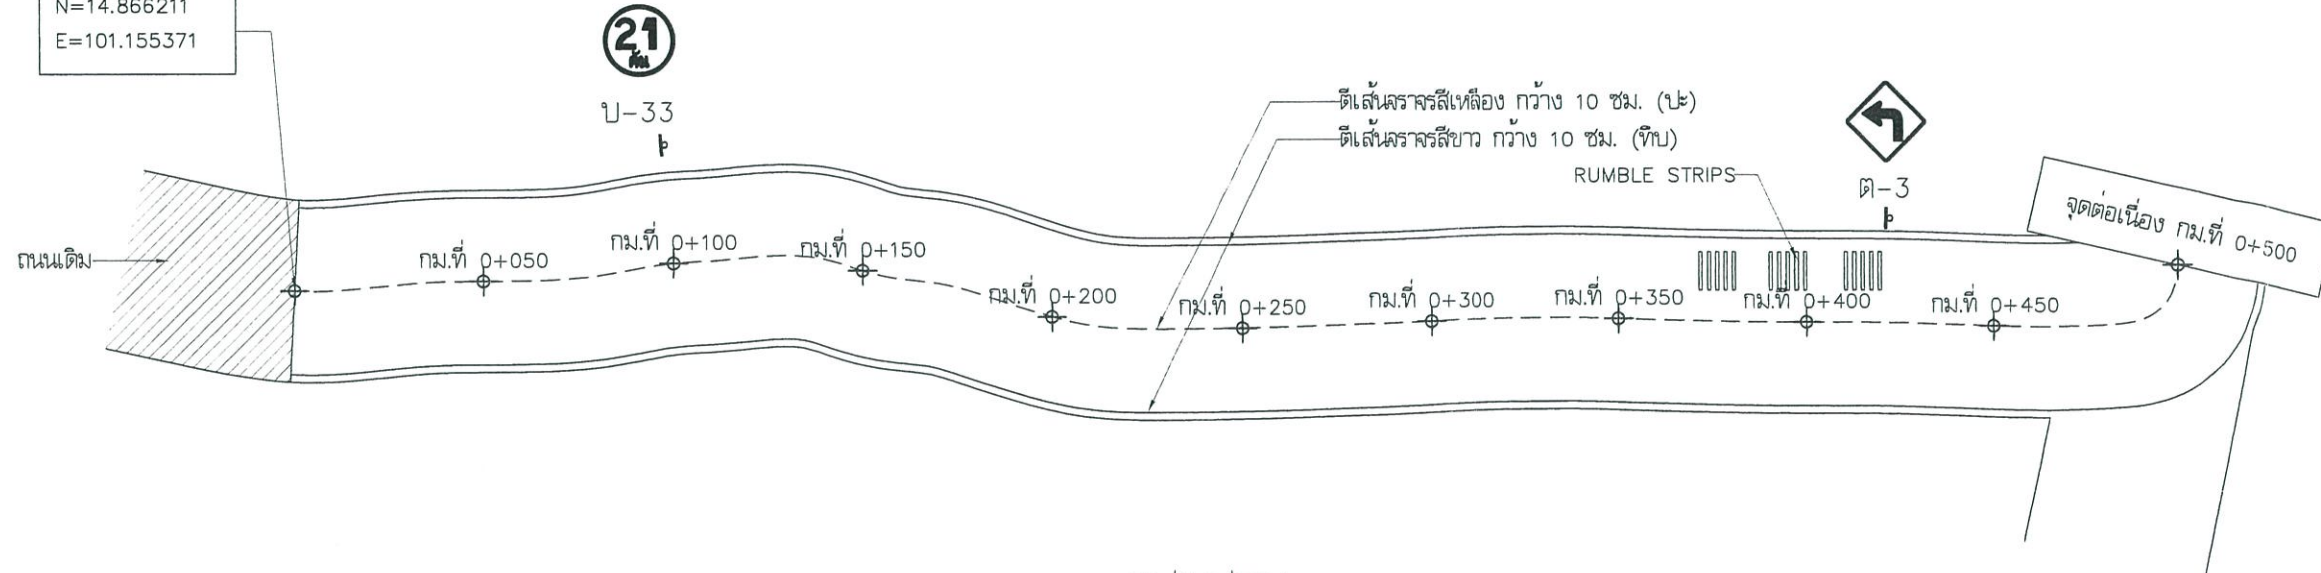

รูปแบบ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลด
สัญญาเลขที่ 139/2568
ลงวันที่ 1 กันยายน 2568 (แก้ไขครั้งที่ 2)


โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ผู้ควบคุมงาน		นายวิรุทธิ์ ศรีเริ่ม นายช่างโยธาอาวุโส
--------------	--	---

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

กรรมการ		(นายพงศ์กร เพชรประดับ) วิศวกรโยธานานุกา
กรรมการ		(นางสาวรัตน สุธะตัน) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
ประธานกรรมการ		(นางสาวนิภา ประชีพนาย) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายวิรุทธิ์ ศรีเริ่ม
นายช่างโยธาอาวุโส

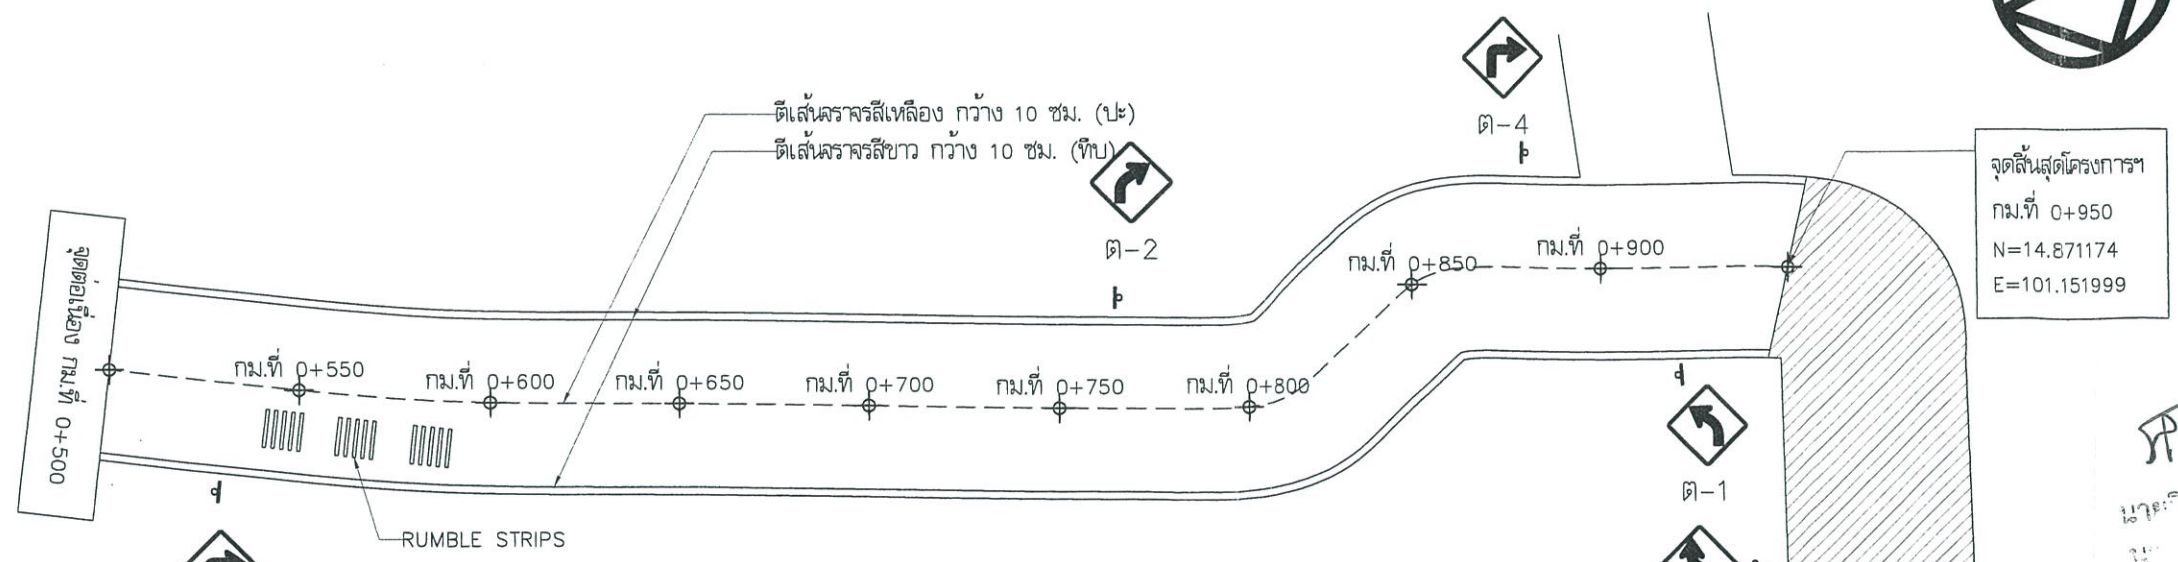

จุดสิ้นสุดโครงการ
กม.ที่ 0+950
N=14.871174
E=101.151999



รูปแบบ

แบบแสดง	รูปแบบ
มาตราส่วน	NO SCALE
วัน/เดือน/ปี	
แบบเลขที่	แผ่นที่ 07



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๔๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๖๓๓๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรค งานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๑๐๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕-หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดสระบุรี เป็นเงิน ๖,๑๗๙,๐๐๐.- บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑.๓ หนังสือ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

๑.๔ หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ สป ๗๒๗๐๓/๗๘๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาแนวเขตโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖

๒. ข้อเท็จจริง

บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ได้สำรวจและดำเนินการปรับเกลี่ย ปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างถึง ช่วง กม.ที่ ๐+๙๕๐ ถึง กม.ที่ ๑+๔๐๐ ความยาว ๔๕๐.๐๐ ม. จากการสำรวจและดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ตามแผนงาน บริษัทได้รับการแจ้งจากบุคคลที่แสดงตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณดังกล่าวว่าไม่อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างใด ๆ ทั้งสิ้น จึงแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลโดยอนุญาตให้สัญจรได้ แต่ไม่อนุญาตให้ทำการก่อสร้างถนนที่มีลักษณะมั่นคงถาวร (รายละเอียดตามเรื่องเดิม ข้อ ๑.๓)

๓. ขอกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน

ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

นาย..... ศิริจันทร์
นาย..... โสภณกุล

-(๓) ให้คณะกรรมการ...

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีให้เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขัดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

นาย สุทธิ ศรีเจิม

นาย ชัยเชษฐา จิตชื่น ทิศสภา...

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุนายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ พบว่าพื้นที่ก่อสร้าง ช่วง กม.ที่ ๐+๙๕๐ ถึง กม.ที่ ๑+๔๐๐ ความยาว ๔๕๐.๐๐ ม. ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ เห็นควรแจ้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง พร้อมด้วยผู้ควบคุมงานร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายจिरยุทธ์ ศรีเจิม)

นายช่างโยธาอาวุโส



นายจिरยุทธ์ ศรีเจิม
นายช่างโยธาอาวุโส

ระเบียบวาระการประชุม

เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างถนนลาดยาง
หมู่ที่ ๕-หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักช่าง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด
เป็นผู้รับจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๖,๑๗๙,๐๐๐.- บาท (หกล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

๙
พร. พันธ์ ศิริเงิน
นายก อบจ.สระบุรี

รายงานการประชุม

เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างถนนลาดยาง
 หมู่ที่ ๕-หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักช่าง

รายชื่อผู้ประชุม ๕ ท่าน

๑.	นางสาวนิภา ประชีพนาย	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการ
๒.	นางสรารัตน์ สุขมะดัน	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	กรรมการ
๓.	นายพงศกร เพชรประดับ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๔.	นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม	นายช่างโยธาอาวุโส	ผู้ควบคุมงาน
๕.	นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์	บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด	ผู้รับจ้าง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างบริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด
 เป็นผู้รับจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง
 อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ด้วยวิธีประกวด
 ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้
 คณะกรรมการ และผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง
 ช่วง กม.ที่ ๐+๙๕๐ ถึง กม.ที่ ๑+๔๐๐ ความยาว ๔๕๐.๐๐ ม. พบมีผู้แจ้งว่า
 เป็นเจ้าของพื้นที่ดิน ช่วงบริเวณดังกล่าว และไม่อนุญาตให้ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
 จึงแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นพื้นที่
 ส่วนบุคคลโดยอนุญาตให้สัญจรได้ แต่ไม่อนุญาตให้ทำการก่อสร้างถนนที่มีลักษณะ
 มั่นคงถาวร

นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม
 นายช่างโยธาอาวุโส

-/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการ

ตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ พบว่าพื้นที่ก่อสร้าง ช่วง กม.ที่ ๐+๙๕๐ ถึง ๑+๔๐๐ ความยาว ๔๕๐.๐๐ ม. เป็นถนนลูกรังแต่ไม่ใช้ทางสาธารณะจึงไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างได้ และผู้รับจ้างได้จัดทำปริมาณงานงานในบริเวณที่พบปัญหาและอุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาจ้าง เพื่อขอเสนอตัดลดค่างานรายละเอียดตาม หนังสือ บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปริมาณงานที่ขอเสนอตัดลดค่างานให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง

ช่างผู้ควบคุมงาน

รายละเอียดปริมาณงานที่ขอตัดลดค่างาน ช่วง กม.ที่ ๐+๙๕๐ ถึง ๑+๔๐๐ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๕,๘๐๐.๐๐ บาท มีการปรับลดปริมาณงานตามรายการดังนี้

๑) งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

จำนวน ๓,๐๓๘.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗,๒๘๐.๗๕ บาท

๒) งานชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (๐.๑๐ ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

จำนวน ๒๙๗.๐๐ ลบ. เป็นเงิน ๑๔๒,๒๙๐.๘๙ บาท

๓) งาน ชั้น พื้น ทาง หิน คลุ ก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE)

(๐.๑๕ ม.) จำนวน ๔๒๑.๐๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๒๒๙,๑๖๙.๕๓ บาท

๔) งานพื้นทาง ทางเชื่อมหินคลุก (๐.๑๕ ม.) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) จำนวน ๒.๕๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๑,๓๖๐.๘๖ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด (งวดที่ ๑) เป็นเงิน ๓๘๐,๑๐๒.๐๓ บาท

- งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๔๓,๒๐๐.๐๐ บาท มีการปรับลดปริมาณงานตามรายการดังนี้

๑) งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIMECOAT) (พื้นทางหินคลุก)

จำนวน ๒,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๓๓,๒๓๗.๗๘ บาท

๒) งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) จำนวน ๒,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑,๐๘๓,๙๙๐.๘๓ บาท

๓) งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIMECOAT) ทางเชื่อม,ไหล่ทาง

จำนวน ๑๕.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗๔๐.๒๐ บาท

๔) งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) จำนวน ๑๕.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๖,๐๒๒.๑๗ บาท

๕) งานป้ายจราจร แบบ ต๑-ต๒๗ จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๘,๑๑๕.๖๒ บาท

๖) งานสีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง + สีขาว)

จำนวน ๑๐๒.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๐,๒๗๘.๕๓ บาท

๗) งานเส้นหยุด จำนวน ๑.๘๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗๑๐.๘๐ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด (งวดที่ ๒) เป็นเงิน ๑,๒๗๓,๐๙๕.๙๓ บาท

ผู้รับจ้าง
นาย...
นาย...
นาย...

ค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างเดิม เป็นเงิน ๖,๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท ค่างาน
ส่วนที่ตัดลด เป็นเงิน ๑,๖๕๓,๑๙๗.๙๖ บาท ค่างานตามสัญญาจ้างที่แก้ไข
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๒๕,๘๐๒.๐๔ บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อย
สองบาทสี่สตางค์) โดยแบ่งเป็น ๒ งวดงาน ดังนี้

๕.๑ แก้ไขงวดที่ ๑ จำนวนเงินเดิม ๑,๒๓๕,๘๐๐.๐๐ บาท มีการปรับลดเป็นเงิน
๓๘๐,๑๐๒.๐๓ บาท คงเหลือ ๘๕๕,๖๙๗.๙๗ บาท

๕.๒ แก้ไขงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินเดิม ๔,๙๔๓,๒๐๐.๐๐ บาท มีการปรับลด
เป็นเงิน ๑,๒๗๓,๐๙๕.๙๓ บาท คงเหลือ ๓,๖๗๐,๑๐๔.๐๗ บาท

ในการนี้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยไม่ต้องหยุดงาน

คณะกรรมการ การแก้ไขปรับปรุงปริมาณงาน จะไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เกิดความเสียหาย

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นควรปรับลดค่างาน งวดงาน-งวดเงิน โดยปรับลด
ปริมาณงาน และแก้ไขแบบแปลนแก้ไขงวดงาน-งวดเงิน ให้ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างจริง
และให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยไม่ต้องหยุดงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานกรรมการ ขอให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการแก้ไขแบบบูรณาการงานก่อสร้างตามมติ
ที่ประชุม และจัดทำเอกสารเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา
พร้อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขงวดงาน

ประธานกรรมการ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการในครั้งนี้
และขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.



(นายจिरยุทธ์ ศรีเจิม)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวนิภา ประชีพนาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



นายจिरยุทธ์ ศรีเจิม
นายช่างโยธาอาวุโส

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักช่าง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางสาวนิภา ประชีพนาย	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการ		
๒.	นางสรารัตน์ สุขมะดัน	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	กรรมการ		
๓.	นายพงศกร เพชรประดับ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ		
๔.	นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม	นายช่างโยธาอาวุโส	ผู้ควบคุมงาน		
๕.	นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์	บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด	ผู้รับจ้าง		



นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม
โยธาวาสุ

บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด

55 หมู่ 5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

เลขที่รับ 5361	วันที่ 20/10/68
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	ส่วนค่าได้
ส่วนค่าจ้าง	ส่วนค่าวัสดุ
ส่วนค่าขนส่ง	ส่วนค่าอื่น ๆ

วันที่ 30 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 144/2568 ลงวันที่ 8 กันยายน 2568

ตามสัญญาที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 6,179,000.00 บาท นั้น

บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ได้สำรวจและดำเนินการปรับเกลี่ย ปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างถึง ช่วง กม.ที่ 0+950 ถึง กม.ที่ 1+400 ความยาว 450.00 ม. พบมีผู้แจ้งว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ดินช่วงบริเวณดังกล่าว และไม่อนุญาตให้ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น จึงแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลโดยอนุญาตให้สัญจรได้ แต่ไม่อนุญาตให้ทำการก่อสร้างถนนที่มีลักษณะมั่นคงถาวร

ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำปริมาณงานในบริเวณที่พบปัญหาและอุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาจ้าง เพื่อขอเสนอตัดลดค่างานโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) จำนวน 3,038.00 ตร.ม. เป็นเงิน 7,280.75 บาท
2. งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (0.10 ม.) (SOIL AGGREGATE SUBBASE) จำนวน 297.00 ลบ.ม. เป็นเงิน 142,290.89 บาท
3. งานพื้นทางหินคลุก (0.15 ม.) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) จำนวน 421.00 ลบ.ม. เป็นเงิน 229,169.53 บาท
4. งานพื้นทาง ทางเชื่อมหินคลุก (0.15 ม.) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) จำนวน 2.50 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,350.86 บาท
5. งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIMECOAT) (พื้นทางหินคลุก) จำนวน 2,700.00 ตร.ม. เป็นเงิน 133,237.78 บาท
6. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) จำนวน 2,700.00 ตร.ม. เป็นเงิน 1,083,990.83 บาท

เรียน องค์การบริหารส่วน

ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง ๖๕-๖๑๖๖๖๖๖๖

ตามสัญญา 144/2568 ลง 8 ก.ย. 68

นาง ปัทมาพร อุดมทรัพย์ในการก่อสร้าง

นาย อรุณ พิก. ทราย สืบ

พื้นที่ แขวงหนองทองนภสิริ

นาย ทรัพย์ ศรีสวัสดิ์

นายช่างโยธาอาวุโส

7. งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIMECOAT) ทางเชื่อม,ไหล่ทาง จำนวน 15.00 ตร.ม.
เป็นเงิน 740.20 บาท

8. งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)
จำนวน 15.00 ตร.ม. เป็นเงิน 6,022.17 บาท

9. งานป้ายจราจร แบบ ต1-ต27 จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 8,115.68.20 บาท

10. งานสีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง + สีขาว) จำนวน 102.00 ตร.ม. เป็นเงิน 40,278.53 บาท

11. งานเส้นหยุด จำนวน 1.80 ตร.ม. เป็นเงิน 710.80.53 บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด 1,653,197.95 บาท และคงเหลือค่าก่อสร้าง 4,505,802.05 บาท จึงขอให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือตัดลดค่างานตามที่เสนอ
บริษัทฯ ยินดีจะดำเนินการตามแนวทางการแก้ปัญหาทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการให้กับทางบริษัทฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง



(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)

ผู้จัดการ

๕

นายวิษณุ ศรีโสม
นาย โสธาทิ



ที่ สบ ๗๒๗๐๓/ ๗๘๘

สำนักช่าง อบจ. สระบุรี	เลขที่รับ 5362 วันที่ 30/๓.๑./68
☐ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายสำรวจ ๐ - ฝ่ายออกแบบ ๐ ☐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	☐ ส่วนการโยธา - ฝ่ายสาธารณูปโภค ๐ - ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ๐ - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
๒๓ หมู่ที่ ๕ ถนนวังม่วง - ชับสนุน
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๒๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งปัญหาแนวเขตโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

ตามที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ตกลงจ้าง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ขอเรียนว่า ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างในช่วง กิโลเมตรที่ ๐+๙๕๐ ถึง ๑+๒๐๐ ของแนวถนนที่ก่อสร้างนั้น แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของพื้นที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามแบบรูปรายการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและให้การก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาและแบบรูปรายการที่กำหนด จึงขอแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมในสายทางดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

โทร. ๐-๓๖๗๓-๐๖๙๑

โทรสาร. ๐-๓๖๗๓-๐๖๙๑

นายวิญญู ศิริเข็ม
นายก อบจ. สระบุรี
