

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองัดการบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทราypoוןก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ถนนอดิเรกสาร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดย นายอรรถพล เจริญตระการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้น ส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๐๐๔๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบคลองสัน โท ผังซ้ายและผังขวา หมู่ที่ ๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

บริษัท ทราypoוןก่อสร้าง จำกัด แจ้งขอสงวนสิทธิขยายอายุสัญญาเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง รายละเอียดตามหนังสือบริษัท ทราypoוןก่อสร้าง จำกัด ด่วนที่สุด ที่ SPC.๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีหนังสือ แจ้งให้บริษัทฯ จัดส่งรายละเอียดการชี้แจงข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ พิจารณา ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๑๔๐๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดการชี้แจงข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ตามหนังสือบริษัท ทราypoוןก่อสร้าง จำกัด ด่วนที่สุด ที่ SPC.๕๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอรรถพล เจริญตระการ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทราypoוןก่อสร้าง จำกัด
SAIPOON CONSTRUCTION CO.,LTD.



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ประชุมพิจารณาเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อสร้าง และมีมติเห็นควรขยายเวลาให้เฉพาะตามจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจริง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ วัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ การดำเนินการดังกล่าวจึงมีความรัดกุม ป้องกันข้อพิพาท และรักษาประโยชน์สูงสุดของทางราชการโดยตรง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อนุมัติให้ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ให้แก่ บริษัท ทราปูน ก่อสร้าง จำกัด ออกไปอีกจำนวน ๑๐ วัน รายละเอียดตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๓๒๓๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอรรถชาติ เข็มตระกูล)

กรรมการผู้ติดตาม



บริษัท ทราปูนก่อสร้าง จำกัด
SAIPOON CONSTRUCTION CO., LTD.

ทรัพย์สินเด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอรรถพล เข้มตระการ)
บริษัท ทรายปูนก่อสร้าง จำกัด ภิธรรมการผู้จัดการ
SAIPOON CONSTRUCTION CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละออ ดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบคลองสนโท ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ที่ ๕,๖,๗
และหมู่ที่ ๘ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๒๑ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายสุรศักดิ์ สมภักดี.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นายอรรถพล เจียมตระการ.....)
กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน
(....นางละอองดาว บำรุงญาติ...)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนาฏยา ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร ๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๒๕๓๕

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ว ๒๔๒)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท ทราเยปูนก่อสร้าง จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบคลองสันโทฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ที่ ๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

๒. ผู้รับจ้างได้มีหนังสือบริษัท ทราเยปูนก่อสร้าง จำกัด ด่วนที่สุด ที่ SPC.๗๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างจัดส่งรายละเอียดการชี้แจงข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๑๔๐๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

๔. ต่อมาผู้รับจ้างได้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามหนังสือบริษัท ทราเยปูนก่อสร้าง จำกัด ด่วนที่สุด ที่ SPC.๙๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ แจ้งว่าได้รับผลกระทบจากภาวะตั้งตัวและขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ประชุมพิจารณาเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อสร้าง ร่วมกับผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และได้ข้อยุติตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรขยายเวลาให้เฉพาะตามจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจริง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐ วัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ การดำเนินการดังกล่าวจึงมีความรัดกุม ป้องกันข้อพิพาท และรักษาประโยชน์สูงสุดของทางราชการโดยตรง

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ (๒) ระบุว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีเหตุสุดวิสัย

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ ระบุหลักเกณฑ์การขยายเวลาทำการตามสัญญาตามมาตรา ๑๐๒ กรณีมีเหตุเกิดจากเหตุสุดวิสัย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรือทำงานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงเห็นควรเสนอรายละเอียดเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

๑. โปรดพิจารณา อนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ให้แก่ บริษัท ทราเยปูนก่อสร้าง จำกัด ออกไปอีก ๑๐ วัน

๒. โปรดอนุมัติส่งเรื่องให้ กองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ

ประธานฯ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน นายก อบจ.สระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวนิภา ประชิพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี






ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง
 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบคลองสันโท ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ที่ ๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘
 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นางทิติยาพร เพชรประดับ	ประธานกรรมการฯ		
๒	นางสรารัตน์ สุขมะดัน	กรรมการฯ		
๓	นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์	กรรมการฯ		
๔	นายพงศกร เพชรประดับ	ผู้ควบคุมงาน		
๕	นายอรรถพล เขียมตระการ	ผู้รับจ้าง		

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบคลองสันโท ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ที่ ๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘
ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ผู้มาประชุม:

๑. นางทิติยาพร เพชรประดับ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการฯ
๒. นางสรารัตน์ สุขมะดัน	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	กรรมการฯ
๓. นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการฯ
๔. นายพงศกร เพชรประดับ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม:

๑. นายอรรถพล เจียมตระกูล	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทราโยนก่อสร้าง จำกัด	ผู้รับจ้าง
--------------------------	--	------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งว่า ผู้ควบคุมงานได้รายงานข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ทราโยนก่อสร้าง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญาเนื่องจากผลกระทบราคาน้ำมันเชื้อเพลิงผันผวนและขาดแคลนตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ ซึ่งในวันนี้ได้เชิญผู้แทนผู้รับจ้างมาร่วมประชุมชี้แจงและพิจารณาข้อยุติร่วมกัน

ระเบียบวาระที่ ๒: เรื่องพิจารณาการบอกเลิกสัญญาจ้าง

ที่ประชุมได้ร่วมกันตรวจพิจารณาเอกสารหลักฐานราคาน้ำมันและผลกระทบหน้างานเทียบกับคำร้องของผู้รับจ้าง มีข้อสรุปและข้อยุติตกลงร่วมกันดังนี้


๑. การพิจารณาจำนวนวันและการอ้างอิงสิทธิ์: จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเปรียบเทียบราคาและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์หน้างาน ที่ประชุมร่วมกับผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วพบว่า ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจริงตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เท่านั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาสัญญาให้เฉพาะตามจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจริง คือจำนวน ๑๐ วัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ สำหรับระยะเวลาส่วนที่เหลือ นอกเหนือจากนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์เนื่องจากสถานการณ์น้ำมันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ


๒. ข้อตกลงร่วมกันในที่ประชุม: คณะกรรมการฯ ได้เจรจากับ นายอรรถพล เจียมตระกูล ผู้แทนของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบข้อเท็จจริงและยินยอมรับการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างตามจำนวนที่ได้รับผลกระทบจริงคือ ๑๐ วัน ซึ่งผู้รับจ้างได้ลงนามยอมรับเงื่อนไขในรายงานการประชุมฉบับนี้


มติที่ประชุม:


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ ให้แก่ บริษัท ทราโยปูนก่อสร้าง จำกัด ออกไปอีก ๑๐ วัน และให้ทำบันทึกรายงานขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในวันนี้ทันที เพื่อส่งกองพัสดุและทรัพย์สินจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป


เลิกประชุมเวลา: ๑๑.๔๕ น.

ลงชื่อ  ผู้จดยางานการประชุม
(นายมานิตย์ ชุศรีจันทร์)
กรรมการฯ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
กรรมการฯ

ลงชื่อ  ประธานฯ
(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ  ยอมรับข้อตกลง
(นายอรรถพล เจียมตระการ)
ผู้รับจ้าง


บริษัท ทราโยปูนก่อสร้าง จำกัด
SAIPOON CONSTRUCTION CO.,LTD.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร ๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/-

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานข้อเท็จจริงกรณีผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญาเนื่องจากผลกระทบสถานการณ์
ตะวันออกกลาง

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรื่องเดิม

๑. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท ทราฟฟิคก่อสร้าง จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบคลองสันโท
ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ที่ ๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

๒. ผู้รับจ้างได้มีหนังสือบริษัท ทราฟฟิคก่อสร้าง จำกัด ด่วนที่สุด ที่ SPC.๗๒/๒๕๖๙ ลงวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างจัดส่งรายละเอียดการชี้แจง
ข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ตามหนังสือองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๑๔๐๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

๔. ต่อมาผู้รับจ้างได้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามหนังสือบริษัท ทราฟฟิคก่อสร้าง จำกัด
ด่วนที่สุด ที่ SPC.๙๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ แจ้งว่าได้รับผลกระทบจากภาวะดิ่งตัวและขาด
แคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในฐานะผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลกระทบจากภาวะดิ่งตัวและ
ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้รับจ้างนำส่งเพิ่มเติมอย่างละเอียดแล้ว ขอรายงานข้อเท็จจริงดังนี้

๑. จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสภาวะความผันผวนด้านการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง
ในพื้นที่ก่อสร้าง พบว่าโครงการได้รับผลกระทบจากภาวะดิ่งตัวและขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงจนส่งผลกระทบต่อ
เดินเครื่องจักรกลหนักในการทำงานจริง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙
รวมเป็นระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจริงจำนวน ๑๐ วัน

๒ สำหรับระยะเวลาหลังจากนั้น (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป) ระบบการจัดการ
และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในท้องตลาดเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งผู้รับจ้างสามารถบริหารจัดการ
จัดหาและวางแผนควบคุมต้นทุนเพื่อเข้าปฏิบัติงานตามปกติได้ เหตุขัดข้องข้างต้นจึงถือเป็นเหตุสุดวิสัยอันมิใช่
ความผิดของผู้รับจ้างเฉพาะในช่วงเวลา ๑๐ วันดังกล่าวเท่านั้น

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอขยายระยะเวลาสัญญาให้ตามจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจริงคือ ๑๐ วัน ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ จึงเห็นควรเสนอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมประชุมพิจารณา และเชิญผู้แทนบริษัท ทราयปูนก่อสร้าง จำกัด มาร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขร่วมกันในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ



ผู้ควบคุมงาน

(นายพงศกร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

- กณ
- วิศวกรรมการ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- กณ
ก

- ทาน

กกรมการ
(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคาน้ำมันประจำเดือนมีนาคม



หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บัณฑิตสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ โอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน ข่าวสาร ติดต่อเรา

● ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

● ราคายานยนต์ กทม. และปริมณฑล

● การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน: กรุงเทพมหานคร

มีนาคม

2569


ลิตร

ราคายานยนต์ กทม. และปริมณฑลประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ (ตาม)

วันที่	เบนซิน E20	ดีเซล E85	เบนซิน E20	ดีเซล 91	เบนซิน 95	ดีเซล 95	แก๊สโซฮอล์ 95
31-03-2569 05:00	0.00	40.74	33.79	41.68	42.05	50.64	53.04
26-03-2569 05:00	0.00	38.94	32.79	40.68	41.05	49.64	52.04
24-03-2569 05:00	0.00	32.94	26.79	34.68	35.05	43.64	44.04
21-03-2569 05:00	0.00	31.14	24.79	32.68	33.05	41.64	42.04
18-03-2569 05:00	0.00	30.44	23.79	31.68	32.05	40.64	41.04
10-03-2569 05:00	0.00	29.94	25.79	30.68	31.05	39.64	40.04



ราคาน้ำมันประจำเดือนเมษายน



หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา นักลงทุนสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ โอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน ข่าวสาร ติดต่อเรา TH | EN

● ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

● ราคายานยนต์ กทม. และ
ปริมณฑล

● การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหา: กรุงเทพฯ

เลือก: 2569

ค้นหา


ราคายานยนต์ กทม. และปริมณฑลประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วย: บาทต่อลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ก๊าด)

วัน - เวลา	Diesel B20	Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ดีเซลพรีเมียม Diesel	ดีเซลพรีเมียม Gasohol 95
24-04-2569 05:00	33.20	40.20	31.39	35.45	42.08	42.45	52.04	62.10	51.54
21-04-2569 05:00	34.70	41.70	31.39	35.45	42.08	42.45	52.04	63.60	51.54
17-04-2569 05:00	35.50	42.90	31.39	35.45	42.08	42.45	52.04	64.80	51.54
11-04-2569 05:00	37.40	44.40	31.69	35.95	42.58	42.95	52.54	66.30	52.04
09-04-2569 05:00	43.40	48.40	34.89	36.95	43.58	43.95	52.54	68.30	53.04
05-04-2569 05:00	45.54	50.54	34.89	36.95	43.58	43.95	52.54	70.44	53.04
04-04-2569 05:00	42.74	47.74	34.89	36.95	43.58	43.95	52.54	63.94	53.04
03-04-2569 05:00	42.74	47.74	35.69	36.95	43.58	43.95	52.54	63.94	53.04
02-04-2569 05:00	0.00	44.24	34.99	38.25	42.88	43.25	51.84	59.94	53.04

๒๖





ราคาน้ำมันประจำเดือนพฤษภาคม

หน้าหลัก [เกี่ยวกับเรา](#) [บริการลูกค้า](#) [ผลิตภัณฑ์และบริการ](#) [โอกาสทางธุรกิจ](#) [การพัฒนาที่ยั่งยืน](#) [ข่าวสาร](#) [ติดต่อเรา](#)

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกทุกภูมิภาค
- ราคาก๊าซหุงต้ม
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:


2569

กิโลเมตร

ราคาก๊าซหุงต้ม และ LPG
ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑลประจำปี พ.ศ. 2569
(เป็นระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีอากรท้องถิ่น (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พรีเมียม Diesel	ซูเปอร์พรีเมียม Gasohol 95
19-05-2569 05:00	35.20	42.20	33.84	37.80	44.53	44.90	54.49	61.25	52.39
14-05-2569 05:00	34.45	41.45	32.99	37.05	43.68	44.05	53.64	61.25	51.54
13-05-2569 05:00	33.75	40.75	32.29	36.35	42.98	43.35	52.94	61.25	51.54
08-05-2569 05:00	32.95	39.95	31.99	35.45	42.08	42.45	52.04	61.25	51.54
01-05-2569 05:00	33.80	40.80	32.24	36.30	42.93	43.30	52.69	62.10	52.39




บริษัท สานปูนก่อสร้าง จำกัด
SAPOON CONSTRUCTION CO.,LTD


กราฟแสดงการขึ้นราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีก ปัจจุบัน-ย้อนหลัง
กรุงเทพฯและปริมณฑล (บาท/ลิตร)

- CS6
- CS7
- CS8
- CS9
- CS10
- CS11
- CS12
- CS13
- CS14
- CS15
- CS16
- CS17
- CS18
- CS19
- CS20
- CS21
- CS22
- CS23
- CS24
- CS25
- CS26
- CS27
- CS28
- CS29
- CS30
- CS31
- CS32
- CS33
- CS34
- CS35
- CS36
- CS37
- CS38
- CS39
- CS40
- CS41
- CS42
- CS43
- CS44
- CS45
- CS46
- CS47
- CS48
- CS49
- CS50
- CS51
- CS52
- CS53
- CS54
- CS55
- CS56
- CS57
- CS58
- CS59
- CS60
- CS61
- CS62
- CS63
- CS64
- CS65
- CS66
- CS67
- CS68
- CS69
- CS70
- CS71
- CS72
- CS73
- CS74
- CS75
- CS76
- CS77
- CS78
- CS79
- CS80
- CS81
- CS82
- CS83
- CS84
- CS85
- CS86
- CS87
- CS88
- CS89
- CS90
- CS91
- CS92
- CS93
- CS94
- CS95
- CS96
- CS97
- CS98
- CS99
- CS100

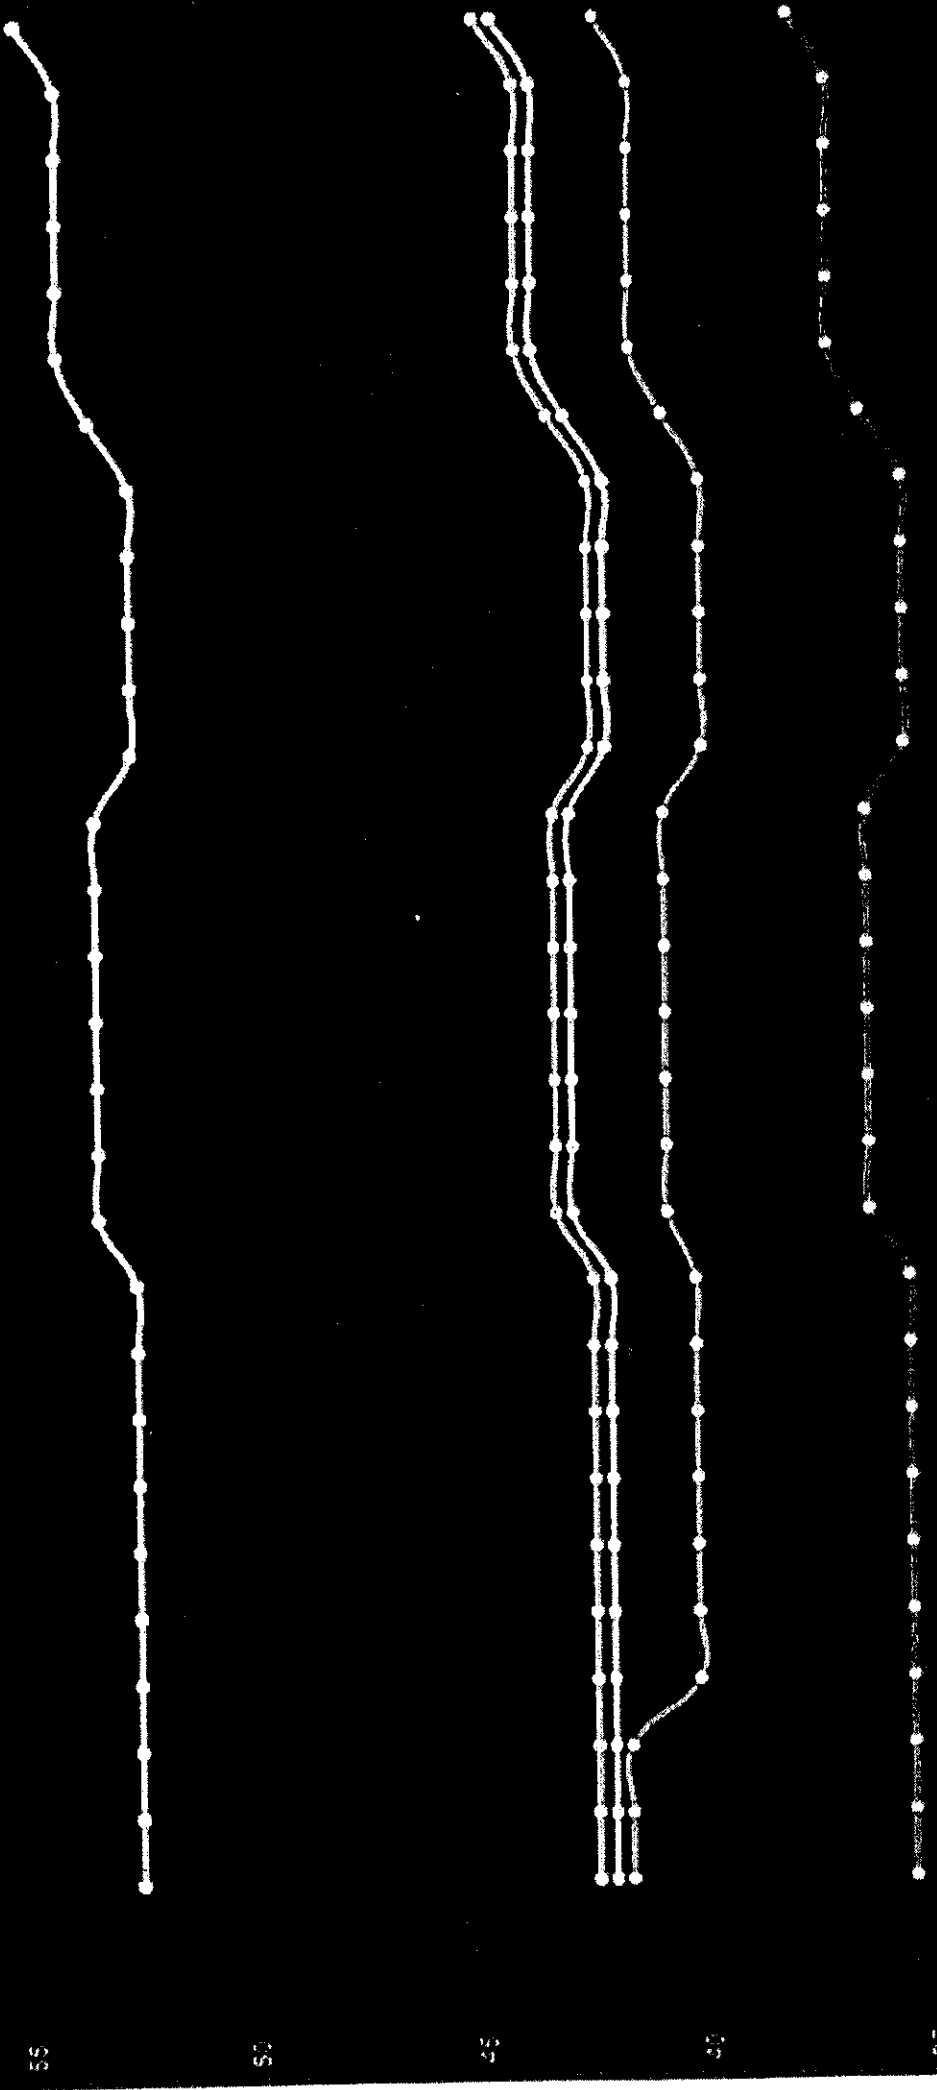


รูปภาพการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

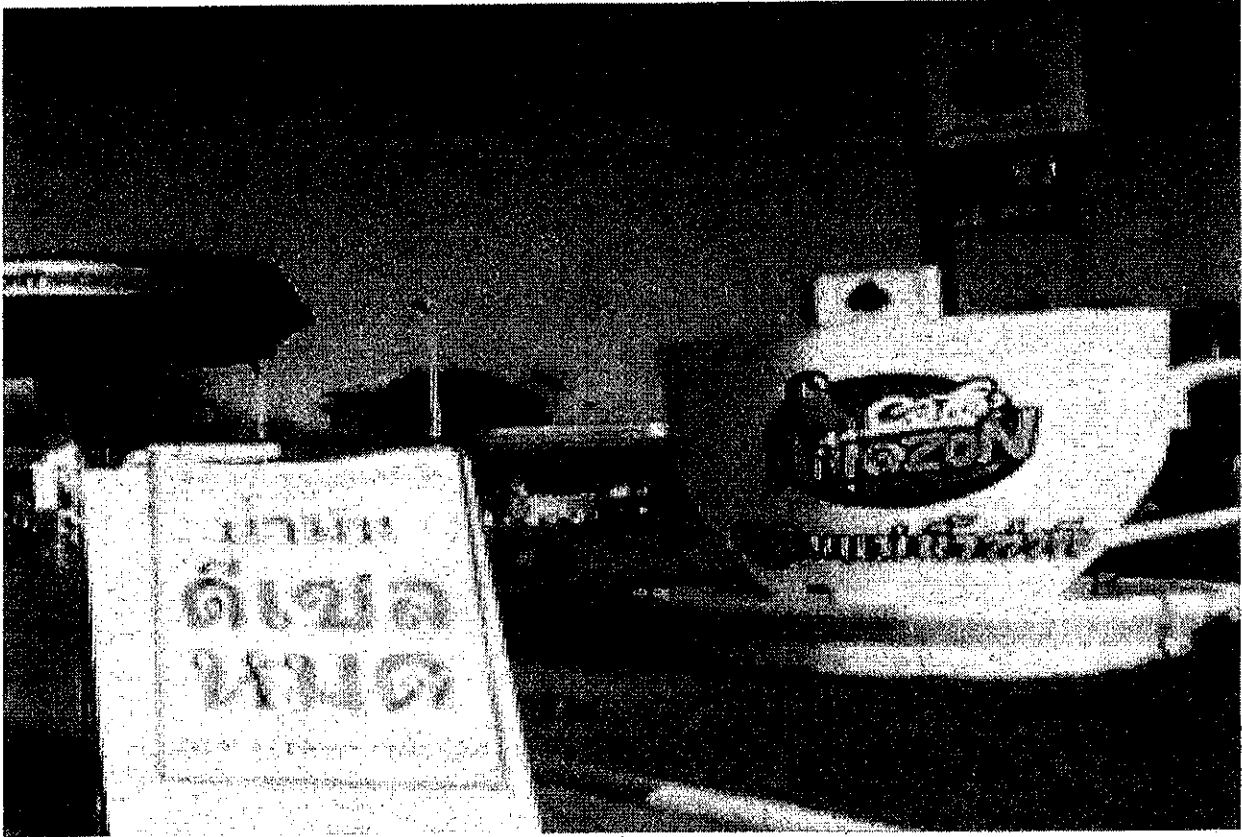





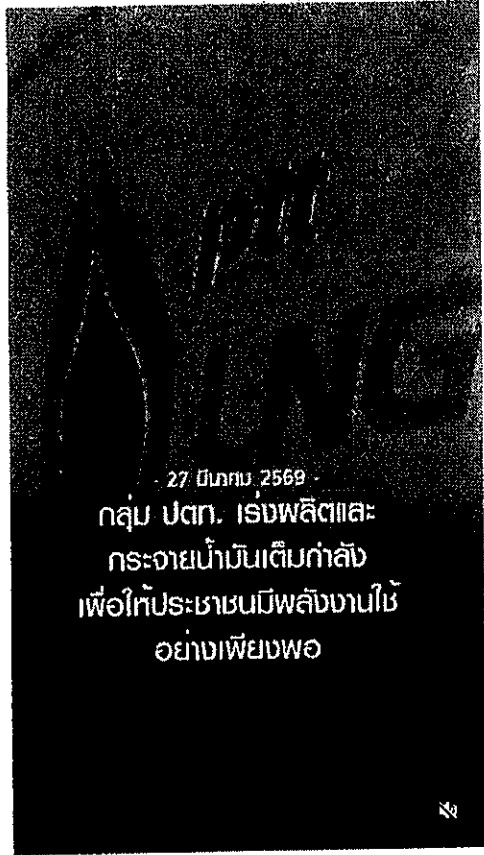

tnn_wealth • ติดตาม
เลียงดาเลียบ

tnn_wealth 7 สัปดาห์
"ปตท." เร่งผลิตน้ำมัน เดินเครื่อง 24
ชั่วโมง บรรณาน้ำมันขาดแคลนทั่ว
ประเทศ | TNN WEALTH | 26-03-69

#PTT #น้ำมัน #น้ำมันปตท #ดีเซล #รา
ตน้ำมัน #ทกชง16 #tnnwealth



ยังไม่มีความคิดเห็น
เริ่มต้นการสนทนา

♡ 7 💬 🚩 📌
27 มีนาคม

เข้าสู่ระบบเพื่อดูหัวใจหรือความคิดเห็น

โพสต์ของ Matichon Online - มติชนออนไลน์

Matichon Online - มติชนออนไลน์
18 มีนาคม

อุทัยธานีวิกฤต! บมขอยปิดเขม หลังน้ำมันขาดแคลนหนัก บมขเปิดต่อแถวยาวหลายกิโล

#มติชนออนไลน์
อ่านข่าวในคอมเมนต์



สำเนาฉบับ

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/ ๓๔๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ถนนพหลโยธิน สป ๑๘๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การขอสงวนสิทธิหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทราयปูนก่อสร้าง จำกัด

อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ ๗๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๒. หนังสือบริษัท ทราयปูนก่อสร้าง จำกัด ด่วนที่สุด ที่ SPC.๗๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. บริษัท ทราयปูนก่อสร้าง จำกัด ได้แจ้งขอสงวนสิทธิขยายอายุสัญญาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบคลองสันโท ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ที่ ๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุก่อสร้าง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ จึงขอให้บริษัทฯ จัดส่งรายละเอียดการชี้แจงข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ตามความในข้อ ๔ ของหนังสือเวียนฉบับดังกล่าว เช่น:

๑. หลักฐานเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัสดุหลักหรือน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนและหลังเกิดสถานการณ์
๒. หนังสือยืนยันจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายกรณีไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ (ถ้ามี)
๓. รายละเอียดงบประมาณและระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจริง

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียนข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจะไม่สามารถพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอของบริษัทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

.....รองนายกองค์การฯ
ปลัดองค์การฯ
รองปลัดองค์การฯ
ผอ.สำนักช่าง
ผอ.ส่วนฯ
หน.ฝ่ายฯ
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทวน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร. ๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๒/ ๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการขอสงวนสิทธิ์จัดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา (บริษัท ทราย์ปูนก่อสร้าง จำกัด)
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท ทราย์ปูนก่อสร้าง จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลียบคลองสันโท ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ที่ ๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอย จ.สระบุรี ตามสัญญาเลขที่ ๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ SPC.๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้งความประสงค์ ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา โดยอ้างเหตุผลการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง กำหนดใน ข้อ ๔ ว่า ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีพิจารณาจากหนังสือที่คู่สัญญาแจ้งเหตุให้หน่วยงานของรัฐทราบ พร้อมทั้งรายละเอียดการชี้แจงข้อเท็จจริง และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นได้ว่าต้นทุนของพัสดุมีราคาเพิ่มสูงขึ้นหรือขาดแคลนพัสดุนั้นมีผลกระทบต่อสัญญาอย่างมีนัยสำคัญ


๔. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือแจ้งเหตุของบริษัทฯ ยังขาดเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ชัดเจนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔ ของหนังสือเวียนฉบับดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเพื่อจัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (เช่น หลักฐานเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัสดุ หรือหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจะไม่สามารถดำเนินการพิจารณาตามคำร้องขอได้


/จึงเรียนมา...


-๒-


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงบริษัทฯ ที่แนบมาพร้อมนี้


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด





ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


(นางสาวนิภา ประชิตฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงนามแล้ว

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

.....  ผอ.ส่วน
.....  หน.ฝ่าย
.....  เจ้าหน้าที่
.....  ผู้พิมพ์



บริษัท ทรายปูนก่อสร้าง จำกัด
 SAIPOON CONSTRUCTION CO.,LTD.
 7 หมู่ 6 ถนนอดิเรกสาร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 โทร. 0-3634-0679 FAX. 0-3634-0679

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๕.๑๑	<input type="checkbox"/> สำนักงาน อบจ. <input type="checkbox"/> สนง.เลขานุการ อบจ. <input type="checkbox"/> กองยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> กองคลัง <input checked="" type="checkbox"/> สำนักช่าง	<input type="checkbox"/> กองสาธารณสุข <input type="checkbox"/> กองการศึกษา <input type="checkbox"/> กองช่างกั้น <input type="checkbox"/> กองพัสดุฯ <input type="checkbox"/> กองการเจ้าหน้าที่ <input type="checkbox"/> หน่วยตรวจสอบ
--------------------------------	--	--

ที่ SPC.72/2569
 "ด่วนที่สุด"

เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
 เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผ่าน ช่างควบคุมงาน
 อ้างถึง 1. สัญญาเลขที่ 79/2569 ลงวันที่ 12 มกราคม 2569
 2. หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 242 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง

16 มีนาคม 2569 สำนักช่าง อบจ.สระบุรี <input type="checkbox"/> ส่วนควบคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายสำรวจ - ฝ่ายออกแบบ <input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เลขที่รับ 7959 วันที่ 27/3/69 จ-69 <input type="checkbox"/> สำนักช่าง <input type="checkbox"/> ฝ่ายสำรวจ <input type="checkbox"/> ฝ่ายออกแบบ
--	--


ตามสัญญาที่อ้างถึง บริษัท ทรายปูนก่อสร้าง จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้างงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เลี้ยวคลองสันโท ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ที่ 5,6,7 และหมู่ที่ 8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี นั้น

บัดนี้บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาแต่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 จึงทำให้เกิดความผันผวนด้านน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ อันมีสาเหตุจากความไม่แน่นอนของอุปทานน้ำมันในตลาดโลกส่งผลให้เกิดภาวะตึงตัวด้านการจัดหาและราคา น้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนัก อาทิเช่น รถบด รถเกรด รถแบคโฮ รถบรรทุกขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรผสมแอสฟัลต์ โดยต้องพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยหลักในการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าวัสดุต่างๆ มีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนการทำงานและควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องดำเนินการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและส่งผลให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญาเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาของโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการให้แก่บริษัทฯ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

*เรียน ผอ.ชง.ท.กรมการช่าง
 ทนาย น. ทรายปูนก่อสร้าง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา
 สำหรับรถหนักของ ก่อสร้างถนนสันโท ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
 อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาค
 ตะวันออกกลาง ซึ่งทำให้ราคาของวัสดุและค่าจ้างเพิ่มขึ้น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา*

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรุณพล เจียมตระกูล) ทรายปูนก่อสร้าง จำกัด
 กรรมการผู้จัดการ

- ช่าง
 - นักดนตรีกรรมกร ๗ ไร่ ๕ ม ๑

(นายพงศกร เพชรประดับ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางทิติยาพร เพชรประดับ)

(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางสรารัตน์ สุขณะตัน)
 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
