

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท รายปูนก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนที่ ๗ หมู่ ๖ ถนนอดิเรกสาร ตำบล บ้านแก้ง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี โดย นายอรรถพล เจียมตระการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนที่ ๗ จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สบ.๐๐๓๒๙๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑๓ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ณ บริเวณถนน หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑๓ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๒๘ (ยี่สิบแปด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

บริษัท ไทรโยน์คอนสตรัคชั่น จำกัด  
SAIPOON CONSTRUCTION CO., LTD.

ผู้รับจ้าง

(นายอรรถพล เจียมตระการ)

กรรมการผู้จัดการ

## และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย จำนวน ๔ (肆) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า  
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารบริษัท ธนาคารกรุง  
ไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจสะบุรี เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๒๖๔/๐๐๓๔/๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เป็น<sup>๑</sup>  
จำนวนเงิน ๑๗๒,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตาม  
สัญญา นามอปให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว  
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้  
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ<sup>๒</sup>  
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีกหรือนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ  
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ  
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด  
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ  
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหักหลักประกัน<sup>๓</sup>  
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งมาอปให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้  
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ  
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสน  
ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๐,๔๔๒.๐๖ บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยสี่สิบสองบาทกําถางค์)  
ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ  
ดังนี้

(ลงชื่อ).....  
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะบุรี

(ลงชื่อ).....  
(นายอรรถพล เจียมตระการ)

กรรมการผู้จัดการ



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้  
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานชุดรือคันทางเดิมแล้วบดทับ แล้วเสร็จ
- งานซั่นรองพื้นทาง งานซั่นพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานซั่นพื้นทาง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๔๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาท  
ถ้วน)

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจร Asphalt Concrete แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานเครื่องหมายบนผิวทางสีเทอร์โม (สีเหลือง+สีขาว) แล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้คณะกรรมการตรวจรับ<sup>พัสดุ</sup> ได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำการทดสอบที่  
ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างคงจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาก่อจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนึ่งสือคำประกันหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย หรือพันธบัตรธุรกิจไทย เเต้มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างคงจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ ๔

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายใต้กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง

(นายอรรถพล เจียมตระการ)

กรรมการผู้จัดการ



#### ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

#### ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) และ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีค่าเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์

(ลงชื่อ).....  
(นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....  
(นายอรรถพล เจียมตระการ)

กรรมการผู้จัดการ



ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ครุ่งไปด้วย การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับตั้งจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยเหลือความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกเลิก



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
(นายอรรถพล เจียมธรรมการ)

กรรมการผู้จัดการ

### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้าใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนต้องกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่า้นน ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมีได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวาระหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)


ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นพร่ำเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับตัวลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายอรรถพล เจียมตระการ)

กรรมการผู้จัดการ



แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถูกต้องแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากการลักษณะทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อุปนัยของข้อข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....  
ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....  
ผู้รับจ้าง

(นายอรรถพล เจียมตระการ)  
กรรมการผู้จัดการ



อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้แล้วอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดที่จะนำมายังสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๓๓๔.๐๐ - บาท (หกพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอก จากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งควรหักงานก่อสร้าง และสัดส่วน ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนี้สือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้กู้ภัยต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถพล เจียมตระการ)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง

บริษัท สามกษาโปรดักส์ จำกัด  
SAKON CONSTRUCTION CO.,LTD.

เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักເຈົ້າຈຳນວນເງິນຄ່າຈ້າງທີ່ຕ້ອງໃຫຍ່ ອີ່ຈາກເງິນປະກັນພລງນ ຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ອີ່ບັນດາ  
ຈາກຫລັກປະກັນການປັບປຸງຕາມສັນຄູາໄດ້ທັນທີ

ຫາກຄ່າປັບປຸງ ດໍາເສີ່ຍຫາຍ ອີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບັນດາຈາກເງິນຄ່າຈ້າງທີ່ຕ້ອງໃຫຍ່ ເງິນປະກັນພລງນ ອີ່ຫລັກ  
ປະກັນການປັບປຸງຕາມສັນຄູາແລ້ວຢັ້ງນີ້ເພື່ອພວຍງົມຂໍາຮະສ່ວນທີ່ເລື່ອ ທີ່ຢັ້ງຂາດອູ່ຈົນຄຽບຄ້ວານຕາມຈຳນວນຄ່າປັບປຸງ ດໍາ  
ເສີ່ຍຫາຍ ອີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້ ກາຍໃນກຳນົດ ๑๕ (ສີບຫ້າ) ວັນ ນັບດັດຈາກວັນທີໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນໜັງສືອຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງ

ຫາກມີເງິນຄ່າຈ້າງຕາມສັນຄູາທີ່ທັກໄວ້ຈ່າຍເປັນຄ່າປັບປຸງ ດໍາເສີ່ຍຫາຍ ອີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລ້ວຢັ້ງເລື່ອອູ່ອຶກເຫຼົາໄດ້ ຜູ້  
ວ່າຈ້າງຈະຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງທັນທຶນດ

## ຂໍ້ ๒๐ ການທຳບັນດາກ່ອສ່ຽງໃຫ້ເຮືອບ້ອຍ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັກເຂົາບວິເວນສຕານທີ່ປັບປຸງຕາມສັນຄູານີ້ ຮົມທັງໂຮງງານຫີ່ ສິ່ງຄໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃນ  
ການທຳການຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ລູກຈ້າງ ຕັ້ງແນນ ອີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຫ່ວງ (ຄ້າມື) ໃຫ້ສະອາດ ປລອດກໍ່ ແລະມີປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້ຈານຕົວດ  
ຮະຍະເວລາການຈ້າງ ແລະເມື່ອທຳການເສີ່ງສິນແລ້ວຈະຕ້ອງຂໍ້ມູນຢ່າຍບຣດາເຄຣື່ອງໃຊ້ໃນການທຳການຈ້າງຮົມທັງວັດຖຸ ຂະໜຸລົມໂຍ ແລະສິ່  
ກ່ອສ່ຽງຫ້ວຽກຕ່າງໆ (ຄ້າມື) ທີ່ຈະຕ້ອງກົບເກີ່ມໍ່ພື້ນຕົນໃຫ້ເຮືອບ້ອຍເພື່ອໃຫ້ບັນດາທັງໝົດຍູ້ໃນສະພາພທີ່ສະອາດແລະໃຊ້ການໄດ້ທັນທີ

## ຂໍ້ ๒๑ ກາຮງດຫີ່ລົດຄ່າປັບປຸງ ອີ່ຂອງກາຍເຂົາປັບປຸງຕາມສັນຄູາ

ໃນການນີ້ທີ່ມີເຫດຸກີດຈາກຄວາມຝຶດຫີ່ຄວາມບກພ່ອງຂອງຜ່າຍຜູ້ວ່າຈ້າງ ອີ່ເຫດຸສຸດວິສັຍ ອີ່ເກີດຈາກ  
ພຸດືກາຮນ໌ອັນນີ້ອັນໄດ້ຜູ້ຮັບຈ້າງນີ້ຕ້ອງຮັບຝຶດຕາມກູ້ໝາຍ ອີ່ເຫດຸອື່ນຕາມທີ່ກຳນົດ ໃນກູ່ກະທຽວ ຈຶ່ງອົກຕາມຄວາມໃນ  
ກູ້ໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດໜີ້ຈັດຈ້າງແລະການບຣິຫານພັດງານຮູ້ຮັບຈ້າງ ທຳໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງນີ້ມີສາມາດທຳການໃຫ້ແລ້ວເສົ່ງຕາມເງື່ອນໄຂແລະກຳນົດ  
ເວລາແທ່ງສັນຄູານີ້ໄດ້ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງແຈ້ງເຫດຸຫຼືພຸດືກາຮນ໌ດັກລ່າວພຣົມຫລັກສູານເປັນໜັງສືອໃຫ້ຜູ້ວ່າຈ້າງທຣາບ ເພື່ອຂອງດຫີ່  
ລົດຄ່າປັບປຸງ ອີ່ຂອງກາຍເຂົາປັບປຸງຕາມສັນຄູາໃນ ๑๕ (ສີບຫ້າ) ວັນນັບດັດຈາກວັນທີເຫດຸນີ້ສິນສຸດລົງ ອີ່ຕາມທີ່ກຳນົດໃນກູ່  
ກະທຽວດັກລ່າວ ແລ້ວແຕກນີ້

ຄ້າຜູ້ຮັບຈ້າງນີ້ປັບປຸງໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມໃນວຽກນີ້ ໃຫ້ລົວ່າຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ສະສິທິເຮືອກັ້ນ ໃນການທີ່ຈະຂອງ  
ດຫີ່ລົດຄ່າປັບປຸງ ອີ່ຂອງກາຍເຂົາປັບປຸງຕາມສັນຄູາໃນໄດ້ ທັງສິນ ເວັນແຕ່ ການນີ້ເຫດຸກີດຈາກຄວາມຝຶດຫີ່ຄວາມບກພ່ອງ  
ຂອງຜ່າຍຜູ້ວ່າຈ້າງ ຊື່ມີຫລັກສູານຫັດແຈ້ງ ອີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງທຣາບດີ ອູ່ແລ້ວຕັ້ງແຕ່ຕົນ

ກາຮງດຫີ່ລົດຄ່າປັບປຸງ ອີ່ຂອງກາຍເຂົາປັບປຸງຕາມສັນຄູາໃນໄດ້ ອູ້ໃນດຸລືພິນີຈຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງທີ່ຈະ  
ພິຈານາຕາມທີ່ເຫັນສົມຄວຣ

## ຂໍ້ ๒๒. ການໃຊ້ເຮືອໄທຍ

ໃນການປັບປຸງຕາມສັນຄູານີ້ ຫາກຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງສ່ົ່ງຫີ່ອົນນຳຂອງເຂົາມາຈາກຕ່າງປະເທດຮຽມທັງເຄື່ອງມື່  
ແລະອຸປະນົມທີ່ຕ້ອງນຳເຂົາມາເພື່ອປັບປຸງຕາມສັນຄູາ ນີ້ວ່າຜູ້ຮັບຈ້າງຈະເປັນຜູ້ທີ່ນຳເຂົາມາເອງຫີ່ອົນນຳໄດ້ພ່ານຕັ້ງແນນຫຼື  
ບຸກຄລອື່ນໄດ້ ດັກສິ່ງຂອງນັ້ນທີ່ຕ້ອງນຳເຂົາມາໂດຍທາງເຮືອໃນເສັ້ນທາງເດີນເຮືອທີ່ມີເຮືອໄທຍເດີນອູ່ແລະສາມາດໃຫ້ບັນດາໄດ້ຕາມທີ່

(ລົງຊື່).....  
(นายສູຮັກຕິດໍ່ ສມກັດໍ)

ຮອງນາຍກອງຄໍການບຣິຫານສ່ວນຈັງຫວັດ ປັບປຸງຕາມການແນນ  
ນາຍກອງຄໍການບຣິຫານສ່ວນຈັງຫວັດສະບຸຮີ

(ລົງຊື່).....  
(ນາຍອຮຣັດພລ ເຈີຍມຕະກາຣ)

ກຣມການຜູ້ຈັດກາ

SATOON CONSTRUCTION CO.,LTD.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาบังคับใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรือของประเทศไทยหรือเป็นเรือของต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยหรือไม่ แต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของน้ำลงเรืออื่นที่มีใช้ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบในตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของน้ำ ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาบังคับใช้ได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างด้วยหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรามิ่งต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนริบลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบตู้ได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่าจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ว่าจ้าง เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง


(นายสุรศักดิ์ สมรักษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายอรรถพล เจียมตระการ)

กรรมการผู้จัดการ



สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔ ดังนี้

$$K_{2.1} = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$$

$$K_{3.1} = 0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$$

$$K_{3.3} = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนต่อไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....

(นายอรรถพล เจียมธรรมกร)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๙๑๙๔๕๗๐

เลขคุณสัญญา ๖๘๐๙๒๒๐๐๓๗๐๖

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑๓  
ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี  
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๘  
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....  
ผู้ว่าจ้าง  
(...นายศรุตศักดิ์ สมภักดี.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....  
ผู้รับจ้าง  
(...นายอรรถพล เจียมตรະการ...)  
กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....  
พยาน  
(....นางคละองดาว บำรุงญาติ....)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....  
พยาน  
(.....นางสาวสมารี พุ่มสุข.....)  
เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

## ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท รายปูนก่อสร้าง จำกัด เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๖ถนน อดิเรกสารตำบล บ้านแก่ง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติจังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๖๓๔๐๖๗๙ โดย นายอรรถพล เจียม โครงการ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๔๙/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๓ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการและอธิบายดังเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคางวดที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๒๔๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อาจรับคำเสนออนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในการนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญางานตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้ายเอกสาร ก ๑ สำเนาหนึ่งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (นางสุมาล พุกสุข) ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลภารกิจ

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน ข้าพเจ้ายอมชอบให้ค่าเสียหายได้ ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อาจดำเนินการจัดซื้อจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอที่ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอณ์ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทชัยติธรรม และปราศจากกล้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหิ้วบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐:๐๐ น.

(นายอรรถพล เจียมตระการ)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๘๑๔๕๕๗๐

ใบเสนอราคางานที่ ๖๘๐๗๑๖๐๐๓๕๕๐

รหัสอ้างอิง OTP TGrf

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๙๕๕๔๔๐๐๐๑๔๒

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมิลี พุ่มสุข)  
เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑๓  
ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี  
ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๖/๑๕๖๘  
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....   
ผู้ว่าจ้าง  
(....นายสุรศักดิ์ สมภักดี.....)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....   
ผู้รับจ้าง  
(...นายอรรถพล เจียมตระการ...)  
กรรมการผู้จัดการ  
  
บริษัท ไทรโยค จำกัด  
SAIPOON CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....   
พยาน  
(....นางละອองดาว บำรุงญาติ.....)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....   
พยาน  
(.....นางสาวสุมารี พุ่มสุข.....)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

**ໂປແຈ່ງປົມາຄນາແລະຮາຄາ  
ໂຄງການກ່ອລສ້າງລາດຍາງ ພູມທີ 7 - ພູມທີ 13 ຕ.ວັງຈາງ ວັງຈາງ ຈ.ສະຫງົບ**

**ເອກສາຣແນເປ່າໄຍສື່ປົງກາຍໝາຍ**

(ຈົງໆ) ..... ເຈົ້ານາງຫຼັກພູດຕະປົມຂອບໜາຍ

(ຈົງໆ) ..... ດ້ວຍທຳມະນຸຍາ ອົບນາມໃນສິນຍາ

ລັດທຶນ ຕາມ ສິນຍາ	ຮາຍການ	ທນວຍ	(1) ຈຳນວນ	(2) ຮາຄາດ້ວຍນໍາຍ	(3) ຮາຄາທຸນ	(4) FN	(5) ຮາຄາ/ກວ່າຍ X FN	(6) ຮາຄາຄາງ	(7) ຄ່າທີ່ປັບປຸງເຄີດ	(8) ຮາຄາຄອນໜວຍ '5)X(7)	(9) ຮາຄາທີ່ປັບປຸງເຄີດ (1)X(8)
1.1 (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ບັນຫຼາງທີ່ສັງເກດ ຈານຈອງພື້ນທາງ)	ການຈອງພື້ນທາງແລະກຳສັງເກດ ຈານເຈື້ອພື້ນທາງຕື່ມະກຳທີ່ໜ້າ.....ຖຳ.	ຕຽມ.	4,859.000	11.14	54,129.26	1.3642	15.19	73,843.13	0.899043300	13.6564677	66,356.78
2.1 ຈານຈອງພື້ນທາງ (SUBBASEES)	ການຈອງພື້ນທາງສຸດມາຄວາມ (SOIL AGGREGATE SUBBASE) ງານພື້ນທາງ (BASE COURSES)	ຕປ.ມ.	474.000	348.24	165,065.76	1.3642	475.06	225,182.70	0.899043300	27.0995101	202,445.17
3.1 ຈານພື້ນທາງນິ້ນຄຸກ (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ງານພື້ນທາງ (SURFACE COURSES)	ຈານພື້ນທາງນິ້ນຄຸກ (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ງານພື້ນທາງ (SURFACE COURSES)	ຕປ.ມ.	663.000	433.48	287,397.24	1.3642	591.35	392.067.31	0.899043300	31.6492555	352,483.46
5.1 ຈານຄາດຢູ່ສັ່ນເຄີດ (PRIME COAT) (ພື້ນທາງທີ່ມົດຖານີ)	ຈານພື້ນທາງທີ່ມົດຖານີ (ASPHALT CONCRETE) ຈານພື້ນທາງແລະກຳສັງເກດ (TACK COAT)	ຕຽມ.	4,225.000	36.45	154,001.25	1.3642	49.72	210,088.50	0.899043300	44.7004329	188,859.33
6.1 (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ຈານພື້ນທາງແລະກຳສັງເກດ (TACK COAT) ທ່ານ.....ຖຳ.	ຕຽມ.	4,225.000	299.73	1,266,359.25	1.3642	408.89	1,727,567.28	0.899043300	367.6098149	1,553,151.47
6.2 ປໍ່າຍຈາຈຽນບັນຫຼາງ	ປໍ່າຍຈາຈຽນບັນຫຼາງ B-33	ຖຸດ	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3642	3,833.40	7,666.80	0.899043300	3,446.3925862	6,892.79
6.3 ປໍ່າຍຈາຈຽນບັນຫຼາງ ຖ.1-ຕ.27, ຕ.31-ຕ.60, ຕ-75	ປໍ່າຍຈາຈຽນບັນຫຼາງ ຖ.1-ຕ.27, ຕ.31-ຕ.60, ຕ-75	ຖຸດ	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3642	4,065.31	8,130.63	0.899043300	3,554.8897179	7,309.78
6.4 ສີຈາຈຽນຫົມພາສັດຕິສະຫຼອນແສນ (ສີເທື່ອງ, ສີຈາງ)	ສີຈາຈຽນຫົມພາສັດຕິສະຫຼອນແສນ (ສີເທື່ອງ, ສີຈາງ)	ຕຽມ.	191.000	290.00	55,390.00	1.3642	395.61	75,563.03	0.899043300	255,6705199	67,933.07
6.5 ປໍ່າຍໂຄຮກາຮ	ປໍ່າຍໂຄຮກາຮ	ຖຸດ	1.000	6,986.00	13,642		9,530.30	0.899043300	8,568.15		2,454,000.00

(ຈົງໆ)

(ນັກສາມາດ  
ພົມສຸກ)

ເຈົ້ານາງຫຼັກ



ຕົວທີ່ມີຢູ່ໃຈ່ງ ປົມອົງການ ອົບນາມໃນສິນຍາ

ບໍລິສັດ ຂະຊາຍຸມີຫຼວງວຽກແຫຼ່ງ ຂະຊາຍ

Saiyok Construction Co., Ltd.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจดที่... ๔-๕  
๖๗๙๐... กมํา... ๓

ราคากลาง

๒,๗๒๙,๖๓๙.๖๘

เงิน ราชอาณาจักร

๒,๔๕๔,๐๐๐.๐๐

บาท

หักกับ ส่วนต่าง

๒๗๕,๖๓๙.๖๘

บาท

สัดส่วนปรับลดร้อยละ

๐.๑๐๐๙๘๐๒๔

จำนวนเงินปรับลด%

๐.๑๐๐๙๘๐๒๔ (๒๗๕,๖๓๙.๖๘ ÷ ๒,๗๒๙,๖๓๙.๖๘ = ๐.๑๐๐๙๘๐๒๔)

จำนวนเงินปรับลด%


๐.๐๙๙๐๑๙๗๕

จำนวนเงินปรับลด เดิม

๐.๐๙๙๐๐๔๓๓

จำนวนเงินปรับลด (๐.๑๐๐๙๘๐๒๔) / ๑๐๐

๐.๐๙๙๐๐๔๓๓



โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๓  
ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเพณงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคิดคำนวนที่ใช้กับสัญญา  
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๘  
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ.....  
ผู้ว่าจ้าง  
(....นายสุรศักดิ์ สมภาคี.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัฐบัตรราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....  
ผู้รับจ้าง  
(...นายอรรถพล เจียมตระการ...)  
กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....  
พยาน  
(.....นางละอองดาว บำรุงญาติ.....)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....  
พยาน  
(.....นางสาวsumaie พุ่มสุข.....)  
เจ้าพนักงานพัสดุปัฐบัตรงาน

1. เอกสารสูตรเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สัญญาแบบปรับราคาได้
2. การตรวจสอบค่า K
  - กรณีมีเงินเพิ่ม ปกติ
  - กรณีมีเงินลดและเพิ่มในครั้งเดียวกัน
  - กรณีงานเสร็จเกินเวลาสัญญา ซึ่งมีการเปรียบเทียบค่า K เดือนที่ส่งงาน กับค่า K เดือนที่หมดสัญญา
3. หนังสือร้องขอค่า K ที่เกิน 90 วัน
4. ตัวอย่างต้นน้ำราคากองกรุงทวงพาณิชย์

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเป็นจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่คิดแยกสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะที่คิดแยกสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อค่าน้ำรากซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขึ้นมาเมื่อวันเปิดซองประมวลราคา สำหรับกรณีที่จัดซื้อโดยบวาริอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในวันประมวลราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่าจ้างเข้าเม้นนี้ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในการนี้ที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานเข้ามาร่วมกัน จะต้องแยกประเภทงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจนสุดท้ายหากพื้นกำหนดนี้ไม่ได้ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกด้วย และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่ได้รับสัญญาเริ่มเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วที่สุดให้แก้ไข

งานของภาครัฐต่อไปหรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาในจังหวะของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

### ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคายield

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานข้างหน้าก่อสร้างให้ก้านวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

ก้านดให้  $P$  = ราคาก่างานต่อหน่วยหรือราคาก่างานเป็นวงที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับข้าง

$Po$  = ราคาก่างานต่อหน่วยที่ผู้รับข้างประมูลได้ หรือราคาก่างานเป็นวงซึ่ง  
ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

$K$  = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือหาก  
เพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

#### หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชี่ยม สรรว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจ้าน่าย แต่ไม่รวมถึงหน้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

1.2 ประปาของอาคารบรรจุถึงห้องแม่น้ำห่าน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายนอก

1.3 ระบบหอหรือระบบถ่ายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห้องปรับอากาศ ห้องเก็บสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้าฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เนื่องจากส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร คินกม คินตัก ห้างจากอาคาร โดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

#### หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การบุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การบุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย บดอัดดิน การบุด-ถมดอัดแน่นเข่อน คล่อง คันคล่อง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการบุดดินให้หมายความถึงการถมดินหรือรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุม คุณสมบัติของวัสดุนั้นและมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมถึงมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

**ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประปา EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED , MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER**

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือมวลขนาดต่าง ๆ และราย ให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคนและให้หมายความรวมถึงงานหินทั้ง งานหินเรียง ยานนาว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตั้งแต่ห้องถ่าน้ำ

ใช้สูตร  $k = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางบนเขาย่าไป-กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

ใช้สูตร  $K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

**หมวดที่ 3 งานพาก**

**3.1 งานพิริทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT**

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

**3.2 งานพิริทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL**

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

**3.3 งานพิริทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM**

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดี่ยว (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10Mv/Mo + 0.15St/So$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอิฐ หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานปูอิฐคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานปูอิฐ (MANHOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \frac{lt}{lo} + 0.15 \frac{ct}{co} + 0.15 \frac{mt}{mo} + 0.15 \frac{st}{so}$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันคลื่น หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C.BEARING UNIT) ห้องเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันคลื่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเที่ยนเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{lt}{lo} + 0.15 \frac{ct}{co} + 0.20 \frac{mt}{mo} + 0.25 \frac{st}{so}$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 \frac{lt}{lo} + 0.05 \frac{ct}{co} + 0.20 \frac{mt}{mo} + 0.40 \frac{st}{so}$$

#### หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตัก ร่องเท สะพานน้ำ หอดอด ไฟฟ้า และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำเหล็กแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้วน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \frac{lt}{lo} + 0.10 \frac{ct}{co} + 0.10 \frac{mt}{mo} + 0.20 \frac{st}{so}$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้าง ในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้านา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ หอดอดและอาคารชลประทาน ชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้วน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \frac{lt}{lo} + 0.10 \frac{ct}{co} + 0.10 \frac{mt}{mo} + 0.25 \frac{st}{so}$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำเหล็กเครื่องกว้าน และโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานห่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \frac{lt}{lo} + 0.45 \frac{gt}{go}$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีต และเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำล้วน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจากงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \frac{lt}{lo} + 0.60 \frac{st}{so}$$

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดคล่อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมากแยกคำนวณต่างหากของงานฝ่าย ทางระบายน้ำดื่นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีลักษณะแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งผิงท่อกรุขนาดครู่ในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดินหินปูหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารค้าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ก่ออัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เคพารากาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละวัน กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคาหมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

#### 5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25 It/Io + 0.25 Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACT/ACo$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCT/PVC0$$

#### 5.2 งานวางท่อเหล็กเหนี่ยวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนี่ยวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

#### TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIP/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

#### 5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPT/GIPo$$

#### 5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVCT/PVC0$$

### 5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.05 Lt/lo + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCl/PVC0$

### 5.6 งานวางท่อเหล็กอ่อนตัวสังกะสี

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.25 Lt/lo + 0.50 GIPl/GIP0$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

### 5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานี ยื่อยสำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้ ก่อ PRELIMINARY WORK ( ยกเว้น BOUNDARY POST ) , TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES , GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เอกสารการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เท่านั้น

ใช้สูตร  $K = 0.60 + 0.25 Lt/lo + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.20 Lt/lo + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

~~ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.20 Lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So$~~

### 5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.15 Lt/lo + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 Lt/lo + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

### 5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.80 + 0.05 Lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.45 + 0.05 Lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo$

**ดัชนีราคาก่อสร้างตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาให้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์**

K	=	EXCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคางูบบริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคางูบบริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ct	=	ดัชนีราซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
St	=	ดัชนีราคานเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคานเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Gt	=	ดัชนีราคานเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคานเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
At	=	ดัชนีราคายาสฟิดท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคายาสฟิดท์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Et	=	ดัชนีราคานคร่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคานคร่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Act	=	ดัชนีราคาก่อสร้างชีเมนต์ไบหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาก่อสร้างชีเมนต์ไบหิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PV Ct	=	ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PV Co	=	ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาก่อสร้างเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาก่อสร้างเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PEt	=	ดัชนีราคาก่อสร้าง HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาก่อสร้าง HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Wt	=	ดัชนีราคากลางไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคากลางไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

### วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประการรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกภาระงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้กำหนดให้กำหนดให้ใช้เลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคากำไรจากราคายื่งที่ผู้รับจ้างทำสัญญาคงลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแก้กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความต้องการของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑๓  
ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี  
เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๘  
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๔ หน้า

ลงชื่อ.....   
ผู้ว่าจ้าง

(....นายสุรศักดิ์ สมภักดี.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....   
ผู้รับจ้าง

(...นายอรรถพล เจียมตระการ...)

กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....   
พยาน

(....นางละອองดาว บำรุงญาติ....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....   
พยาน

(....นางสาวสุมารี พุ่มสุข....)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

### เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายใต้มาตรฐานของประเทศไทยโดยต้องใช้มีน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทึ่งหมวดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายใต้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทึ่งหมวดตามสัญญา ตามตารางผนวก ๑ แบบท้าย โดยจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายใต้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทึ่งหมวดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายใต้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณที่จะใช้ทึ่งหมวดตามสัญญา ตามตารางผนวก ๒ แบบท้าย โดยจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมปิวเตอร์						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๗๐๐	๗๐	๗๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๘๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑๓  
ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี  
แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๘  
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒๘ หน้า

ลงชื่อ.....   
ผู้ว่าจ้าง  
(....นายสุรศักดิ์ สมภักดี.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ลงชื่อ.....   
ผู้รับจ้าง  
(...นายอรรถพล เจียมตระการ...)  
กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....   
พยาน  
(....นางคละวงศ์ บำรุงญาติ.....)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....   
พยาน  
(.....นางสาวสมมาลี พุ่มสุข.....)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

แบบรูปนามบัตร พ.ศ. 2566  
๒๗/๖๗



สำนักงานเขตการศึกษาเชียงใหม่

หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 13 ต.วังเมือง อ.วังเมือง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายสื่อสารมวลชน สำนักนายกรากao ส้าง

สำนักงานเขตการศึกษาเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๗/๖๗

หลักสูตรภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๖  
๑๔๓ ๑๕๘  
๑๑ ๑๒๖  
๒๗/๖๗  
ผู้ดูแลเอกสาร

ผู้ดูแลเอกสาร  
ผู้ดูแลเอกสาร  
ผู้ดูแลเอกสาร

ສາກົນບໍລິຫານ

ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

三



องค์การบริหารส่วนบึงกาฬ ๘๗

ଗପକଥାରେଣ୍ଟମାନଙ୍କରିତା

四三

8

•

1

รายงานการประชุมฯ



พิจิตรไม่ได้ไปตามภารกิจเดินทางต่อไป แต่เดินทางกลับมาที่บ้านของตนที่วังน้ำเขียว จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดินทางกลับมาที่บ้านของตนที่วังน้ำเขียว จังหวัดเชียงใหม่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



၁၃၂

“**କାନ୍ତିରୀଣ୍ମାରୀ**” / ଲିଖିତ ପାଠୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ

**ចំណាំការងារទីផ្សារដែលមានប្រើប្រាស់នៅតាមរយៈនិរាយ។**

ການຄົມວິກາ

卷之三

ປະເທດໄມ້ແນວໃຈການຍົບຍາລະສອບ 60 ພະຍານຸມາຄາສົງລູ້ອ່ານື້ນຕີ້ນໆ ເພື່ອຫາວັດທະນາການຂອງສະຫງົບສະຫງົບພໍາລັງ  
ການຄ່ອງຄ້າເນັດດັກໂຄສະໜັກທີ່ໄດ້ມີຄວາມສຳພັດໃຫ້ບໍ່ສຳເນົາໃຫ້ມີຄວາມສິນສິນສິນສິນ  
ການນິນພະຍານໄມ້ແນວໃຈການຍົບຍາລະສອບ 90 ພະຍານຸມາຄາສົງລູ້ອ່ານື້ນຕີ້ນໆ ເພື່ອຫາວັດທະນາການຂອງສະຫງົບສະຫງົບພໍາລັງ

แม่มาเรียห์เดินทางกลับคืนบ้าน ทิ้งบ้านไปท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่เมื่อเดินทางกลับบ้านมาแล้ว ก็พบว่าบ้านไม่มีใครอยู่ เนื่องจากบ้านถูกคนร้ายขโมยไปหมด แม่มาเรียห์จึงต้องเดินทางกลับไปต่อท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่เมื่อเดินทางกลับบ้านมาแล้ว ก็พบว่าบ้านไม่มีใครอยู่ เนื่องจากบ้านถูกคนร้ายขโมยไปหมด แม่มาเรียห์จึงต้องเดินทางกลับไปต่อท่องเที่ยวต่างประเทศ

พิชัยฯ

“กูรักษาเงินไว้ได้เป็นอย่างดี” คุณพูดต่อไป “แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง ไม่ใช่เหรอ?”

1) สำเนาไปรับเครื่องเสียงได้โดยไม่ต้องเดินทาง Made in Thailand [M.I.T] ที่อยู่อาศัย

2) ឧក្រាស់នីតិវិធី ទិន្នន័យរាជ និងអគ្គន័យ និងសាធារណរដ្ឋបាល

ເປົ້າມີຄວາມສັບສົນໃນການພະນັກງານ ເພື່ອມີຄວາມຕົ້ນຫຼັງລົງທຶນ ທາງການຮາຍ ພອດຍືນຕິດຕາມ

ప్రాంతిక నుండి

3

กฤษณะภานุมา

君子曰.....(คุณเป็นคนดีมาก)

ก็ตามที่นักประวัติศาสตร์ทุกคนรู้ดีว่า มนุษยชาติได้เดินทางมายังโลกนี้

ก้าวเดินสู่ความสำเร็จ ที่ ก้าว (ก้าว) 0405.3/2 232 ถนนสุขุมวิท 8 เมืองเชียงใหม่ 2568

卷之三

卷之三

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର | ମୁଦ୍ରଣ ପତ୍ର | ପରିଚୟ | ପରିଚୟ

รุษยาฯ พัฒนาศรีอยุธยา ภูมิภาคที่ ๑ นิคมรังสรรค์

卷之三

卷之三

100

9

302

ฉบับที่ ๑๖๗

卷之三

(ມະນີ້ງວາງພຸດລົງລາກ  
ລົງລາກ.....) (ມະນີ້ງວາງພຸດລົງລາກ

บัญชีวิสดารงานช่าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลาง
	ก. ก่อสร้าง หินทราย			
1.	หินทรายตัดหินหินอ่อนดินเผา			
1.1	หินทรายตัดหินหินอ่อนดินเผา (สูง 10 ซม.)	ตร.ม.	4,859.00	
2.	หินทรายตัดหินหินอ่อนดินเผา			
2.1	หินทรายตัดหินหินอ่อนดินเผา (สูง 10 ซม.) หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	474.00	
2.2	หินทรายตัดหินหินอ่อนดินเผา หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	863.00	
2.3	หิน คราฟ COAT	ตร.ม.	4,225.00	
2.4	หินทรายตัดหินหินอ่อนดินเผา Asphalt Concrete	ตร.ม.	4,225.00	
2.5	หินทรายตัดหินหินอ่อนดินเผา Asphalt Concrete	ตร.ม.	—	
3.	หินทรายตัดหินหินอ่อนดินเผา			
3.1	ปูนซากหิน หนา 1.33	ชุด	2.00	
3.2	ปูนซากหิน หนา 1.33 ต่ำ 9-10.50-7.5	ชุด	2.00	
3.3	หินทรายตัดหินหินอ่อนดินเผา + ปูน หิน	ชุด	—	
3.4	หินทรายตัดหินหินอ่อนดินเผา + ปูน หิน	ชุด	—	
4.	หินทรายตัดหินหินอ่อนดินเผา			
4.1	หินทรายตัดหินหินอ่อนดินเผา	ตร.ม.	191.00	
4.2	หินรูปสามเหลี่ยม	ตร.ม.	—	
5.	หินทรายตัดหินหินอ่อนดินเผา			
5.1	ปูนซากหินหินอ่อนดินเผา	ชุด	1.00	

คณิตกรกรรมการผู้ดูแลรายการงานห้องเชือด  
ตามค่าต่อ ห้องเชือด ๑๔๓ / ๒๖๘  
ก. ห้องเชือด ๒๕.๘  
แบบแปลนเลข ๙๗/๖๗

ประชุมนัดหารือ  
ตรวจสอบ  
รายการ  
ตรวจสอบ



อย่างดี ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร

ลงวันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ สถานที่

ก่อสร้าง

ลงนาม	(นายธนกร วงศ์ อดิเรก บุญเติม)
ลงนาม	NO SCALE
ลงนาม	.....


ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ໜູດ 7 — ໜູດ 13 ດ.ສັນກາ ຂ.ສັນກາ ດ.ສັນກາ




โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

၁၃ မြန်မာရှိသူများ ပေါင်းစပ် ၇၁၆၂



ອັນດຳກາງປົມເກີດສ່ວນລືບທຳກັດສະຮູບບຸກ

អ៊ីវិទ្យា 7 — អ៊ីវិទ្យា 13 នានាមេរោង ន.ស.រាជាណាចក្រកម្ពុជា

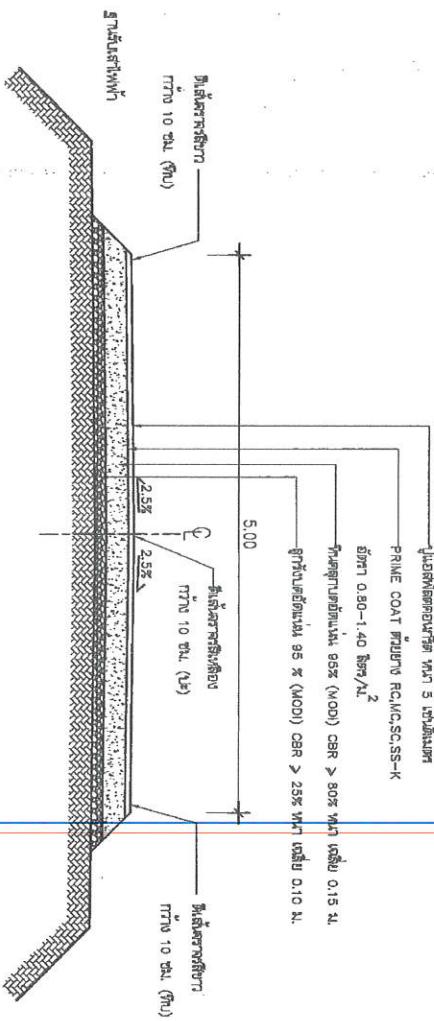

ກອງເຮົາງໂຄມ່ລາດຍາງໄປຢາລະພິລຸຕີເຄວນທີ່ (Asphalt Concrete)

۲۷۰



คุณนายราษฎร์ท่านเป็นประธานกรรมการอนุเคราะห์ฯ  
มาตั้งแต่ปี ๑๙๖๓ ถึงปี ๑๙๖๘  
และปีที่ ๑๙๖๘ ได้รับเลือกเป็น  
ผู้อำนวยการฯ ประจำปี ๑๙๖๗
























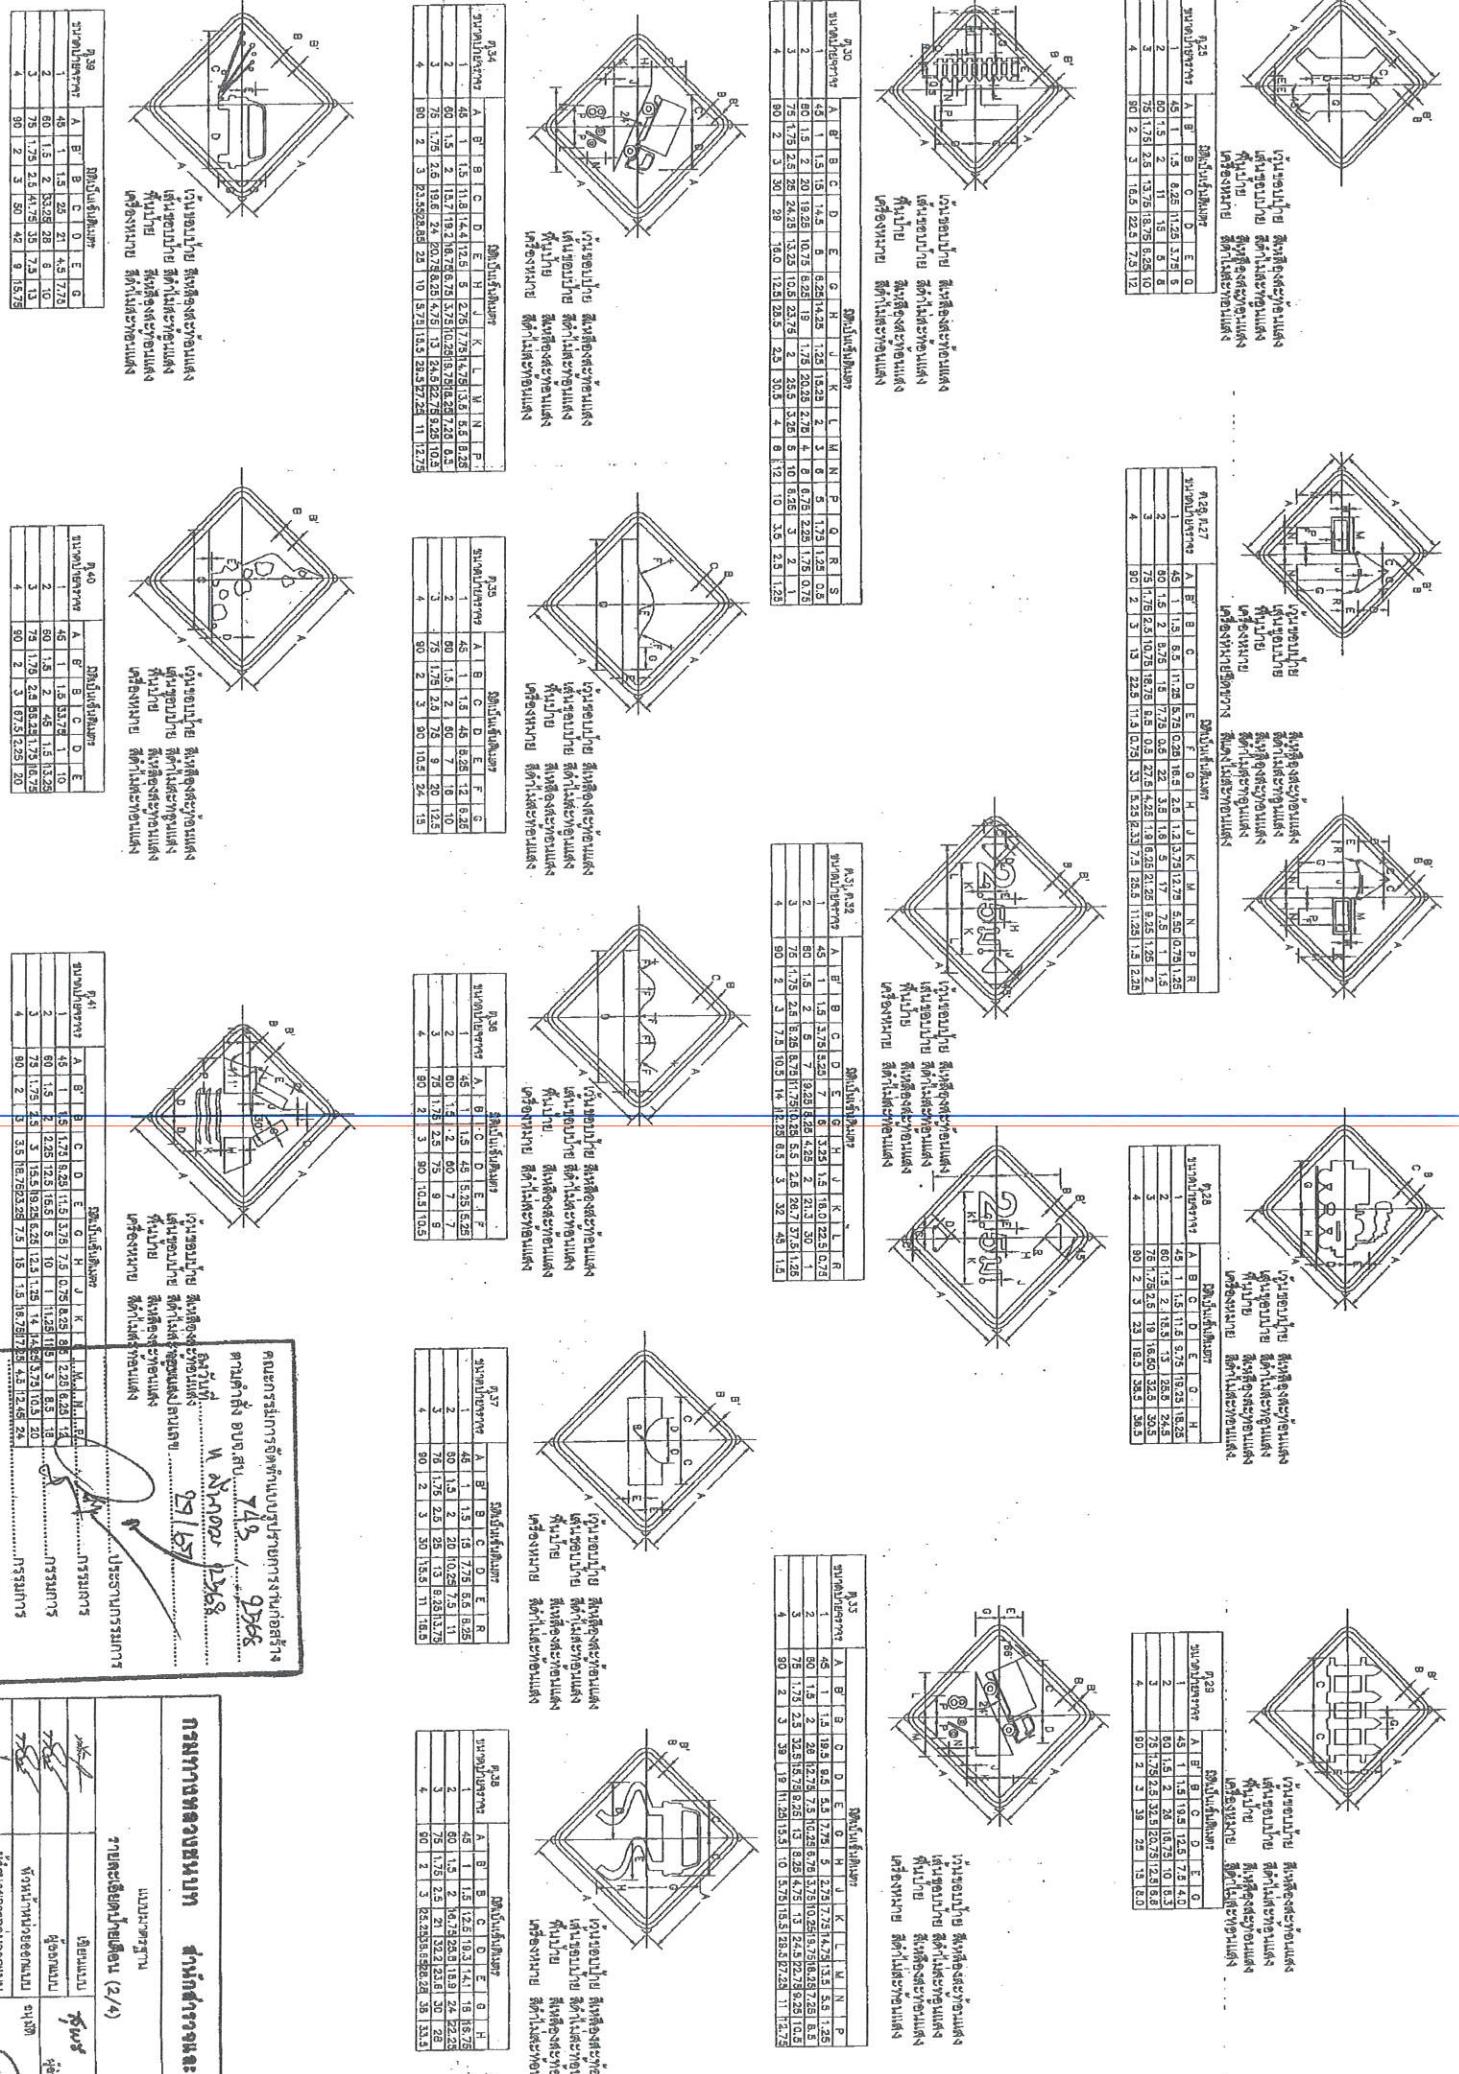





**ศึกษาที่ 1 เศรษฐกิจการค้าและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ**

ପ୍ରାଚୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନମ୍ବର	ପ୍ରାଚୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରାଚୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ରା
1. ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ		
1.1 ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସବ	ଅଧ୍ୟେତ୍ୟ 41-25-୨୫୩ ପାଇଁ	ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରା
1.2 ଗାଁ ପାଇଁ	ଅଧ୍ୟେତ୍ୟ 41-25-୨୫୩ ପାଇଁ	ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରା
2. ଆମାଶ୍ଵର ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ		
2.1 ଆମାଶ୍ଵର ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ		
ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ (ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ) ଗମ୍ଭୀରମ	20.02 - 2400	23.9 23.0 2400
3.1 ଆମାଶ୍ଵର ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ (ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ)	2.02	23.9
3.2 ଆମାଶ୍ଵର ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ (ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ)	2.02	23.0
3.2.1 ଆମାଶ୍ଵର ମୁଦ୍ରା (Revised Schedule No.) , ମାତ୍ର 1 m -2 ଲେଖାବିଧି	2300 2200	2300 2200
3. ଆମାଶ୍ଵର ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ		
3.1 ଆମାଶ୍ଵର ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ (ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ)	8 ଲେଖାବିଧି 1 12 ଲେଖାବିଧି 1 24 ଲେଖାବିଧି 1	12 ଲେଖାବିଧି 1 12 ଲେଖାବିଧି 1 24 ଲେଖାବିଧି 1
4.1 ଆମାଶ୍ଵର ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ (Revised Schedule No.) , ମାତ୍ର 1 m -2	≥ 150 ≥ 100	≥ 150 ≥ 100
4. ଆମାଶ୍ଵର ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ		
4.1.1 ଆମାଶ୍ଵର ମୁଦ୍ରା (Revised Schedule No.) , ମାତ୍ର 1 m -2	≥ 150 ≥ 100	≥ 150 ≥ 100
5. ଆମାଶ୍ଵର ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ	12 ଲେଖାବିଧି	24 ଲେଖାବିଧି

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମାତ୍ରମେ ଏହାର ଅଧିକାରୀ


3.1 例題

ในปัจจุบันนี้ มนุษย์ต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขทางสังคม และความเจริญทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม หรือด้านวัฒนธรรม ดังนั้น ผู้นำประเทศต้องมีความสามารถในการบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่การตัดสินใจตามใจชอบ แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนทุกคน ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ

### 3.2 คำพิจารณาการสืบหุ้นแมลง (RRI)


នៅក្នុងរាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ និងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ



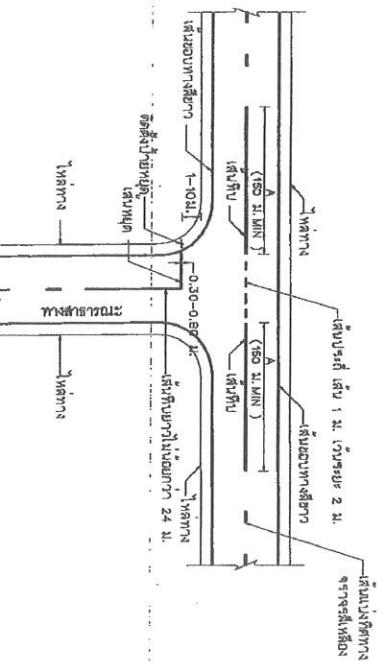


การตีเส้นเขตราชอาณาจักร  
(ทางสีเขียว)


การตีเส้นเขตราชอาณาจักร  
(ทางสีเขียว ขา - ขา ธรรมชาติ)




การตีเส้นเขตราชอาณาจักร  
ในแม่น้ำเจ้าพระยา

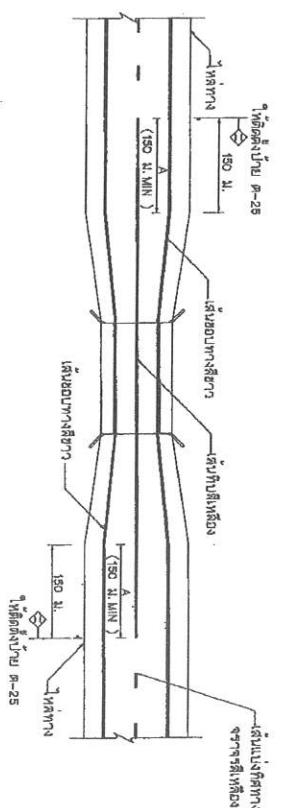


การตีเส้นเขตราชอาณาจักร  
ในแม่น้ำเจ้าพระยา

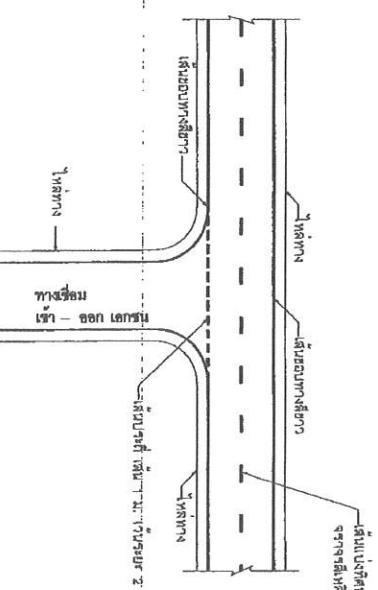

การตีเส้นเขตราชอาณาจักร  
ในแม่น้ำเจ้าพระยา



การตีเส้นเขตราชอาณาจักร  
ในแม่น้ำเจ้าพระยา

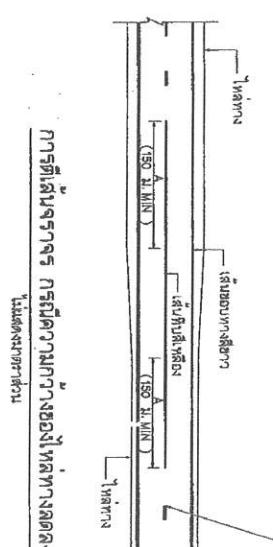

การตีเส้นเขตราชอาณาจักร  
ในแม่น้ำเจ้าพระยา

### เอกสารแนบท้าย

#### สำเนาที่ได้รับอนุญาต

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

